


河北地域二子団地 土地利用計画図

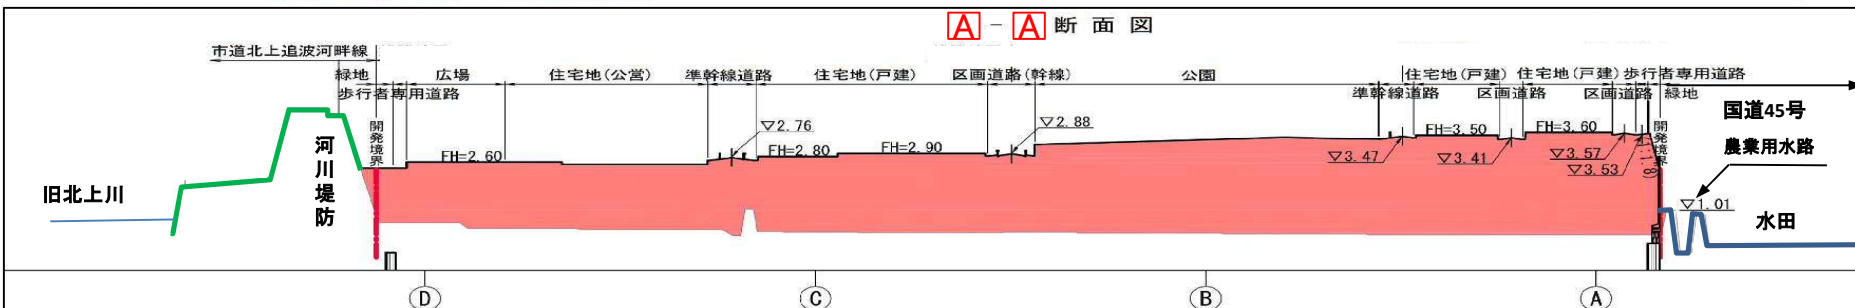

【工事工程表】

項目	平成26年度		平成27年度		平成28年度				平成29年度				平成30年度				
	上期	下期	上期	下期	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
地盤改良工			地盤改良														
盛土工			造成盛土														
造成工			道路・宅地造成・上下水道・調整池・排水機場・公園広場														
土地引渡し (建築開始)	1工区	供給宅地 102戸 (戸建20/公営82)				1工区 H29.3月引渡し				公営住宅 H29.10月入居							
	2工区	供給宅地 111戸 (戸建67/公営44)								2工区 H29.10月引渡し				公営住宅 H30.7月入居予定			
	3工区	供給宅地 159戸 (戸建48/公営111)								3工区 H29.12月引渡し				公営住宅 H30.9月入居予定			

※土地の引渡しの時期については、工区別となる。

施行期間	平成26年7月～平成30年3月				
整備計画	整備戸数	自己再建	公営住宅	型別	
	372戸	135戸	237戸	1LDK	99戸
				2LDK	112戸
				3LDK	26戸
各地域別	河北地域	152戸	(自己79 / 公営73)		
	雄勝地域	202戸	(自己45 / 公営157)		
	北上地域	18戸	(自己11 / 公営7)		



【工事進捗状況】平成30年3月末現在

全体進捗状況		
1工区	100	完成
2工区	100	完成
3工区	100	完成
工種別進捗状況		
◎ 地盤改良工	100	完成
◎ 沈下対策工(CDM)・真空圧密ドレーン工		
◎ 盛土工(76万m ³)	100	完成
◎ 調整池・排水機場工	100	完成
◎ 造成工	100	完成
◎ 汚水排水工	100	完成
◎ 上水道工	100	完成
◎ 道路排水・舗装工	100	完成
◎ 公園広場工(3工区)	100	完成
