

■ 湊東地区 工事進捗状況

平成29年3月末現在




污水管布設状況



道路側溝敷設状況



道路側溝敷設状況

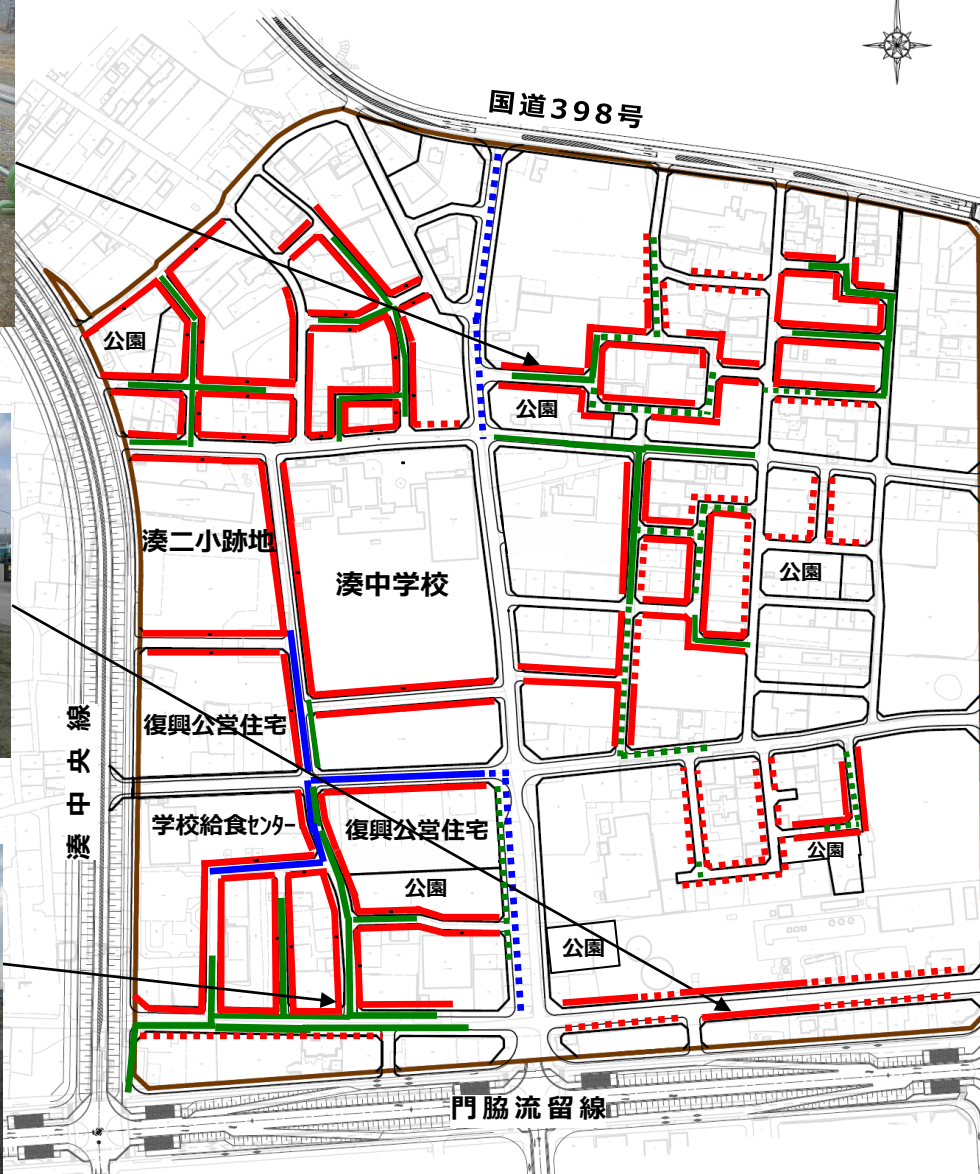

道路築造
側溝設置工

— 済
- - 予定

全体延長 14,950m
施工済延長 5,360m

雨水函築造
函渠設置工


— 済
- - 予定

全体延長 2,040m
施工済延長 315m

污水管築造
開削/推進工

— 済
- - 予定

全体延長 4,750m
施工済延長 1,776m



工事施工にあたり、交通規制・振動等ご迷惑をお掛けております。向こう6か月の施工予定箇所は上記破線のとおりです。施工予定箇所は、変更となる場合があります。（上記のほかに上水道・ガスの布設工事も併せて行います。）
