

■ 下釜第一地区 工事進捗状況

平成29年3月末現在




[道路供用状況]



[污水管布設状況]



[区画道路舗装完了]

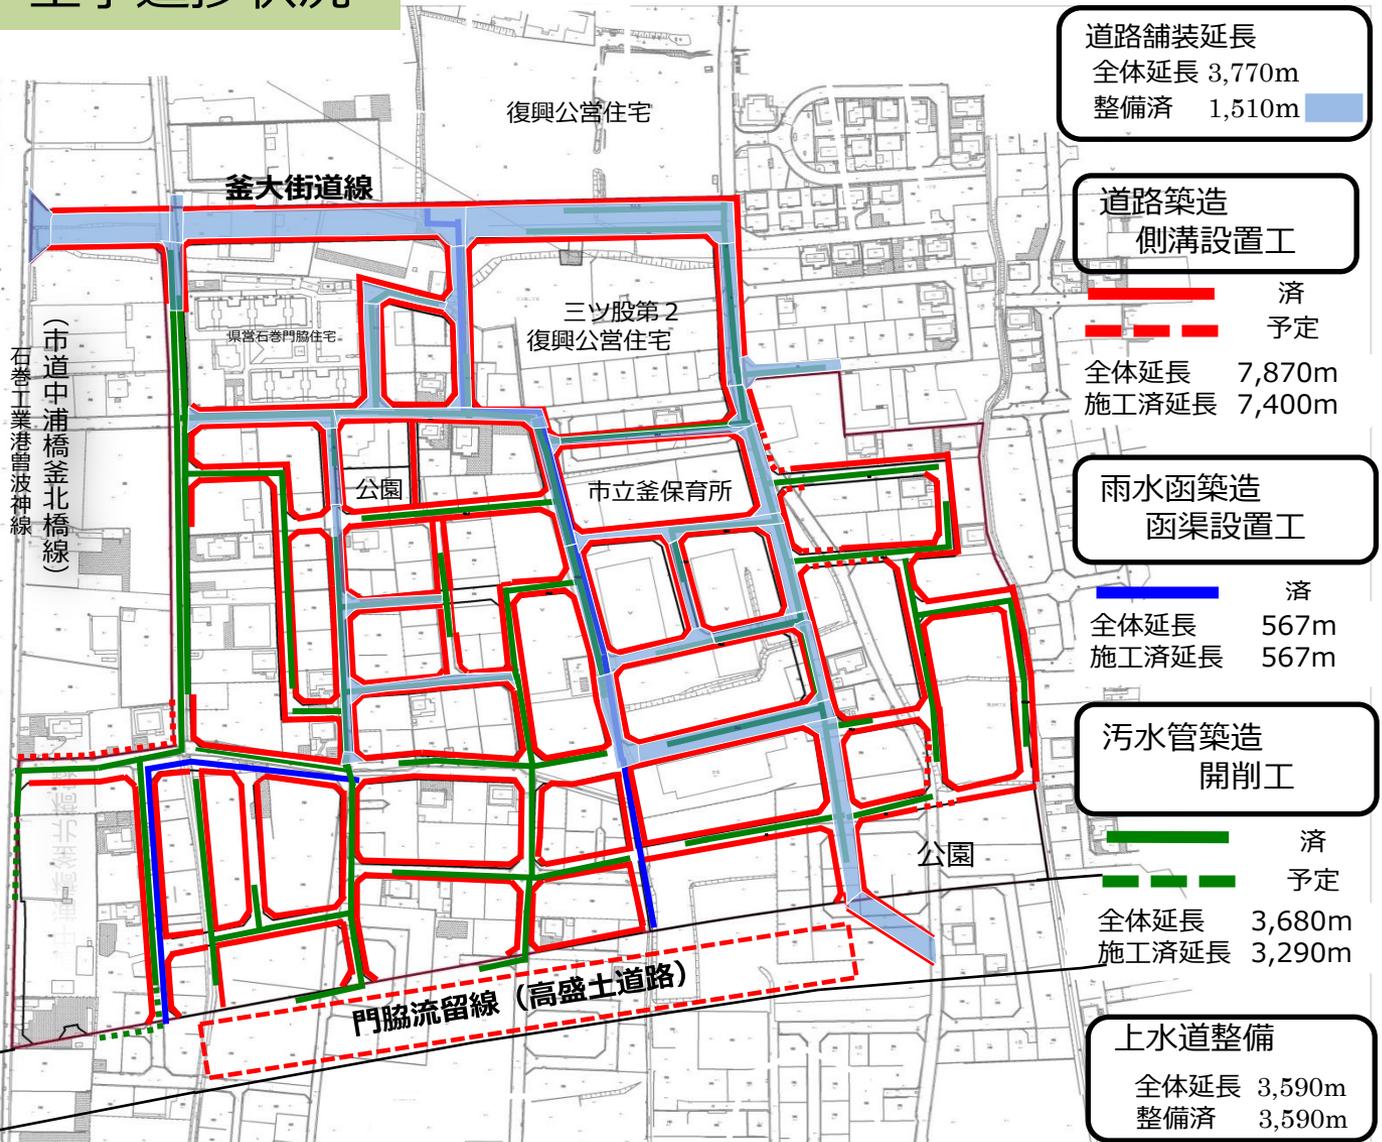

道路舗装延長
全体延長 3,770m
整備済 1,510m

道路築造
側溝設置工
— 済
- - 予定
全体延長 7,870m
施工済延長 7,400m

雨水函築造
函渠設置工
— 済
— 済
全体延長 567m
施工済延長 567m

污水管築造
開削工
— 済
- - 予定
全体延長 3,680m
施工済延長 3,290m

上水道整備
全体延長 3,590m
整備済 3,590m

工事施工にあたり、交通規制・振動等ご迷惑をお掛けしております。翌月（平成29年4月）の施工予定箇所は上記破線のとおりです。

施工予定箇所は、変更となる場合があります。（上記のほかにも上水道の布設工事も併せて行います。）
