


湊西地区 工事進捗状況

平成30年4月末

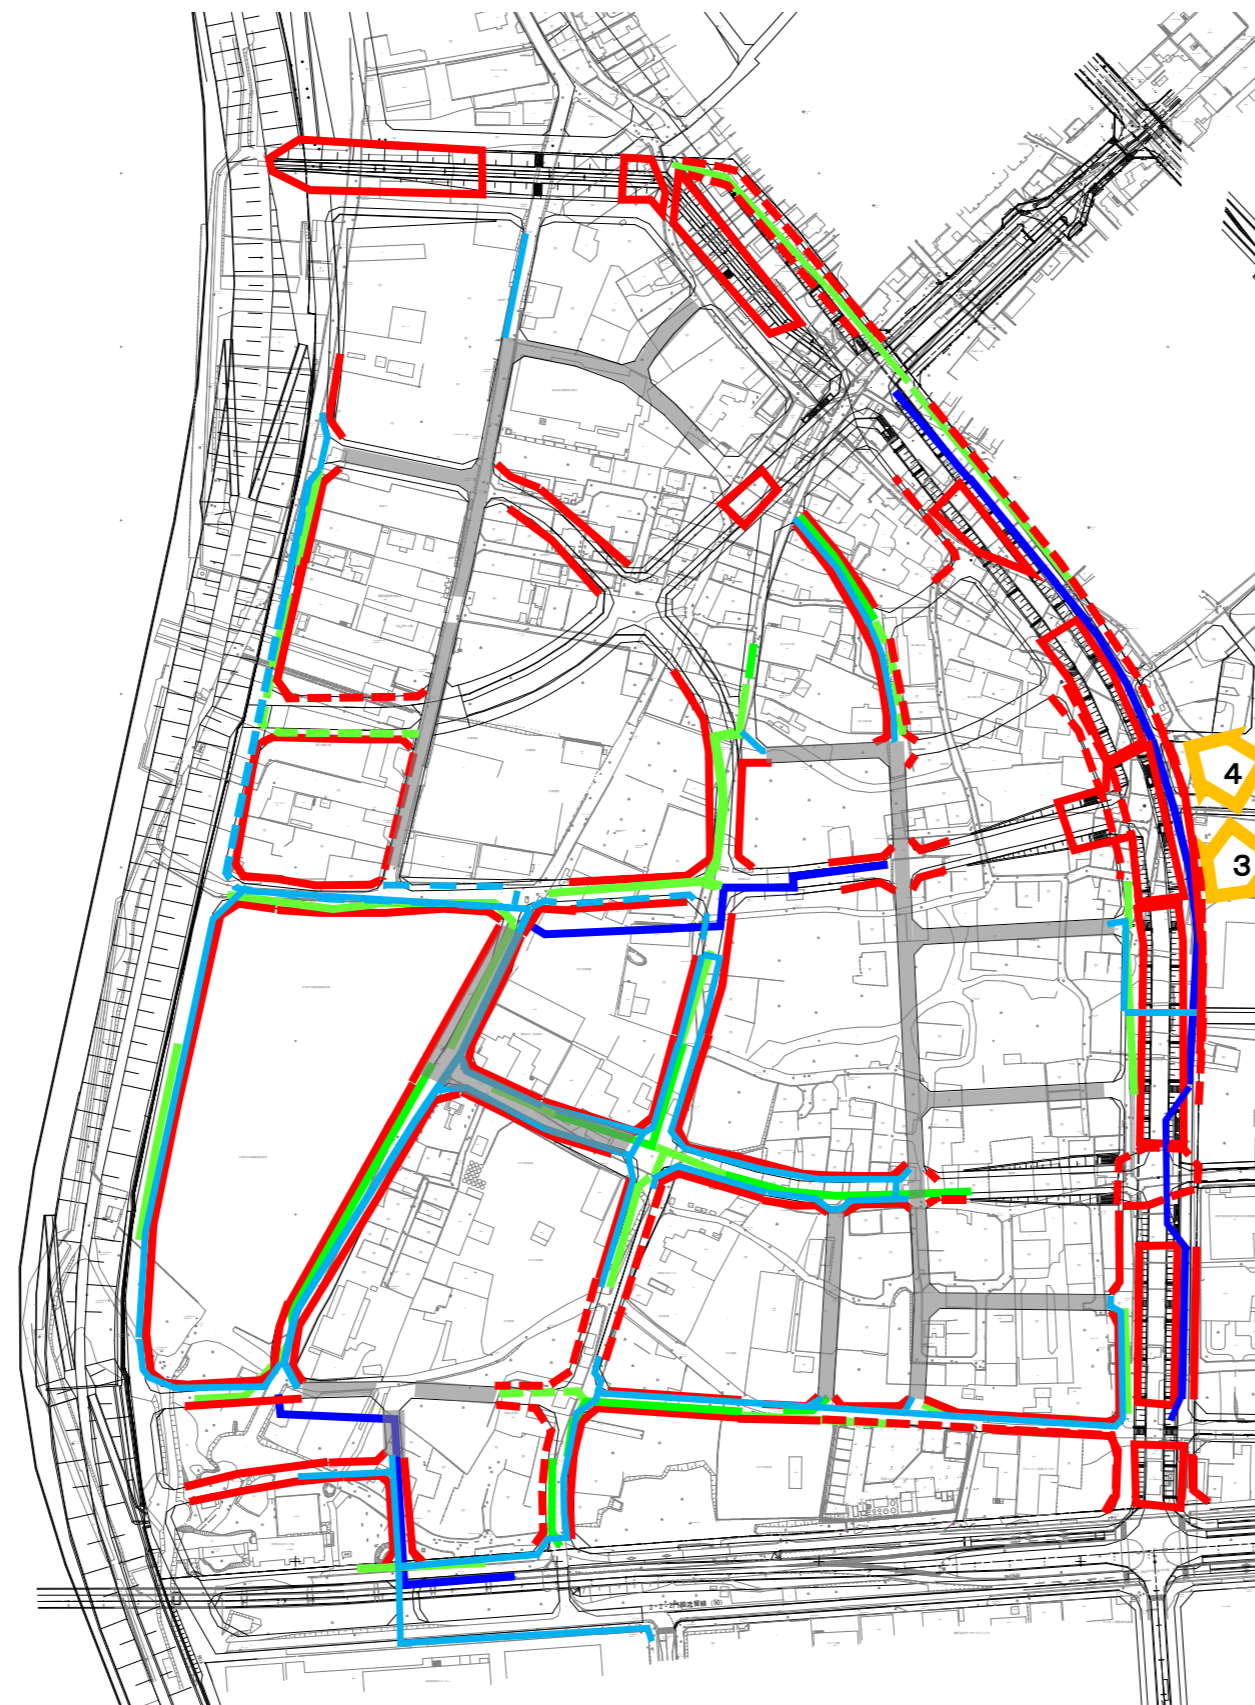


道路築造	舗装工	完了
		完了
		予定
全体延長	7,290m	
施工完了延長	1,630m (進捗率22.4%)	

道路築造	土工・側溝設置工	完了
		完了
		予定
全体延長	15,932m	
施工完了延長	7,800m (進捗率49.0%)	

雨水管渠築造	函渠設置工	完了
		完了
		予定
全体延長	1,322m	
施工完了延長	1,314m (進捗率99.4%)	

污水管築造	污水管置工	完了
		完了
		予定
全体延長	4,540m	
施工完了延長	3,644m (進捗率80.3%)	

上水道築造	上水管置工	完了
		完了
		予定
全体延長	8,998m	
施工完了延長	5,500m (進捗率61.1%)	



工事施工にあたり、交通規制・振動等ご迷惑をお掛しております。向こう3か月の施工予定箇所は上記破線のとおりです。施工予定箇所は、変更となる場合があります。(上記のほかに上水道・ガス管の布設工事も併せて行います。)
