主な復興事業の進捗状況と今後の予定


(第4回:テーマ「防災集団移転促進事業(半島部)」)

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。今回は、「半島部の防災集団移転促進事業」の進捗状況と今後の予定について紹介します。

防災集団移転促進事業とは


災害が発生した地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域(移転促進区域)にある住居を、高台や内陸部へ集団で移転することを促進する事業です。

今回の津波によって浸水した土地を避け、住民の皆様の意向を十分に配慮した高台などの候補地を選定します。

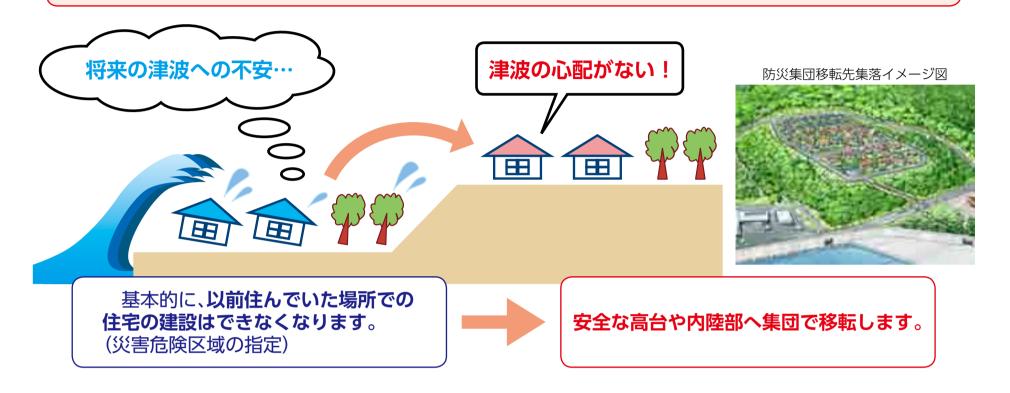

事業の進捗状況と今後の予定

防災集団移転促進事業を検討している地区においては、防災集団移転に参加する戸数を受け入れられる移転先を確保した段階で事業計画書を作成し、事業に対する国土交通大臣の同意(大臣同意)を得ることにより、工事に向けた測量・地質・鑑定、用地買収、実施設計に着手することになります。なお、11月現在、半島部48地区のうち、43地区の大臣同意を得ており、残り5地区についても、速やかに大臣同意が得られるよう、進めていきます。

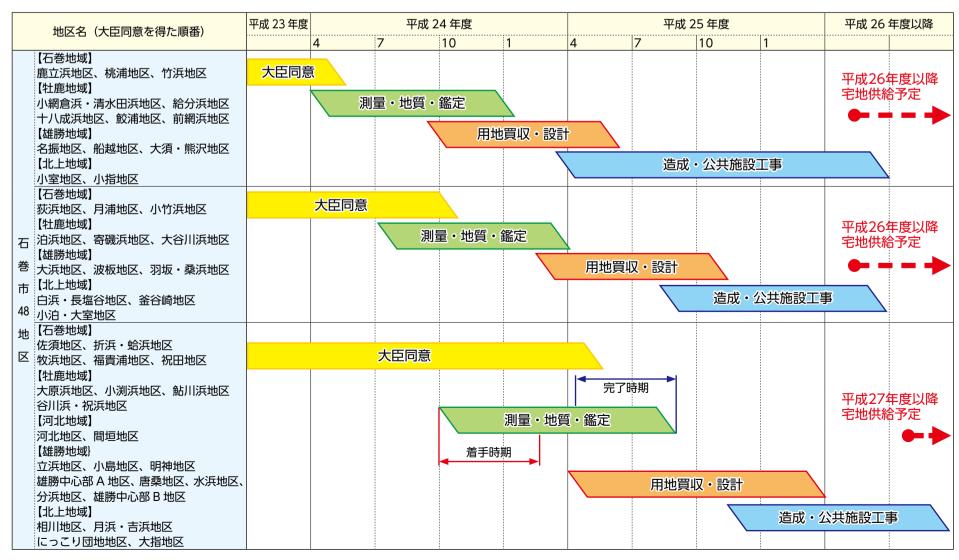

復旧事業等の進捗状況 (第1回)

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしていますが、ここでは、復旧事業等の進捗状況について、お知らせします。皆様の生活を震災前に戻すため、一日でも早い東日本大震災からの復旧を進めていきます。

事業名 (指標名)	進捗率	復旧•復興状況(分子)/被害状況(分母)
道路災害復旧事業	22% 完了	本復旧工事が完了した市道の延長 66.1km
(市道の被災延長に対する本復旧工事が終了した割合)		被災した市道の延長 300km
橋りょう復旧事業	29% 完了	本復旧工事が完了した橋りょうの延長 350m
(市管理の被災橋りょうに対する本復旧工事が終了した割合)		被災した橋りょうの延長 1,219m
道路街路灯復旧事業	100% 完了 ▽	復旧が完了した街路灯数
(被災街路灯のうち復旧した割合)		被災した街路灯数
下水道施設 (管渠) 災害復旧事業	8% 着工	本復旧工事に着工した延長 18km
(下水道被災管渠の被災延長に対する 復旧管渠延長の割合)		被災した汚水管の延長 234km
海岸保全施設災害復旧事業	6% 着工	工事発注した箇所数 2箇所
(防潮堤等の被災箇所のうち 工事発注した割合)		被災した海岸保全施設箇所数35箇所
漁港災害復旧事業	55% 着工	工事発注済漁港数 24港 (県9、市15)
(被災漁港のうち復旧工事を発注した割合)		被災漁港数 44港
農地災害復旧事業	62% 完了	復旧(作付)水田面積 1,099ha
(津波被災農地面積に対する 営農再開可能面積の割合)		津波冠水水田面積 1,771ha
学校施設災害復旧事業【小学校】	33% 着工	復旧工事に着手した小学校数 3校 (湊小、湊二小、渡波小)
(大きな被害を受けた小学校のうち、 復旧工事に着手した小学校数)		災害復旧整備計画対象小学校 9校
学校施設災害復旧事業【中学校】	25% 着工	復旧工事に着手した中学校数 1校 (湊中)
(大きな被害を受けた小学校のうち、 復旧工事に着手した中学校数)	Y	災害復旧整備計画対象中学校 4校
災害廃棄物の処理状況	27% 完了	処分量 121万4千トン
(災害廃棄物処理推計量に対する処分量)	Y	災害廃棄物処理推計量 445万8千トン









主な復旧事業の進捗状況については、事業の進捗に合わせ、定期的に発信していきます。
