

■ 湊東地区 工事進捗状況

平成30年4月末現在




【L型側溝敷設状況】



【上水道管布設状況】



【雨水管渠布設状況】

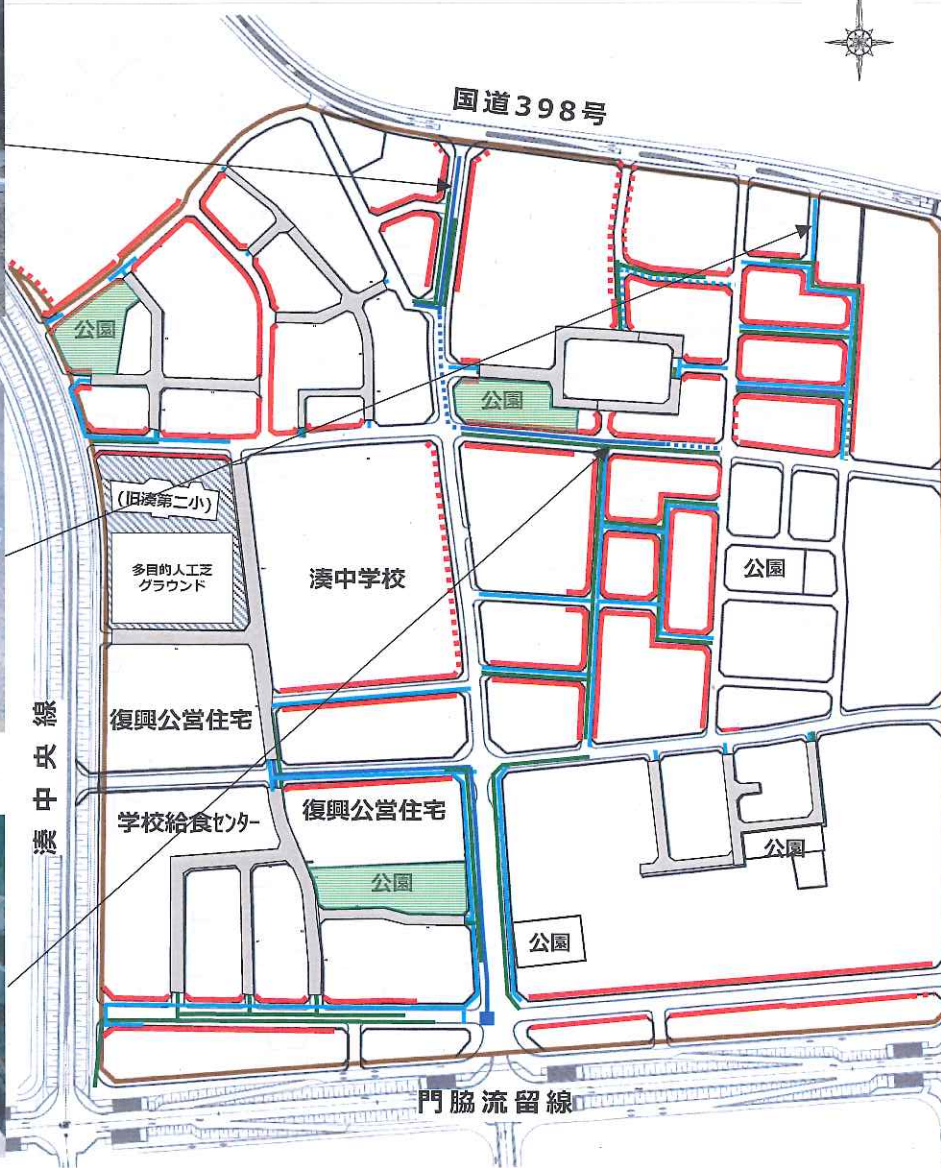

道路築造 側溝設置工	
■ 済	全体計画延長 14,950m
■ 予定	施工済延長 8,400m(進捗率56%)
雨水函築造 函渠設置工	
■ 済	全体計画延長 1,537m
■ 予定	施工済延長 802m(進捗率52%)
污水管築造 開削/推進工	
■ 済	全体計画延長 4,389m
■ 予定	施工済延長 2,959m(進捗率67%)
上水道布設工	
■ 済	全体計画延長 7,365m
■ 予定	施工済延長 3,617m(進捗率49%)
道路舗装工	
■ 済	全体計画延長 6,870m
■ 予定	施工済延長 1,879m(進捗率27%)

0 10 50 100 150 200m

工事施工にあたり、交通規制・振動等ご迷惑をお掛しております。向こう3か月の施工予定箇所は上記破線のとおりです。施工予定箇所は、変更となる場合があります。(上記のほかにガスの布設工事も併せて行います。)
