

■ 湊北地区 工事進捗状況

平成30年4月末現在




【側溝敷設状況】



【舗装完了】



【雨水函渠布設状況】

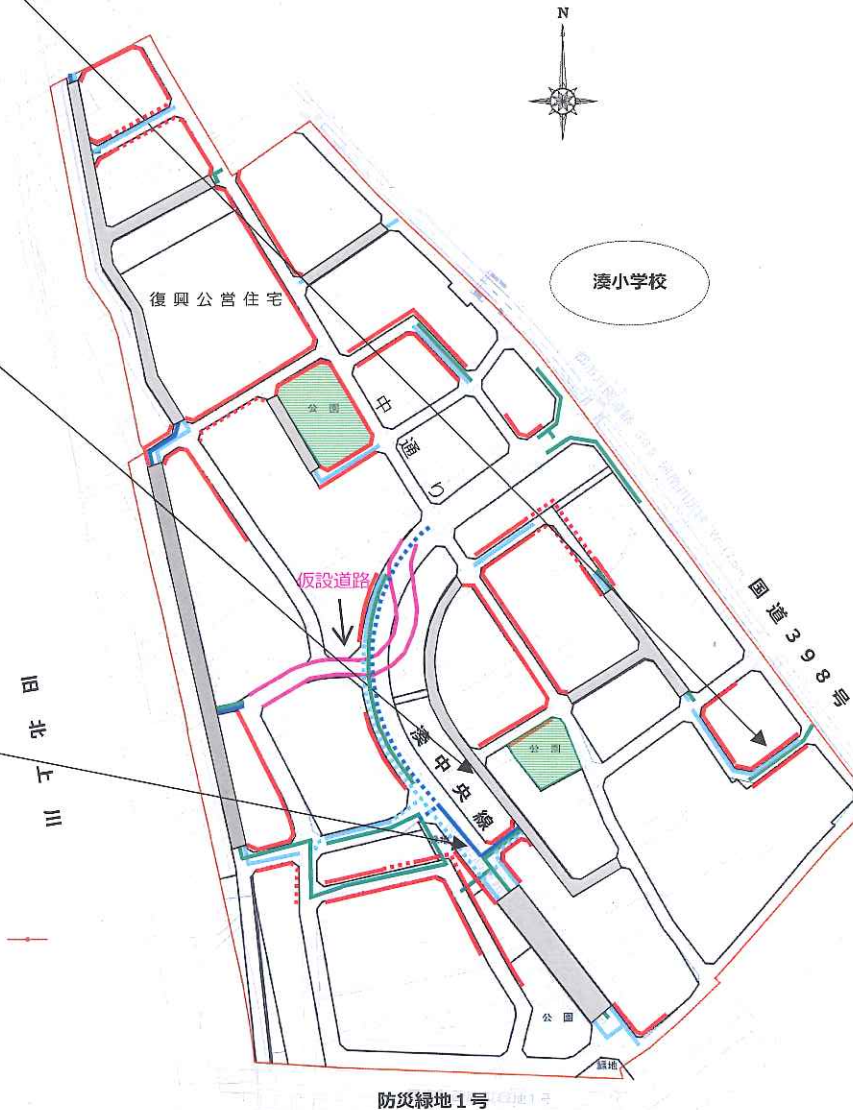

道路築造 側溝設置工

—— 済
- - - - 予定
 全体計画延長 8,455m
 施工済延長 4,102m(進捗率49%)

雨水函築造 函渠設置工

—— 済
- - - - 予定
 全体計画延長 966m
 施工済延長 619m(進捗率64%)

污水管築造 開削/推進工

—— 済
- - - - 予定
 全体計画延長 2,573m
 施工済延長 1,487m(進捗率58%)

上水道布設工

—— 済
- - - - 予定
 全体計画延長 2,829m
 施工済延長 1,675m(進捗率59%)

道路舗装工

済
 全体計画延長 4,138m
 施工済延長 990m(進捗率24%)

工事施工にあたり、交通規制・振動等ご迷惑をお掛けております。向こう3か月の施工予定箇所は上記破線のとおりです。施工予定箇所は、変更となる場合があります。(上記のほかにガスの布設工事も併せて行います。)
