


石巻市複合文化施設整備事業

事業完了

複合文化施設整備スケジュール

項目	25				26				27				28				29				30				1				2				進捗率	備考
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1		
基本構想	基本構想																												100%	完了				
用地選定					用地選定																								100%	完了				
基本計画					基本計画・パブリックコメント																								100%	完了				
本体設計									設計プロポーザル・ 基本設計・実施設計																				100%	完了				
展示設計													展示・計画・設計																100%	完了				
建設工事																					本体工事				展示工事				本体工事: 100% 展示工事: 100%	完了				
開館準備																					開館関連業務								100%	完了				

事業位置図

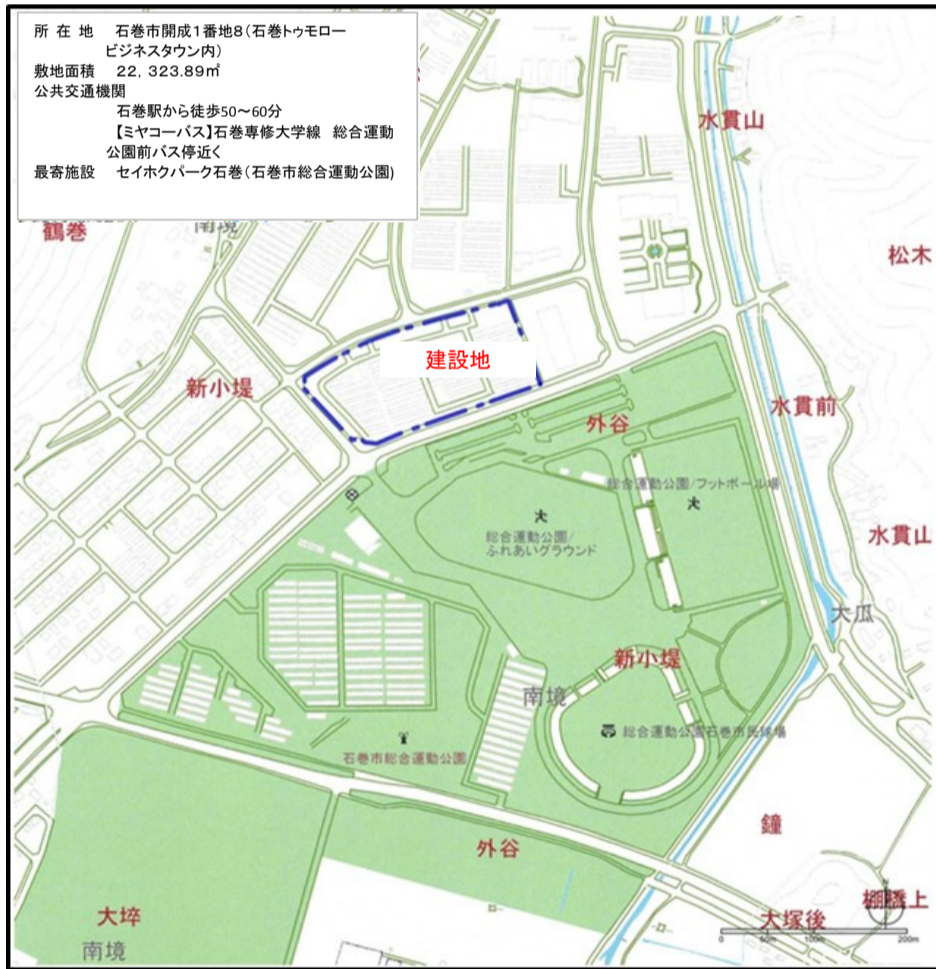

完成写真

