


市街地部 主な復興事業

復興事業 進捗状況

事業名		凡例		事業名		記号	
D-1 道路整備 (市施行)	↔	河川堤防整備 (国施工) (かわまちづくり範囲)	—	土地区画整理事業 (住居系)	■		
D-2 道路整備 (市施行)	↔	防潮堤整備 (県施行)	—	土地区画整理事業 (産業系)	■		
社総交道路整備 (市施行)	↔	道路整備 (県施行)	—	産業団地整備事業	■		
公園・緑地整備	■	多重防御施設	●●●●●●●●	再開事業	■		
高台避難場所・避難路事業	●	復興推進地域	—	優良建築物整備事業	■		

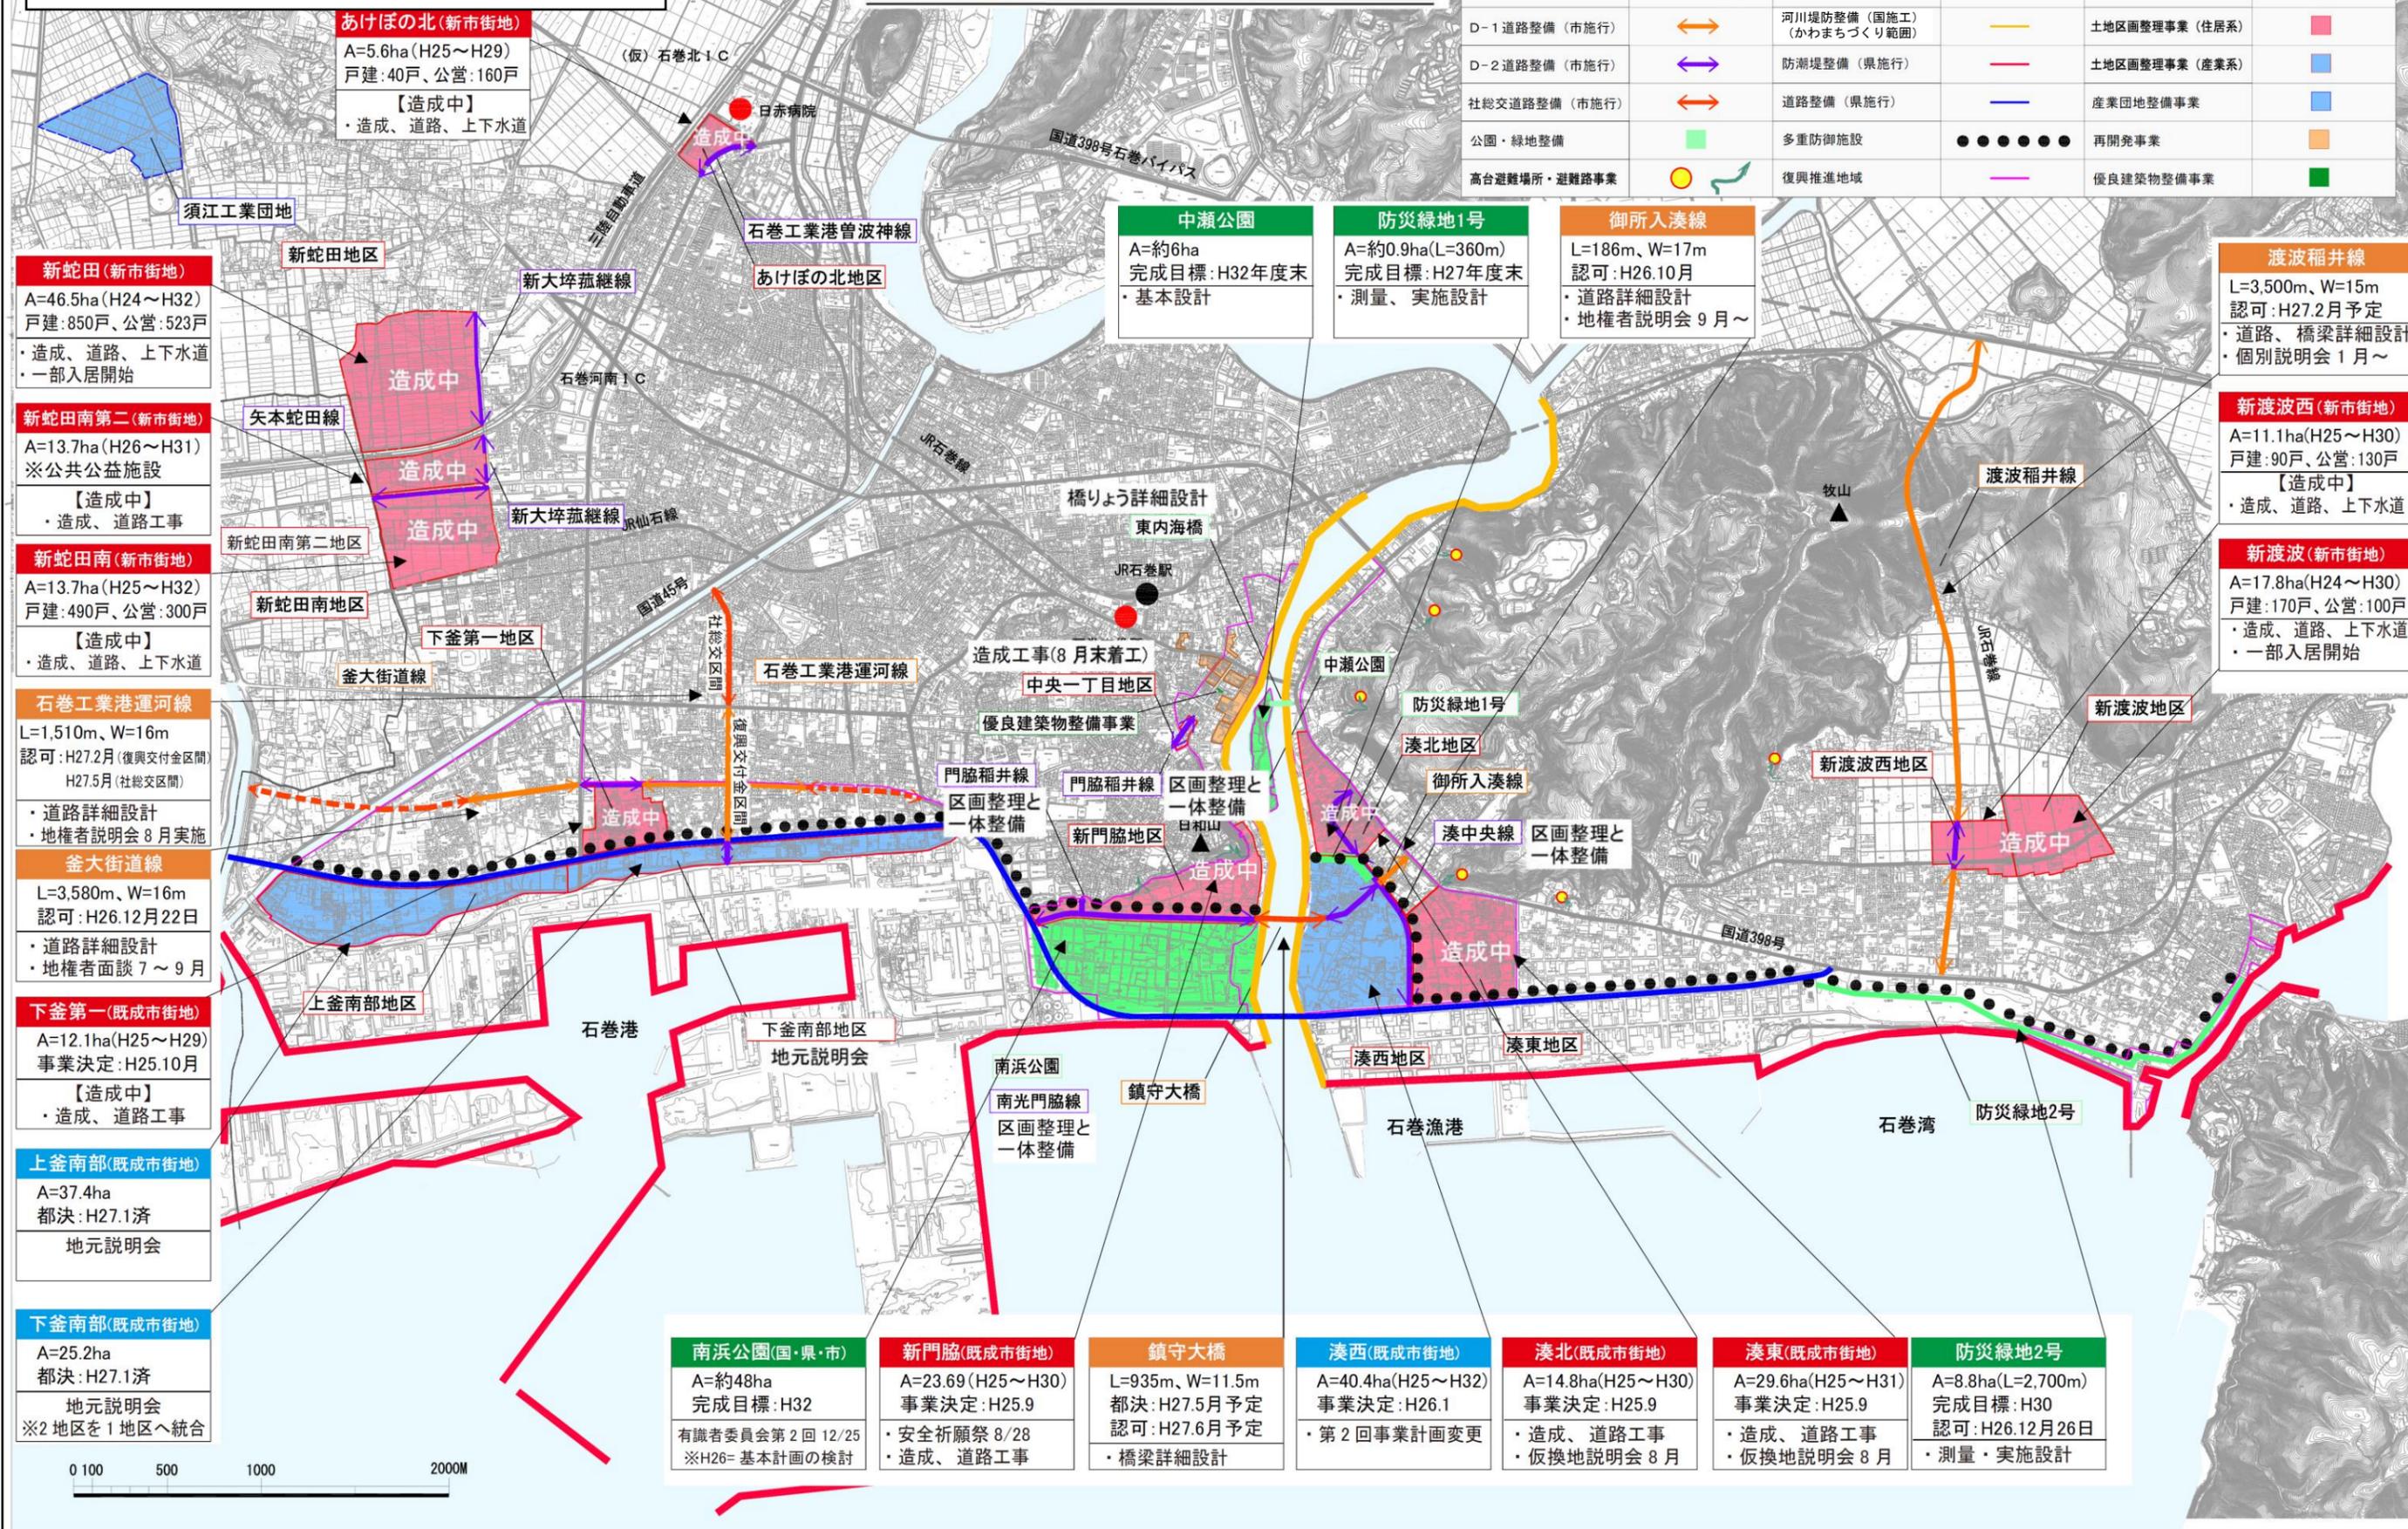

あけぼの北(新市街地)
A=5.6ha(H25~H29)
戸建:40戸、公営:160戸
【造成中】
・造成、道路、上下水道

新蛇田(新市街地)
A=46.5ha(H24~H32)
戸建:850戸、公営:523戸
・造成、道路、上下水道
・一部入居開始

新蛇田南第二(新市街地)
A=13.7ha(H26~H31)
※公共公益施設
【造成中】
・造成、道路工事

新蛇田南(新市街地)
A=13.7ha(H25~H32)
戸建:490戸、公営:300戸
【造成中】
・造成、道路、上下水道

石巻工業港運河線
L=1,510m、W=16m
認可:H27.2月(復興交付金区間)
H27.5月(社総交区間)
・道路詳細設計
・地権者説明会 8月実施

釜大街道線
L=3,580m、W=16m
認可:H26.12月22日
・道路詳細設計
・地権者面談 7~9月

下釜第一(既成市街地)
A=12.1ha(H25~H29)
事業決定:H25.10月
【造成中】
・造成、道路工事

上釜南部(既成市街地)
A=37.4ha
都決:H27.1済
地元説明会

下釜南部(既成市街地)
A=25.2ha
都決:H27.1済
地元説明会
※2地区を1地区へ統合

中瀬公園
A=約6ha
完成目標:H32年度末
・基本設計

防災緑地1号
A=約0.9ha(L=360m)
完成目標:H27年度末
・測量、実施設計

御所入湊線
L=186m、W=17m
認可:H26.10月
・道路詳細設計
・地権者説明会 9月~

渡波稲井線
L=3,500m、W=15m
認可:H27.2月予定
・道路、橋梁詳細設計
・個別説明会 1月~

新渡波西(新市街地)
A=11.1ha(H25~H30)
戸建:90戸、公営:130戸
【造成中】
・造成、道路、上下水道

新渡波(新市街地)
A=17.8ha(H24~H30)
戸建:170戸、公営:100戸
・造成、道路、上下水道
・一部入居開始

南浜公園(国・県・市)
A=約48ha
完成目標:H32
有識者委員会第2回 12/25
※H26=基本計画の検討

新門脇(既成市街地)
A=23.69(H25~H30)
事業決定:H25.9
・安全祈願祭 8/28
・造成、道路工事


鎮守大橋
L=935m、W=11.5m
都決:H27.5月予定
認可:H27.6月予定
・橋梁詳細設計

湊西(既成市街地)
A=40.4ha(H25~H32)
事業決定:H26.1
・第2回事業計画変更

湊北(既成市街地)
A=14.8ha(H25~H30)
事業決定:H25.9
・造成、道路工事
・仮換地説明会 8月

湊東(既成市街地)
A=29.6ha(H25~H31)
事業決定:H25.9
・造成、道路工事
・仮換地説明会 8月


防災緑地2号
A=8.8ha(L=2,700m)
完成目標:H30
認可:H26.12月26日
・測量、実施設計




半島部 主な復興事業

○基本的な考え方

被災前




復興まちづくり



○半島部拠点エリアの整備


にっこり地区(北上地区)

北上総合支所、公民館、統合小学校、多目的広場等を、住宅団地の隣接地に集約して整備し、北上地域全域の生活拠点を形成します。

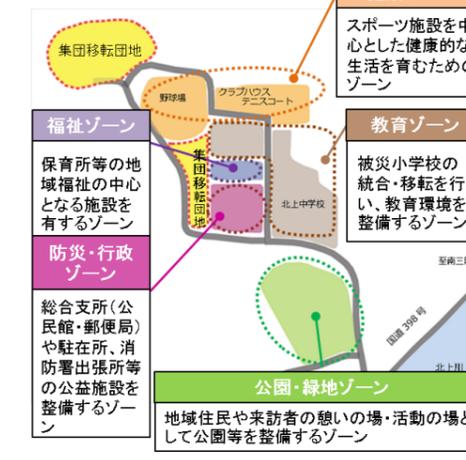


雄勝中心部地区(雄勝地区)

雄勝総合支所、公民館、消防署出張所、駐在所、硯伝統産業会館、市場型商業施設等を住宅団地の隣接地に集約して整備し、雄勝地域全域の生活、緊急時、観光の拠点を形成します。

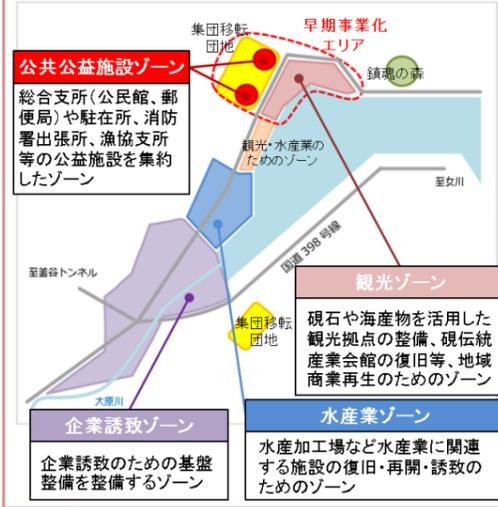

鮎川浜地区(牡鹿地区)

捕鯨文化の展示施設、商業施設、旅客船関連施設等の施設を集約して整備することで、牡鹿地域の観光の拠点を形成します。

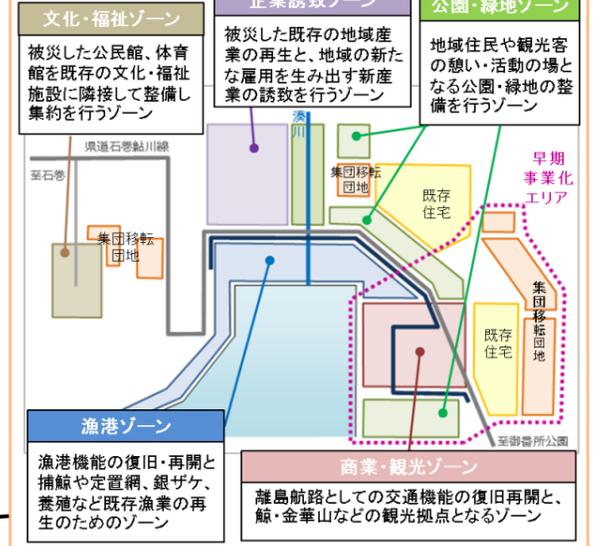

○防災集団移転促進事業(高台住宅地整備)位置図

河北地域

地区数：2 地区
箇所数：2 箇所

北上地域

地区数：8 地区
箇所数：10 団地

雄勝地域

地区数：13 地区
箇所数：17 箇所

本庁半島地域


地区数：11 地区
箇所数：15 箇所

牡鹿地域

地区数：12 地区
箇所数：18 箇所

- 【凡例】
- 竣工済み
 - 工事着工済み
 - 工事未着手

※全地区で大臣同意済
着工済：46地区(62箇所)
竣工：5地区(6箇所)

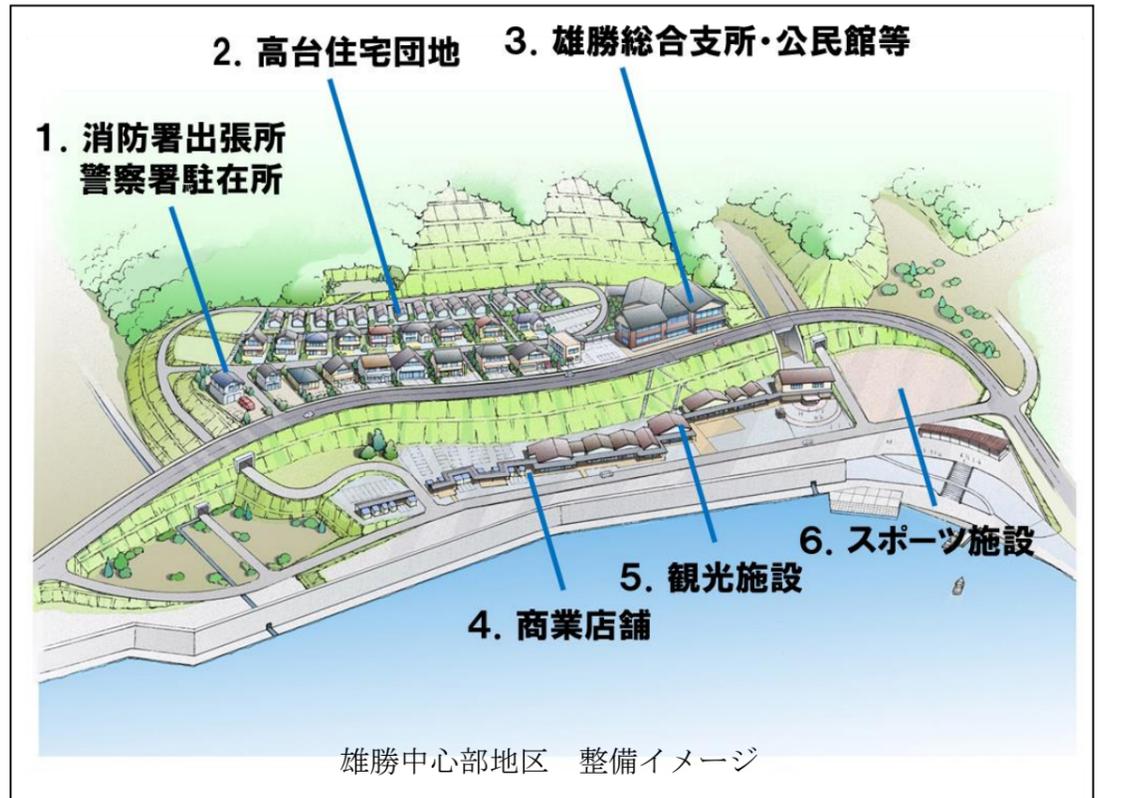

雄勝中心部地区 整備イメージ
