

# 漁港施設等の復旧・復興整備(34市管理漁港)



◆被災した漁港施設の復旧・復興整備を行います。

震災復興基本計画【主な重点プロジェクト:海と大地との共生プロジェクト】(抜粋)

事業名	実施時期									
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
漁港災害復旧事業	[Green bar indicating project duration from H23 to H27]									

事業名	漁港類型	H23				H24				H25				H26				H27			
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
漁港災害復旧事業	拠点漁港	応急工事・設計				復旧工事				復旧工事				復旧工事				復旧工事			
	拠点以外	応急工事・設計				復旧工事				復旧工事				復旧工事				復旧工事			
漁港施設機能強化事業 (※)	拠点漁港					設計・漁港用地嵩上げ				設計・漁港用地嵩上げ				設計・漁港用地嵩上げ				設計・漁港用地嵩上げ			
	拠点以外					設計・漁港用地嵩上げ				設計・漁港用地嵩上げ				設計・漁港用地嵩上げ				設計・漁港用地嵩上げ			

※ 本事業の主な内容は、市管理漁港の災害復旧事業と併せて実施される漁港用地嵩上げです。石巻市震災復興基本計画の「海と大地との共生プロジェクト」に位置付けられている「漁港施設機能強化事業」(実施主体:県、実施期間:H23~H25)の内容は、県管理漁港である石巻漁港の後背地について、民有地と一体的な嵩上げを実施するものです。

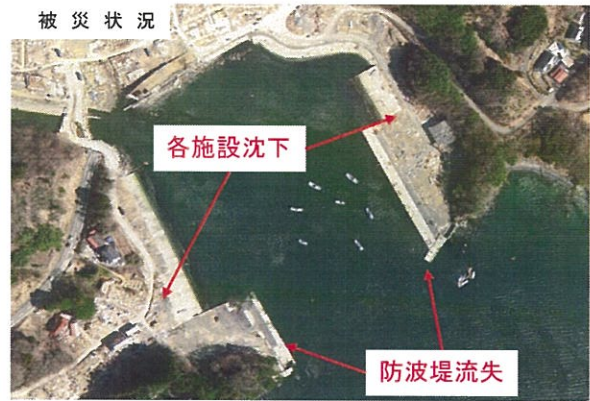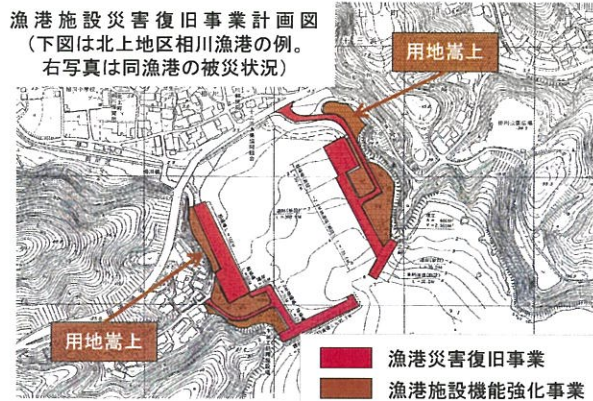






石巻市漁港位置図

県管理漁港 10 漁港

漁港番号	漁港名	種別	記号
1420060	雄勝	第2種	②
1420068	青磯	第2種	②
1420070	網地	第2種	②
1420075	福貴浦	第2種	②
1420077	狐崎	第2種	②
1420080	桃ノ浦	第2種	②
1420090	仁斗田	第2種	②
1430040	渡波	第3種	③
1430050	石巻	特定第3種	③
1440010	鮎川	第4種	④

石巻市内県管理漁港一覧表

市管理漁港 3,4 漁港	市管理漁港 3,4 漁港	市管理漁港 3,4 漁港	市管理漁港 3,4 漁港
1410630	北上	1410920	泊
1410635	白浜	1410930	新山
1410640	長面	1410940	十八成
1410650	名振	1410950	小瀬
1410660	船越	1410960	給分
1410670	荒	1410970	大原
1410680	大須	1410980	小瀬倉
1410690	鹿沢	1410990	池ノ浜
1410700	藤坂	1411000	長ノ浜
1410710	羽坂	1411030	竹ノ浜
1410720	桑の浜	1411040	牧ノ浜
1410730	小島	1411050	侍浜
1410740	明神	1411060	月浦
1410750	水浜分派	1411070	輪浜
1410890	前瀬	1411080	折ノ浜
1410900	谷川	1411090	折ノ浜
1410910	鮎川	1411100	大泊

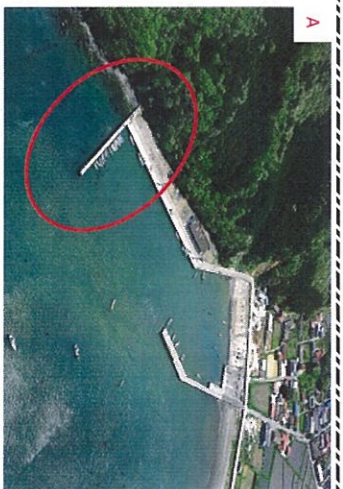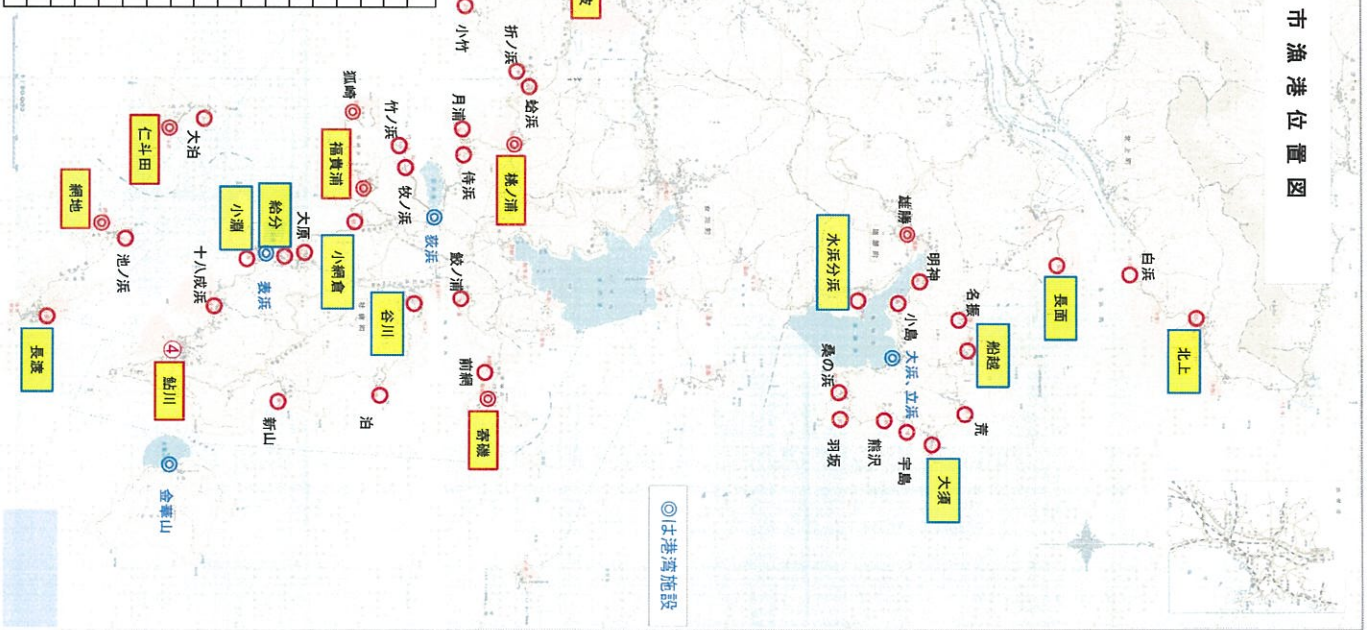



谷川漁港

- A 被災前
- B 被災状況(防波堤流失)
- C 防波堤完成状況(5月末)



給分漁港

- D 被災前
- E 被災状況(物揚場沈下)
- F 物揚場本体工施工状況
- 背後用地着上施工状況(9月20現在)

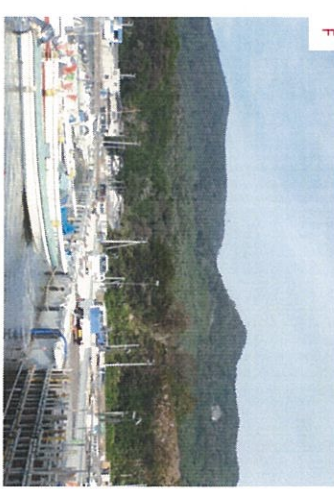



○ 漁港施設の災害復旧事業 スケジュール

上段:計画 下段:実施

地区	漁港名	漁港類型	H23	H24	H25	H26	H27
			応急復旧・実施設計	復旧工事	復旧工事	復旧工事	
北上	北上	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	白浜	拠点以外					
河北	長面	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
雄勝	名振	拠点以外					
	船越	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	荒	拠点以外					
	大須	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	宇島	拠点以外					
	熊沢	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	羽坂	拠点以外					
	桑の浜	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	小島	拠点以外					
	明神	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	水浜分浜	拠点漁港					
	牡鹿	前網	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計			
鯨ノ浦		拠点以外					
谷川		拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				

\* 黒色:計画 青色:実績 赤色:契約済(実施中) 黄色:発注手続中(未契約)

○ 漁港施設の災害復旧事業 スケジュール

上段:計画 下段:実施

地区	漁港名	漁港類型	H23	H24	H25	H26	H27
			応急復旧・実施設計	復旧工事	復旧工事	復旧工事	
牡鹿	泊(大原)	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	新山	拠点以外					
	十八成浜	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	小淵	拠点漁港					
	給分	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	大原	拠点以外					
	小網倉	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	池ノ浜(離島)	拠点以外					
本庁	長渡	拠点漁港(離島)	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	竹ノ浜	拠点以外					
	牧ノ浜	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	侍浜	拠点以外					
	月浦	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	蛤浜	拠点以外					
	折ノ浜	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	小竹	拠点以外					
大泊	拠点以外(離島)	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計					

\* 黒色:計画 青色:実績 赤色:契約済(実施中) 黄色:発注手続中(未契約)

※ 青字の「拠点漁港」については、平成25年度完了予定であったが、24年度の入札不調及び資材高騰により完成時期に遅れが生じたもの
