

雄勝中心部地区拠点エリア整備事業及び関連事業 事業完了

長期スケジュール

事業名	実施時期							
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	R1	R2
拠点エリア整備事業								

短期スケジュール (R3.3.31時点)


項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度		令和2年度		進捗率	備考	
	10						4	7	10	1	4			7
防集事業														
市事業														
雄勝中心部(伊勢畑)地区	基本計画・事業計画	基本設計・実施設計・測量調査		用地買収		造成工事							100%	
拠点エリア整備事業														
市事業														
被災跡地の嵩上(低平地)	基本計画・事業計画	基本設計・実施設計・測量調査		用地買収		造成工事							100%	令和2年1月完了
観光物産交流施設													100%	令和2年3月完成
雄勝現伝産業会館													100%	令和2年3月完成
体育施設													100%	令和3年2月完成
雄勝総合支所等整備事業														
市事業														
雄勝総合支所・公民館													100%	令和3年2月完成
県事業														
県道整備	基本計画・事業計画	基本設計・実施設計・測量調査		用地買収		造成工事								令和3年3月完了
防潮堤整備														令和2年3月完了

■事業位置図



雄勝中心部地区 拠点エリア整備事業位置

■計画図(地区全体)

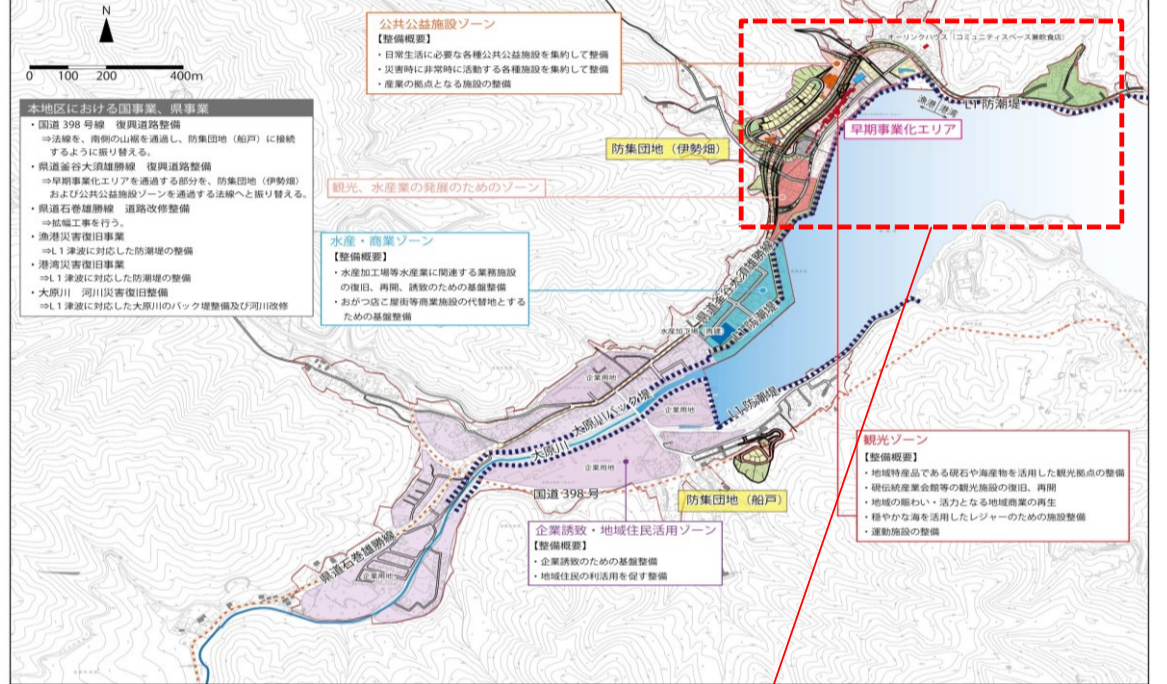

■土地利用計画図



■完成写真①(令和3年3月時点)



■完成写真②(令和3年3月時点)

