


主な復興事業の進捗状況と今後の予定 (第20回:テーマ「グラフで見る復旧・復興の進捗状況」)

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。今回は、さまざまな復旧・復興事業の進捗状況について、グラフや写真を使って紹介します。(指標は平成26年3月末現在のものです)

項目	A:復旧・復興状況の指標		B:被害状況の指標		進捗率(%) = A ÷ B (▲は、H25年9月時点の進捗率)
	指標内容	数値	指標内容	数値	
震災がれきの一次処理	A:一次仮置き場までの収集運搬済みの量	4,232千ト	B:災害廃棄物の推計処理量	4,232千ト	100% ▲(80%)
水産加工団地の再建状況	A:再開した企業数	112社	B:震災前の企業数	207社	54% ▲(54%)
漁港の復旧状況	A:工事発注済みの漁港数	33漁港	B:被災した漁港数	44漁港	75% ▲(68%)

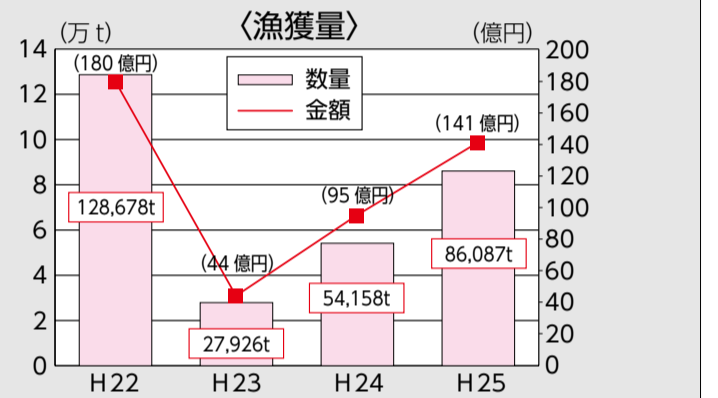

市道・橋りょう・河川等の復旧状況	A:復旧工事が完了した市道・橋りょう・河川等の箇所数	445カ所	B:被災した市道・橋りょう・河川等の箇所数	634カ所	70% ▲(46%)
土地区画整理事業の進捗状況	A:事業認可済みの地区数	11地区	B:区画整理事業を実施する地区数	15地区	73%
	A:造成工事着工数	5地区	B:区画整理事業を実施する地区数	15地区	33%

＜新市街地区画数および供給年度について＞


地区名	面積	区画数	公営住宅
		(供給開始)	(供給開始)
新蛇田	46.5ha	850区画 (H26年度)	520戸 (H26年度)
新蛇田南	27.4ha	420区画 (H27年度)	300戸 (H27年度)
あけぼの北	5.6ha	40区画 (H27年度)	160戸 (H26年度)
新渡波	17.8ha	220区画 (H26年度)	50戸 (H27年度)
新渡波西	11.1ha	180区画 (H27年度)	-
合計	108.4ha	1,710区画	1,030戸

＜新市街地・既成市街地整備について＞



項目	A:復旧・復興状況の指標		進捗率(%) = A ÷ B (▲は、H25年9月時点の進捗率)	
	B:被害状況の指標			
水田の復旧状況	A:平成26年度作付可能な水田面積	1,437ha	81%	
	B:津波により冠水した水田面積	1,771ha		
防災集団移転促進事業の状況	A:事業認可済みの地区数	51カ所	100%	
	B:対象地区数	51カ所		
	A:造成工事着工地区数	22カ所	43%	
	B:対象地区数	51カ所		

<防集団地整備イメージ>

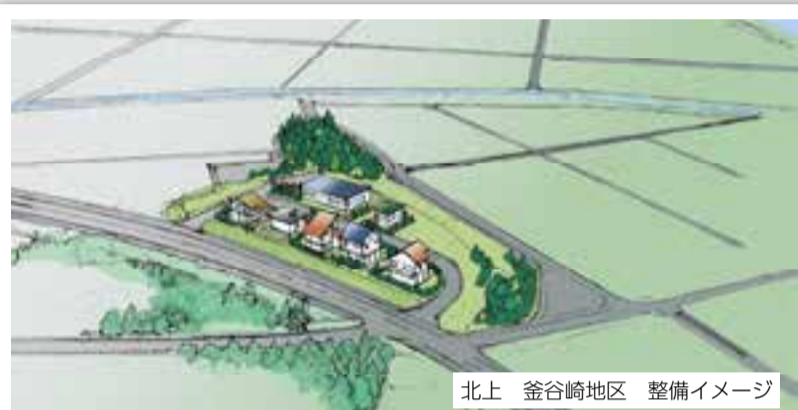

復興公営住宅の整備状況 (市街地)	A:用地取得済みの戸数	2,353戸	72%	
	B:復興公営住宅の整備目標戸数	3,250戸		
	A:工事着手済みの戸数	723戸	22%	
	B:復興公営住宅の整備目標戸数	3,250戸		
	A:入居開始済みの戸数	149戸	5%	
	B:復興公営住宅の整備目標戸数	3,250戸		

<復興公営住宅整備イメージ>

復興公営住宅については、平成26年度中に全体の32パーセントにあたる約1,270戸が供給され、平成29年度までには計画戸数すべてを整備することを目標としています。



次回は、防災集団移転促進事業・復興公営住宅進捗状況(市街地)について紹介する予定です。
