

平成26年度 第9回石巻市震災復興推進本部

日時:平成26年12月24日(水)

庁議終了後

会場:庁議室

次 第

1 開 会

2 報告事項

(1) 復興事業(事務)の進捗状況について

3 その他

4 閉 会

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興政策部
内 容	<p>【復興政策課】</p> <p>○被災集落の土地利用に関する懇談会</p> <p>11月30日 荻浜地区 12月7日 竹浜地区、小網倉・清水田浜地区 12月8日 鮫浦地区 12月11日 雄勝地区 12月17日 白浜地区 12月21日 桃浦地区、十八成浜地区</p> <p>○復興戦略検討チーム</p> <p>11月5日 復興戦略検討チーム(第15回) 11月27日 復興戦略検討チーム(第16回)</p> <p>○少子化対策検討チーム</p> <p>11月4日 健康推進課へのヒアリング 11月5日 子育て支援NPOへのヒアリング 11月10日 助産師へのヒアリング(1回目) 11月12日 第13回会議 ・関係者ヒアリングの報告 ・少子化対策における具体的な事業の検討</p> <p>11月18日 石巻専修大学生へのヒアリング 11月20日 助産師へのヒアリング(2回目) 11月25日 婚活イベント主催NPOへのヒアリング 11月26日 第14回会議 ・関係者ヒアリングの報告</p> <p>12月4日 学校教育課へのヒアリング 12月10日 第15回会議 ・市長提言へ向けたグループ討議</p> <p>【地域協働課】</p> <p>○復興住宅事前説明会</p> <p>11月1日:大街道西一、二番谷地 11月8日:築山二丁目、青葉東 11月15日:黄金浜北 11月22・29日:新蛇田E 12月6日:泉町4丁目、大街道北</p> <p>○復興住宅現地見学会</p> <p>11月16日:黄金浜南、浜松町 11月30日:青葉西 12月14日:青葉東 12月20日:今泉前、六本木畑 1月18日:黄金浜 1月25日:新蛇田A、築山二丁目</p>
課 題	<p>【復興政策課】</p> <p>復興交付金制度の期間延長及び適用範囲の拡大</p>

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	総務部
内 容	<p>【秘書広報課】 （仮称）石巻市復興まちづくり情報交流館設置事業 中央館・日和山設置工事 建 物 軽量鉄骨造平屋建（プレハブ）建築面積 136.71 m² スケジュール 平成 26 年 10 月 29 日 契約 平成 26 年 11 月 28 日 着工 平成 26 年 11 月 ～平成 27 年 2 月 展示内容の検討、製作 平成 27 年 3 月 完成予定</p> <p>【防災推進課】 ○女川消防署牡鹿出張所建設事業 【清崎運動公園入口付近】 敷地面積 約 1, 5 0 0 m² 建物 鉄筋コンクリート 1 階建 5 9 3 m² スケジュール 6 月 1 3 日 保安林解除、自然公園法許可取得 7 月 9 日 造成工事落札 7 月 1 5 日 造成工事契約・着工 8 月 2 9 日 設計委託業務完了 1 1 月 1 2 日 建設工事落札 1 1 月 1 7 日 建設工事仮契約 1 2 月 第 4 回定例会建設工事請負契約議案提出</p> <p>○（仮称）石巻東消防署建設事業 【新渡波地区区画整理地内】 敷地面積 約 5, 4 0 0 m² （訓練スペース・ヘリポート・駐車場・ 消防団ポンプ置場含む） 建物 鉄筋コンクリート 2 階建 約 1, 2 0 0 m² スケジュール 7 月 2 日 地質調査業務落札 7 月 8 日 地質調査業務契約・調査着手 7 月 9 日 基本・実施設計落札 7 月 1 7 日 基本・実施設計契約・設計着手 2 月 基本・実施設計業務完了（予定）</p> <p>○（仮称）石巻消防署西分署建設事業 【向陽町 5 丁目市営住宅敷地内】 敷地面積 約 2, 3 0 0 m² 建物 鉄筋コンクリート 2 階建 約 9 0 0 m² スケジュール</p>

	<p>5月 2日 電気・機械設備工事契約 5月 30日 建設工事落札 6月 20日 蛇田区長会へ説明 6月 23日 第2回定例会建設工事請負契約承認 6月 24日 建設工事契約 3月 完成予定</p> <p>○大宮町津波避難タワー建設事業 【大宮町3番15】 敷地面積 1,405.52㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 6月18日 建設工事落札 7月 7日 第2回定例会建設工事請負契約承認 7月30日 渡波区長会へ説明 7月31日 安全祈願祭 8月 1日 工事着工 3月 完成予定</p> <p>○魚町一丁目津波避難タワー建設事業 【魚町一丁目3番7】 敷地面積 2,650㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 11月12日 建設工事落札 12月 第4回定例会建設工事請負契約議案提出</p> <p>○魚町三丁目津波避難タワー建設事業 【魚町三丁目6番5】 敷地面積 2,821.75㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 11月12日 建設工事落札 12月 第4回定例会建設工事請負契約議案提出</p> <p>○西浜町津波避難タワー建設事業 【西浜町1番地】 敷地面積 997.03㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 11月 5日 地質調査業務及び設計業務落札</p>
<p>課 題</p>	<p>【秘書広報課】 (仮称)石巻市復興まちづくり情報交流館の管理・運営方法の検討</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

	<ul style="list-style-type: none"> ・事業地買収等 H27.1～ 実施予定 <p>(8) 都市計画道路 石巻工業港運河線</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元説明会開催 H27.12.8～11 開催 ・都市計画決定(変更) H26.12 公告予定 <li style="padding-left: 2em;">〃 H27. 1公告予定 <p>(9) 市街地再開発事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ①中央三丁目 1 番地区 <ul style="list-style-type: none"> ・建築工事中 ②立町二丁目 5 番地区 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画の変更認可(H26.11.19) ・権利変換計画の認可申請 ③中央一丁目 14・15 番地区 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画の変更認可(H26.10.23) ・権利変換計画認可(H26.11.27) ④中央二丁目 11 番地区 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画策定中 ⑤その他検討地区 <ul style="list-style-type: none"> ・立町一丁目 4・5 番地区 ・中央二丁目 4 番地区 ・中央二丁目 3 番地区 <p>(10)優良建築物等整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ①松川横丁地区 <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計中 <p>【区画整理第 1 課】</p> <p><11月></p> <ul style="list-style-type: none"> ・新蛇田地区宅地供給開始式(H26.11.3) ・新渡波地区宅地供給開始式(H26.11.15) ・第3回石巻市新渡波西地区被災市街地復興土地区画整理審議会(H26.11.27) <p><12月></p> <p>なし</p> <p>【区画整理第2課】</p> <p>(1)新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <p>(2)湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.12.18(木)第 7 回湊東地区土地区画整理審議会(401 会議室) <p>(3)湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.11.23(日)湊北地区まちづくり意見交換会(みなと荘) ・H26.12.21(日)湊北地区まちづくり懇談会(みなと荘) <p>(4)下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <p>(5)中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.11.6(木)中央一丁目地区道路築造・埋設管工事について市議会へ付議
--	--

- ・H26.11.7(金)中央一丁目地区道路築造・埋設管工事本契約
- ・H26.11.20(木)中央一丁目まちづくり検討協議会

(6) 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26.11.12(水)湊西地区土地区画整理事業 宅地造成・道路築造工事入札
- ・H26.12.5(金)議会承認後、本契約
- ・H26.12.5(金)第2回事業計画変更
- ・H26.12.12(金)事業者との意見交換会(みなと荘)
- ・H26.12.18(木)第5回湊西地区土地区画整理審議会(401 会議室)

(7) 下釜南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26.12.2(火)都市計画決定(案)の縦覧開始を新聞掲載(地元2紙)
- ・H26.12.25(木)都市計画審議会にて都市計画決定予定

【集団移転推進課】

すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しており、施工CMRと専門業者が契約を結び、12・1月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。

12月予定

- 《本庁半島地区》 牧浜、福貴浦
- 《牡鹿地区》 小湊浜
- 《雄勝地区》 分浜、波板
- 《北上地区》 小泊

1月予定

- 《雄勝地区》 中心部A(船戸)

【用地管理課】

<11月>

- ・H26.11.9(日) 新蛇田団地宅地契約会
- ・H26.11.15(土) 新渡波団地宅地契約会

<12月>

- ・H26.12.7(日) 月浦団地契約説明会
- ・H26.12 月中旬～下旬 前網浜団地、鮫浦団地契約説明会
- ・H26.12 月下旬 月浦団地契約会

<1月>

- ・H27.1 月中旬～下旬 前網浜団地、鮫浦団地契約会

【復興住宅課】

- ・H26.11.1 栄田復興住宅(整備戸数15戸)入居開始
- ・H27.1.15 しらさぎ台復興住宅(整備戸数24戸)入居開始予定
黄金浜第三復興住宅(整備戸数15戸)入居開始予定

	浜松町復興住宅(整備戸数26戸)入居開始予定
課 題	<p>【基盤整備課】</p> <p>(1) 市街地再開発事業</p> <p>①中央二丁目 11 番地区</p> <p>・核となる観光交流施設の管理運営主体の早期決定と施設規模等の検討</p> <p>(2) 道路・公園整備事業</p> <p>①用地買収について、残地買取り方針の検討</p> <p>②建物補償者(個人、事業所)との補償について、移転先を予定している、区画整理、復興住宅等の整備の進捗と、当該工事の着手予定時期の調整</p> <p>(3) 都市公園事業</p> <p>①南浜公園</p> <p>・県、市の区域区分の早期決定と、事業手法の検討</p> <p>②津波防災緑地及び防災公園整備に係る盛土材の確保</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	河北総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <p>11/7 第8回大川地区復興協議会</p> <p>11/20 河北(二子)団地45号アクセス道地権者説明会</p> <p>12/11 大川地区復興協議会(執行部会)</p> <p>12/18 第10回二子まちづくり協議会</p> <p>1月下旬 二子まちづくり協議会(現地視察)</p>
課 題	<p>【地域振興課】</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	雄勝総合支所
内 容	<p>【地域振興課・復興対策 G】</p> <p>11月 9日 伊勢畑地区防集団地 地権者説明会 21日 唐桑地区防集団地安全祈願祭</p> <p>※12月、1月の予定</p> <p>12月 1日 復興住宅住民説明会 11日 分浜、波板地区防集団地安全祈願祭 雄勝地区復興整備計画等説明会</p> <p>1月 防潮堤、漁集、道路関係 地区説明会予定</p>
課 題	【地域振興課・復興対策 G】

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	牡鹿総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・11月 6日 鮎川港まちづくり協議会(第13回) ・11月13日 鮎川(熊野公営)地区防集工事説明会 ・11月14日 小網倉地区防集団地復興公営住宅WS ・11月21日 鮎川(寺前公営)地区復興公営住宅WS <p>※12月、1月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・12月 鮎川港まちづくり協議会(第14回・第15回) ・12月 鮎川(熊野公営)地区復興公営住宅WS ・12月 鮎川地区復興公営住宅抽選会 ・12月～1月 被災低平地の土地利用に関する住民懇談会 (第1期地区 小網倉・清水田浜、鮫浦、十八成、大原) ・ 1月 鮎川(熊野団地)地区防集団地地権者契約開始
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	<p>【環境課】</p> <p>事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事</p> <p>平成26年12月 敷地造成（敷地内掘削、発生土場外搬出） 及び排水施設工、調整池工</p> <p>平成27年1月 同上</p> <p>平成28年4月 供用開始予定</p>
課 題	<p>【環境課】</p> <p>・現時点では特になし。</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	<p>【夜間急患センター】 [石巻市夜間急患センター建設] ○現在、実施設計中</p> <p>[再建に係る隣接市町との意見交換] ○平成26年10月28日 第3回意見交換会開催 ○平成27年1月（予定） 第4回意見交換会開催</p> <p>【包括ケア推進室】 ○平成26年11月10日 第6回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画中間案 ○平成26年11月13日 地域包括ケア普及啓発研修会（介護関係者対象） 講師：NPO法人わらいの館「四季」理事長 白石 弘美 氏 ※参加者数：64人（スタッフ含む） ○平成26年11月27日 石巻市地域包括ケア推進協議会第3回被災者支援・地域コミュニティ検討部会 ○平成26年12月2日 第7回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 ○平成26年12月5日 石巻地域復興住宅と健康・福祉のまちづくり研修会 講師：全国コミュニティライフサポートセンター 理事長 池田 昌弘 氏 ○平成26年12月8日 第8回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 ○平成26年12月10日 石巻市地域包括ケア推進協議会第2回合同検討部会</p> <p>※今後の予定 12月24日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議 12月25日 第3回石巻市地域包括ケア推進協議会 1月13日 第9回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 1月26日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議</p>
課 題	<p>【夜間急患センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再建の財源確保 宮城県地域医療再生基金の増額等財源確保に向けた隣接市町と連携した国県への要望強化等

	<ul style="list-style-type: none">・再建財源と運営費用 隣接市町と再建及び運営についての負担に関する協議 <p>【包括ケア推進室】</p> <ul style="list-style-type: none">・石巻市地域包括ケア推進協議会や庁内関係課との調整・介護保険事業計画との整合性
--	---

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙 2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

(単位:千円)

		H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	計
申請金額	建設(利子補給補助)	188,145	155,194	128,516	117,018	130,715	133,693	127,934	154,005	115,063	147,767	145,469	79,979	3,355,293
	建設(取得費用補助)	121,500	108,466	73,500	81,500	68,500	45,000	37,500	70,500	39,000	67,800	44,500	39,000	2,611,980
	補修(利子補給補助)	6,957	0	1,500	1,500	1,046	1,355	0	0	0	3,000	0	1,085	71,574
	補修(補修費用補助)	171,546	100,267	65,625	77,418	75,878	48,650	48,734	65,652	42,387	39,450	48,888	37,735	3,777,962
	移転費用補助	5,118	3,627	4,879	3,862	3,798	3,607	2,928	3,813	2,204	5,145	2,974	4,273	90,191
	かさ上げ費用補助	32,550	31,409	24,366	27,886	22,674	22,980	23,100	34,362	17,762	30,947	22,236	21,153	575,752
	合計	520,083	397,583	296,523	305,241	302,207	254,728	236,891	325,918	212,794	293,896	261,902	183,123	10,259,755
申請者数	建設(利子補給補助)	69	57	49	44	47	49	47	54	41	53	52	31	1,232
	建設(取得費用補助)	82	72	49	55	46	30	25	47	26	46	30	26	1,744
	補修(利子補給補助)	5	0	1	1	1	1	0	0	0	2	0	1	51
	補修(補修費用補助)	198	116	75	87	88	58	55	76	46	46	54	41	4,177
	移転費用補助	26	20	25	14	16	15	11	17	8	20	16	15	434
	かさ上げ費用補助	40	36	30	35	30	27	29	38	22	34	27	26	747
	合計	354	245	174	187	182	138	127	177	113	147	136	99	7,204

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業

(単位:千円)

		H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	計
申請金額	利子補給補助	37,814	44,899	23,422	22,011	9,159	10,940	3,747	20,520	15,645	4,257	9,583	0	1,022,697
	移転費用補助	1,232	638	367	1,463	118	0	220	612	759	183	471	0	18,658
	合計	34,738	45,575	20,230	19,850	9,395	10,940	3,967	17,183	7,524	4,623	8,010	0	975,764
申請者数	利子補給補助	8	10	4	5	2	2	1	4	3	1	2	0	220
	移転費用補助	6	7	4	5	1	0	1	2	2	1	2	0	107
	合計	8	10	4	6	2	2	1	4	3	1	2	0	221

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)



※2 移転費用の申請者数は内数

●合計

(単位:千円)

		H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	計
申請金額		554,821	443,158	316,753	325,091	311,602	265,668	240,858	343,101	220,318	298,519	269,912	183,123	11,235,519
申請者数		362	255	178	193	184	140	128	181	116	148	138	99	7,425

(単位:人)

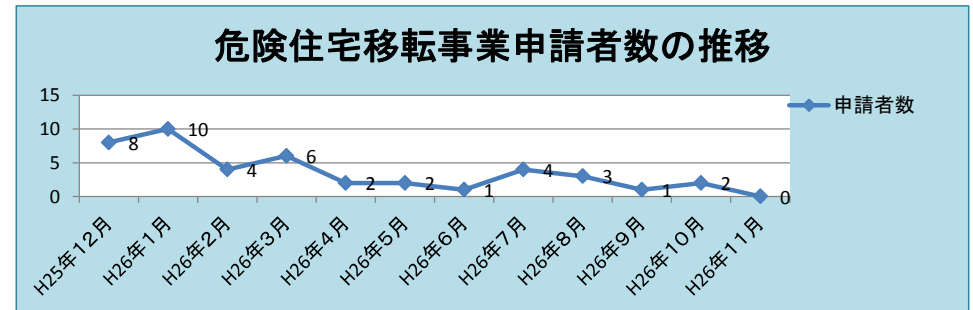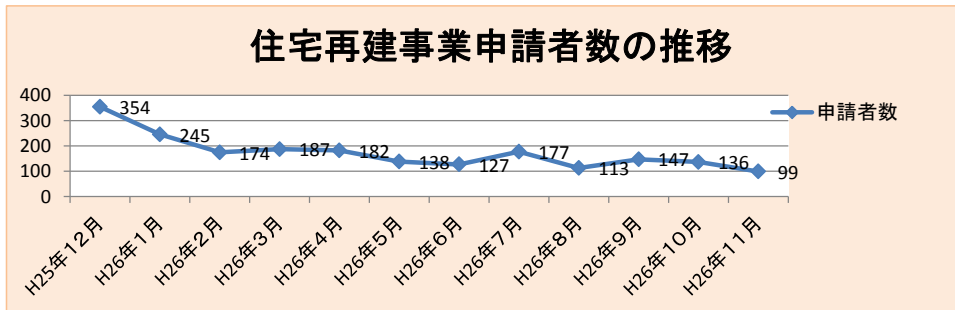

応急仮設住宅(プレハブ)の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

	団地数	供与戸数	入居戸数	空き戸数		入居世帯					退去世帯						待機世帯													
				未利用戸数	入居世帯数	入居世帯の内訳(入居理由)				退去世帯数	退去世帯の内訳(返還理由)					待機世帯数	待機世帯の内訳(待機理由)													
						県外からの帰還による入居	民賃の貸主不同意による入居	住宅解体に伴う建替えのため入居	その他		持家住宅へ転居	民間賃貸住宅へ転居	公営住宅等へ転居	災害公営住宅へ転居	プレハブ仮設住宅へ転居		その他	うち新規	うち県外	うち新規	特定の団地を希望		入居人数が間取り要件に合わない		住宅解体に伴う建替えのため希望		その他			
																					うち新規	うち新規	うち新規	うち新規						
直近の状況	平成26年6月	130	7,266	6,225	1,041	924	24	2	1	2	19	54	33	7	1	0	4	9	23	3	1	1	14	2	7	1	0	0	2	0
	平成26年7月	130	7,266	6,184	1,082	965	5	0	1	0	4	45	33	1	0	1	0	10	18	0	0	0	10	0	6	0	0	0	2	0
	平成26年8月	130	7,266	6,131	1,135	1,017	8	1	1	0	6	61	44	2	1	1	7	6	12	1	0	0	5	1	5	0	0	0	2	0
	平成26年9月	130	7,266	6,067	1,199	1,081	6	0	1	0	5	70	53	5	0	2	4	6	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
	平成26年10月	130	7,266	6,017	1,249	1,127	7	0	1	2	4	57	41	2	1	4	4	5	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
	平成26年11月	130	7,266	5,954	1,312	1,194	3	0	0	0	3	66	46	0	2	7	8	3	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
年度別の状況	平成26年度計					74	4	13	4	53	523	349	20	6	25	39	84													
	平成25年度計					351						765																		
	平成24年度計					786						772																		
	平成23年度計					7,258						201																		

※ 平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は返還届出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯を含む待機している世帯数を報告すること。

※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯以外でプレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

復興事業の進捗状況

担当部署名	産業部								
内 容	【 産業推進課 】 ・ 石巻市内陸型産業用地造成工事 工期:平成 26 年 5 月 10 日～平成 28 年 3 月 31 日 進捗状況(平成 26 年 11 月末現在): 予定工程 25.0%、実施工程 47.8%								
	【 商工課 】 ・ 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26 年 11 月末現在)								
					指定件数の内訳				
	特区の名称		指定事業者数	指定件数	法第 42 条	法第 40 条	法第 37 条	法第 38 条	法第 39 条
	石巻まちなか再生特区	H26. 10 月末	27 社	32 件	1 件	0 件	19 件	12 件	0 件
		11 月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	27 社	32 件	1 件	0 件	19 件	12 件	0 件
	愛ランド特区	H26. 10 月末	6 社	8 件	0 件	1 件	6 件	1 件	0 件
		11 月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	6 社	8 件	0 件	1 件	6 件	1 件	0 件
	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	H26. 10 月末	80 社	86 件	0 件	0 件	62 件	24 件	0 件
		11 月指定	3 社	3 件	—	—	2 件	1 件	—
		計※	82 社	89 件	0 件	0 件	64 件	25 件	0 件
	民間投資促進特区(IT産業版)	H26. 10 月末	4 社	4 件	0 件	0 件	2 件	2 件	0 件
		11 月指定	—	—	—	—	—	—	—
計		4 社	4 件	0 件	0 件	2 件	2 件	0 件	
民間投資促進特区(農業版)	H26. 10 月末	4 社	5 件	0 件	0 件	3 件	1 件	0 件	
	11 月指定	—	—	—	—	—	1 件	—	
	計	4 社	5 件	0 件	0 件	3 件	2 件	0 件	
※ 1事業者で複数の指定を受けることがあるので指定事業者数の計が前月末と当月指定の合計にならない場合があります。									

【水産課】

・石巻市水産加工団地(魚町)の再開状況(平成26年10月31日現在)

	水産加工業 及び 冷蔵倉庫等	その他関連 産業	合 計
A 震災前企業数 (社)	84	123	207
B 再開企業数 (社)	56	59	115
C 現在施工中企 業数 (社)	2	2	4
B/A 割合 (%)	66.7	48.0	55.6
(B+C)/A 割合 (%)	69.0	49.6	57.5

(単位:社、%)

※1「水産加工業及び冷蔵倉庫等」は、水産加工業、冷凍冷蔵庫業、製氷業、生鮮魚介卸売業を指します。

※2「その他関連事業」は、水産関係資材販売業、船舶・機械修理業、運送業、油卸売業、自動車整備業などを指します。

・水産物卸売市場の水揚状況(石巻売場:1月~10月)

			対22年比
平成26年	数 量	74,481 トン	74.2 %
	金 額	13,599,704 千円	93.0 %
	隻 数	30,064 隻	72.4 %
平成25年	数 量	69,082 トン	68.8 %
	金 額	10,789,938 千円	73.8 %
	隻 数	23,583 隻	56.8 %
平成22年	数 量	100,346 トン	—
	金 額	14,626,105 千円	—
	隻 数	41,534 隻	—

【農業復興推進室】

・釜幹線水路改修工事

12月契約、工事着工は1月下旬を予定。

詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p>【都市計画課】</p> <p>11月15日(土)18時00分～ 七窪蛇田線地元説明会</p> <p>11月28日(金)19時00分～ 新蛇田地区他新市街地における地区計画に関する説明会</p> <p>12月5日(金) 石巻工業港曾波神線 4車線化 供用開始</p> <p>【石巻駅周辺整備プロジェクト推進室】</p> <p>11月11日 石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する説明会の開催 (対象者…(仮称)防災センター区域内で営業又は居住されている賃借者及び賃貸者)</p> <p>12月中旬(予定) 事業認可の取得</p> <p>12月下旬～(予定) 用地買収契約の開始</p> <p>【河川港湾室】</p> <p>≪11月実施≫</p> <p>◇石巻港大型客船誘致協議会ポートセールス 【日時】 ・平成26年11月27日(木) 【場所】 ・神奈川県横浜市、東京都内所在の客船会社及び旅行会社 【内容】 ・ポートセールス 【出席者】 ・石巻市長、宮城県港湾課、東松島市産業部長、事務局</p> <p>≪12月実施予定≫</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(南浜・門脇地区) ※実施予定月変更</p>

	<p>【日時】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成26年12月中旬(案) <p>【場所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未定 <p>【目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。 <p>【出席者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南浜・門脇地区在住住民(事前登録制:定員40名) ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか <p>≪1月実施予定なし≫</p>
<p>課 題</p>	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

石巻広域都市計画

一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する説明会

日 時：平成26年11月11日（火）午後7時00分～

場 所：石巻市役所6階 石巻市議会 第1、2委員会室

次 第

1 開 会

2 あいさつ

3 説明内容

（1）これまでの経過について

（2）石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の都市計画
決定内容について

（3）今後の予定について

4 質疑応答

5 閉 会

客船誘致に向けたポートセールス活動等目的及び訪問先

(全体)

- 1 郵船クルーズ株式会社 (客船「飛鳥Ⅱ」所有会社)
住所 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー47階
目的 現在の石巻港は震災からの復旧がほぼ完了し、客船の受け入れも平成24年から再開している。
飛鳥Ⅱに関しては、今すぐには寄港をお願いできる環境ではないが、国が中心となり、港の静穏度を上げる工事が決定しており、数年後には飛鳥Ⅱを受け入れる体制が出来上がる。
石巻港を含め、震災から復旧した姿をぜひ見ていただきたいので、受け入れ態勢ができた際にはぜひ石巻港への寄港をお願いしたい。
- 2 商船三井客船株式会社 (客船「にっぽん丸」所有会社)
住所 港区赤坂1-9-13 三会堂ビル5階
目的 2市2町のオプションルツアーの企画案を持ってきたので、寄港していただく際には参考にしていきたい。
2市2町の年間のイベント情報を取りまとめた資料を持ってきたので、今後の参考にしていきたい。
(寄港実績) 平成22年、平成24年、平成26年

(1班) 亀山石巻市長ほか

- 3 株式会社エイチ・アイ・エス
住所 新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29階
目的 平成27年5月10日に寄港するコスタビクトリアのチャータークルーズ会社。
2市2町のオプションルツアーの企画案を持ってきたので、寄港の際の参考にしていきたい。

(2班) 土井建設部長ほか

- 4 日本クルーズ客船株式会社 (客船「ぱしふいっくびいなす」所有会社)
住所 千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル22階
目的 急きょ、本社との会議が入ったため要望不可に、受付に来年度の2市2町のイベント情報と来年度のツアー提案を渡すこととした。
(寄港実績) 平成24年、平成25年、平成26年
(26は読売旅行のチャータークルーズ)

- 5 株式会社読売旅行 (チャータークルーズ会社の最大手)
住所 中央区築地2-5-3 読売築地ビル5階
目的 10月31日にぱしふいっくびいなすで寄港していただいたことへのお礼。
2市2町のオプションルツアーの企画案を持ってきたので、今後の参考にしていきたい。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	教育委員会
内 容	<p>【学校教育課】 12月、1月の予定 ・ 適応指導教室整備事業（けやき教室移転新築） 【所 在】 石巻市向陽町三丁目13番7号 【施設規模】 木造平屋建て 延べ床面積 233.26㎡ 【開室月日】 平成27年1月5日</p> <p>【学校管理課】 12月、1月の予定 ・ (仮称) 石巻東学校給食センター建設工事 【入札月日】 平成26年12月1日</p> <p>【学校施設整備室】 11月の実施状況 ・ 北上小学校移転新築事業 【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会（第2回） 【開催日時】 平成26年11月5日（水）午後7時 【会 場】 北上総合支所</p> <p>12月、1月の予定 ・ 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業 【業務名称】 雄勝地区小・中学校統合移転新築用地造成工事 【業務場所】 雄勝地区大浜字小滝浜地内 【入札月日】 平成26年12月1日</p> <p>・ 北上小学校移転新築事業 【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会（第3回） 【開催日時】 平成26年12月12日（金）午後7時 【会 場】 北上総合支所</p> <p>【複合文化施設開設準備室】 12月、1月の予定 ・ 複合文化施設整備調整会議（1月開催予定） ・ 複合文化施設整備市民懇談会（1月開催予定）</p>
