

鮎川浜地区 拠点エリア整備事業

事業完了

長期スケジュール

事業名	実施時期							
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
拠点エリア整備事業	[進捗状況を示す色付きのバー]							


短期スケジュール(R3.3.31時点)

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	進捗率	備考	
	10					4	7	10	1			4
防犯事業												
市事業												
黒崎団地		基本設計・実施設計・測量調査			造成工事						100%	
鮎川浜地区拠点エリア整備事業												
被災跡地の嵩上(拠点用地)		基本計画・事業計画	基本設計・実施設計・測量調査		用地買収			造成工事			100%	令和元年度未完了
観光物産交流施設											100%	令和元年8月完成 令和元年10月4日供用開始
おしかホエールランド											100%	令和2年3月完成
捕鯨船前広場											100%	令和3年3月完成
県事業												
県道整備		基本計画・事業計画	基本設計・実施設計・測量調査									令和3年度中完了予定
防潮堤整備												令和3年度中完了予定
湊川堤防整備(拠点エリア外)												令和3年度中完了予定

■事業位置図




■計画図(地区全体)

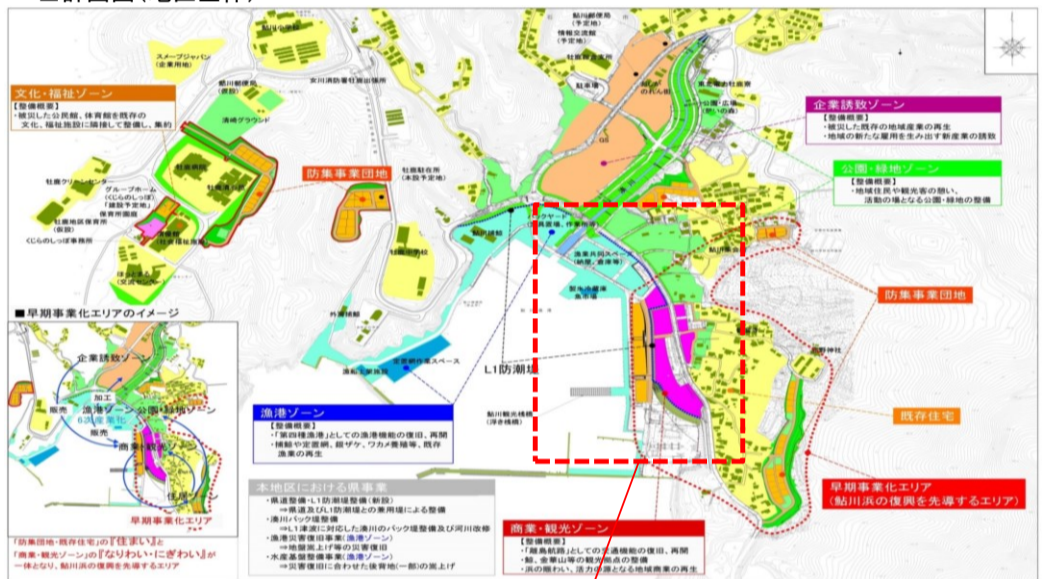

■完成写真①(令和3年3月時点)



■土地利用計画図

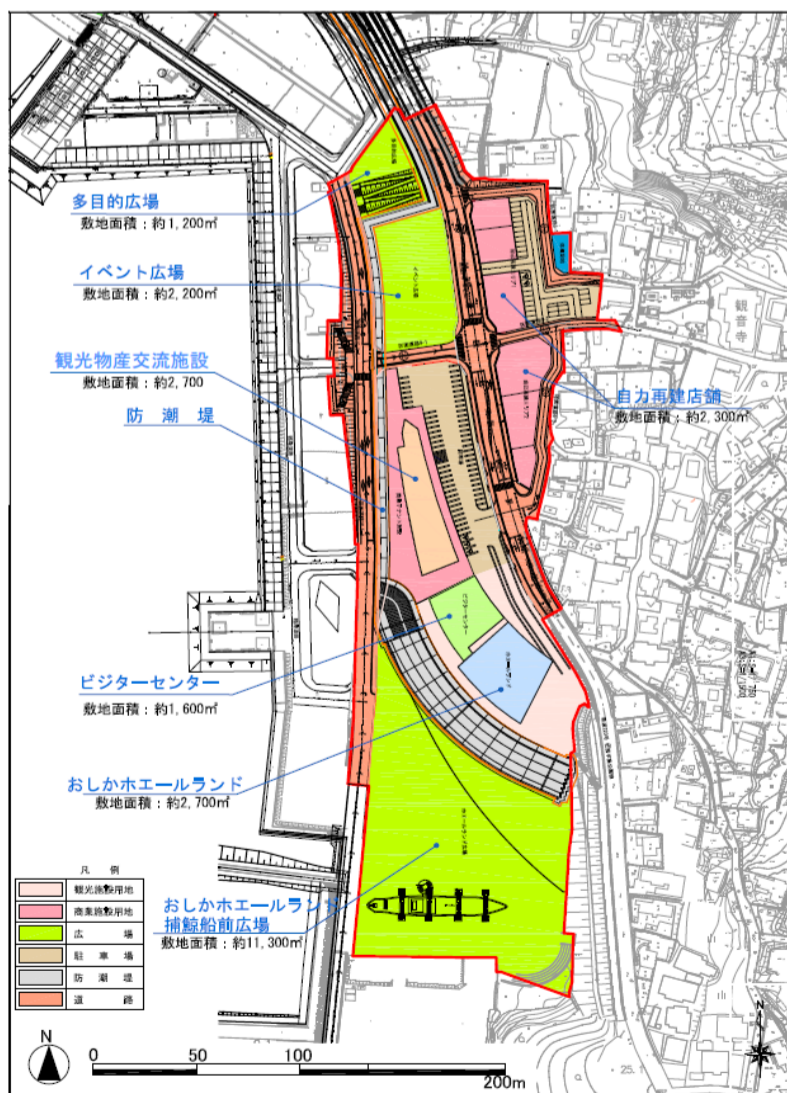

■完成写真②(令和3年3月時点)

