

北上にっこり地区 拠点エリア整備事業

事業完了


長期スケジュール

事業名	実施時期									
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
拠点エリア整備事業	[進捗バー]									


短期スケジュール(R2.5.1時点)

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度		令和2年度	備考
	10	1	4	7	10	1	4	7	10		
防集事業 市事業	[スケジュールバー]										
	にっこり団地区										
拠点エリア整備事業 市事業	仮設住宅の集約・解消										
	基礎整備										
	北上小学校										令和2年3月完成
	北上総合支所・公民館・放課後児童クラブ										令和2年3月完成
	こども園										令和2年3月完成
	消防署出張所										令和2年3月完成

■事業位置図

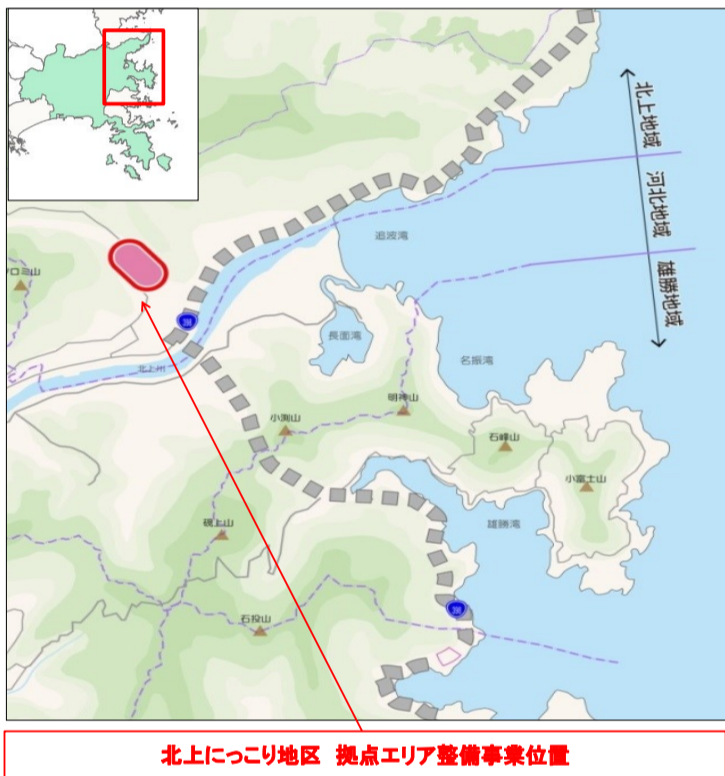

■土地利用計画図

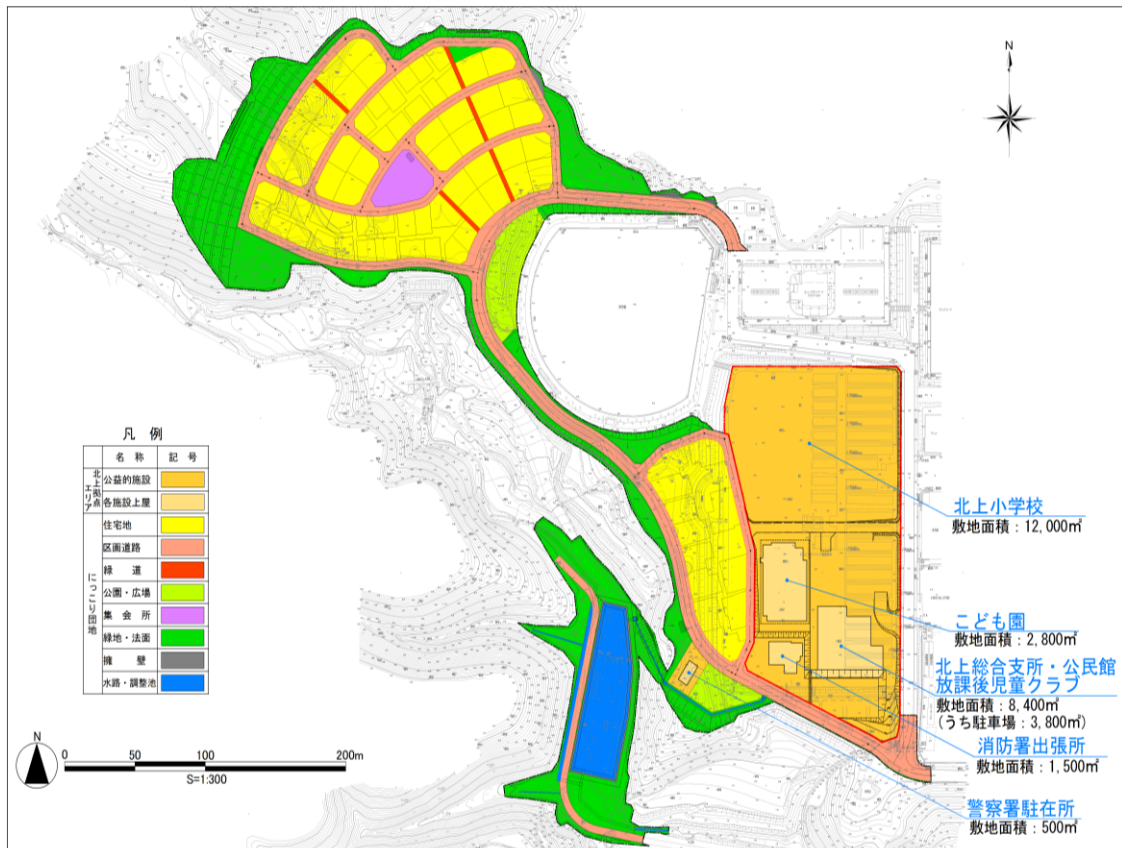

■完成写真【北上総合支所・公民館 等】



■完成写真【北上小学校】

