■下釜第一地区　工事進捗状況

平成２９年１１月末現在

［道路供用状況］

［１号公園完了］

［２号公園完了］

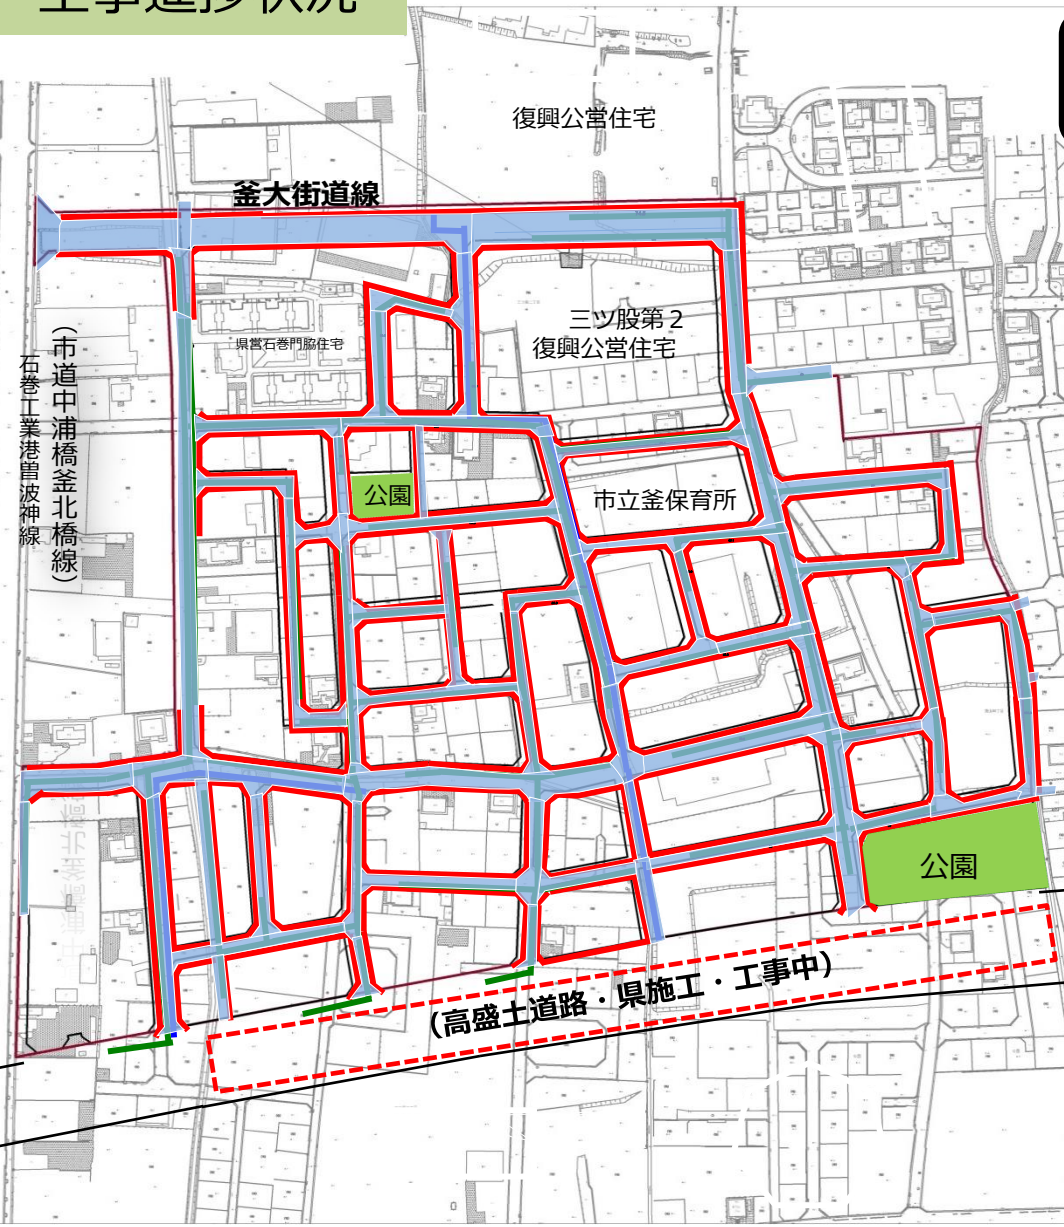

道路舗装延長
全体延長 3,810m
整備済　3,810m

道路築造
側溝設置工
済
全体延長　7,870m
施工済延長　7,870m

雨水函築造
函渠設置工
済
全体延長　567m
施工済延長　567m

汚水管築造開削工
済
全体延長　3,680m
施工済延長　3,680m

上水道整備
全体延長 3,590m
整備済　3,590m

街区公園整備
整備箇所
