道路事業等

○復興事業

基本計画スケジュール

事　業　名	実施時期								
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
道路事業(高盛土とネットワーク)									

現在のスケジュール（R5.3.31時点）

項　目				進捗率	備　考
道路事業	県管理	都市計画道路	門脇流留線 延長=約7,900m 代表幅員=38m	100%	令和4年度完了
			大街道石巻港線 延長=約866m 代表幅員=12m	100%	令和元年度完了
			内海橋 西中瀬橋 橋長=200m 代表幅員=14.5m	100%	令和4年度完了
			河南川尻線 延長=約1,500m 代表幅員=17.5m	100%	令和3年度完了
			不動沢稲井線 延長=約820m 代表幅員=12m	100%	令和3年度完了
	市管理	都市計画道路	釜大街道線 延長=約3,580m 代表幅員=16m 社総交区間 (元明神～中屋敷一区間及び大街道南二～大街道東二区間)(L=1,770m))	100%	令和4年度完了
			釜大街道線 延長=約3,580m 代表幅員=16m 復興交付金 (中屋敷一～大街道南二区間)(L=1,810m)	100%	令和2年度完了
			石巻工業港運河線 延長=約1,364m 代表幅員=16m 社総交区間 (下図点線部) (L=679m))	100%	令和4年度完了
			石巻工業港運河線 延長=約1,364m 代表幅員=16m 復興交付金 (下図実線部) (L=685m)	100%	令和2年度完了
			石巻かわみなと大橋 延長=約754m 代表幅員=11.5m	100%	令和4年度完了
			御所入湊線 延長=約186m 代表幅員=17m	100%	令和2年度完了
			渡波稲井線 延長=約3,500m 代表幅員=15m	100%	令和3年度完了
			南光湊線 延長=約1,890m 代表幅員=37.5m	100%	令和2年度完了
			門脇稲井線 延長=約60m 代表幅員=12m	100%	新門脇地区内 平成28年度完了
			門脇稲井線 延長=約260m 幅員=12～17m	100%	中央一丁目地区内 平成28年度完了
			湊中央線 延長=約1,330m 代表幅員=45m	100%	令和2年度完了
			七窪蛇田線 延長=約570m 代表幅員=15m	73.8%	完成目標年次：令和5年度
	一般市道		東中瀬橋 延長=約115m 代表幅員=4m	34.3%	完成目標年次：令和6年度
			屋敷浜猪落線 延長=1,090m 代表幅員=7m	100%	令和2年度完了
			流留真野沢田線 延長=764m 代表幅員=10m	100%	令和2年度完了

事業位置図

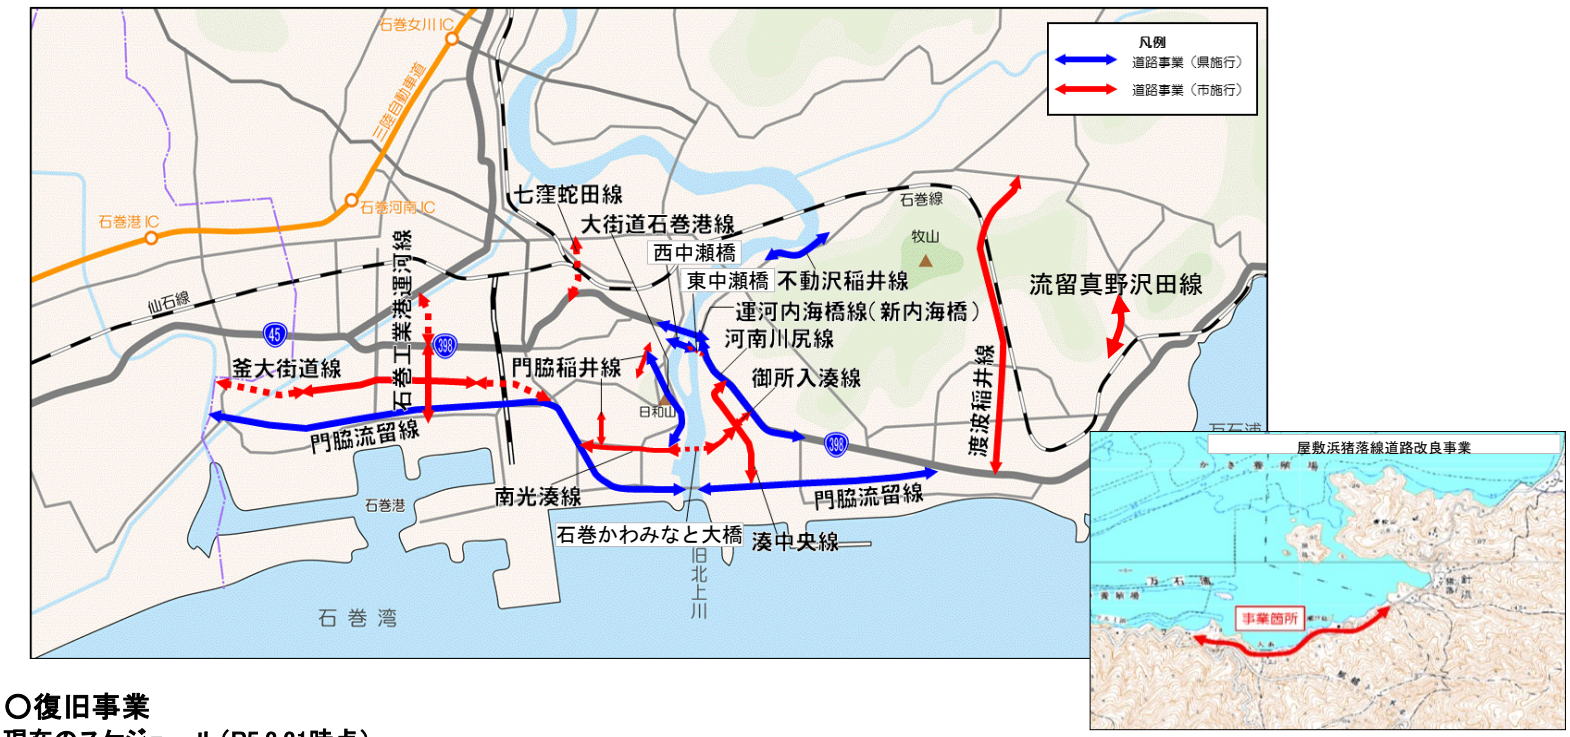

○復旧事業

現在のスケジュール（R5.3.31時点）

項　目			進捗率	備　考
復旧事業	市管理	橋梁災害復旧事業 【令和5年3月31日現在】 進捗率（延長）契約済 100.0% 完了済 99.6%	99.6%	完成目標年次：令和5年度
		道路災害復旧事業 【令和5年3月31日現在】 進捗率（延長）契約済 100.0% 完了済 100.0%	100.0%	令和3年度完了
