石巻市
橋梁長寿命化修繕計画
横断歩道橋長寿命化修繕計画

令和6年3月

宮城県石巻市

目　　次

1. 長寿命化修繕計画の目的　P. 1

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁　P. 1

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針　P. 2

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針　P. 3

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期　P. 3

6. 長寿命化修繕計画による効果　P. 4

7. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者　P. 4

8. 橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表　P. 5～22

9. 新技術の活用について　P. 23

橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画

1. 長寿命化修繕計画の目的

1)背景

石巻市が長寿命化修繕計画を策定する橋梁は令和5年3月現在で877橋あり、建設後50年を経過した高齢化橋梁は現在のところ9%ですが、10年後には約85%に達し、20年後には約93%に達する見込みであり、橋梁の高齢化が急速に進みます。
今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への取り組みが不可欠となります。

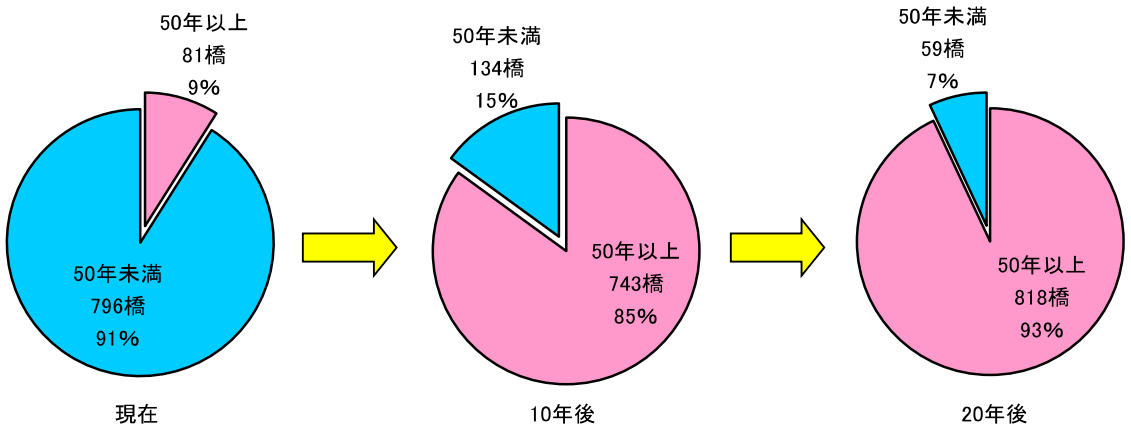

図1. 建設後50年以上の橋梁の推移

2)目的

従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全(大規模補修 高コスト)から、損傷・劣化が小さいうちから対策を実施する予防保全(小規模補修 低コスト)へと移行することでライフサイクルコストの縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	一級市道	二級市道	その他	合計
管理橋梁数	96	67	714	877

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施しています。

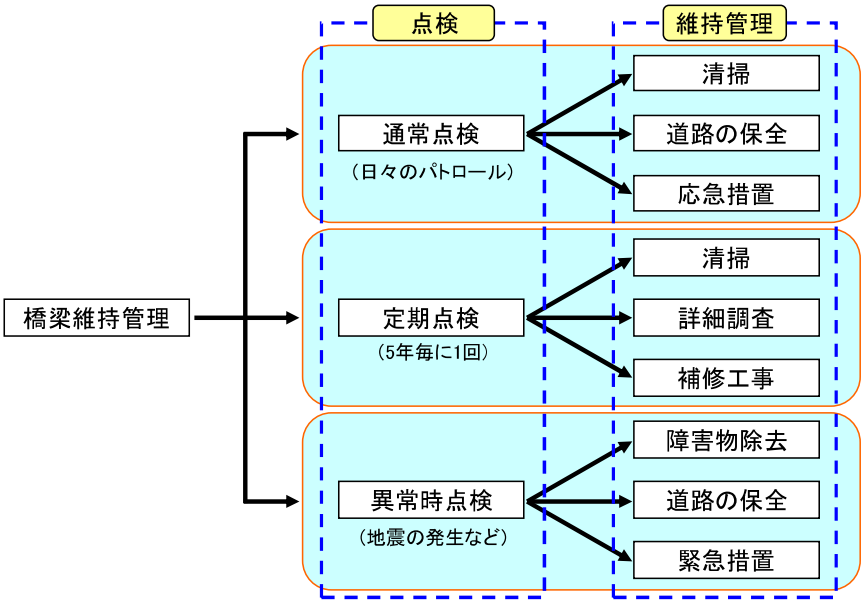

1）健全度の把握の基本的な方針

橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、「橋梁定期点検要領 平成31年3月 国土交通省道路局国道・技術課」に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把握します。

定期点検では、新技術としてタブレットを活用した損傷箇所の調査を実施します。また、令和3年度以降に点検を実施する全ての橋梁において、新技術の活用を検討し、費用縮減や点検の効率化を図ります。

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実施を徹底します。

写真1. 路面

写真2. 排水ます

写真3. 支承本体

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによるライフサイクルコストを比較し、検討を行います。

シナリオ	説明
予防保全型	損傷が顕在化する前の軽微なうちに計画的に行う橋梁の修繕。 小規模工事。工事期間が短く、低コスト。
事後保全型	損傷が顕在化した段階になって行う橋梁の修繕および架け替え。 大規模工事。工事期間が長く、高コスト。

予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクルコストの縮減を目指します。

令和4年度以降に補修検討を実施する全ての橋梁において、様々な新技術活用の検討を実施し、費用縮減や事業の効率化を図ります。

なお、橋梁等の集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減については、社会情勢や施設の利用状況の変化に応じ、地元の意見も踏まえながら、１０橋程度の集約化・撤去を検討し、今後５年程度で年間の維持管理コストを３百万円程度縮減することを目指します。

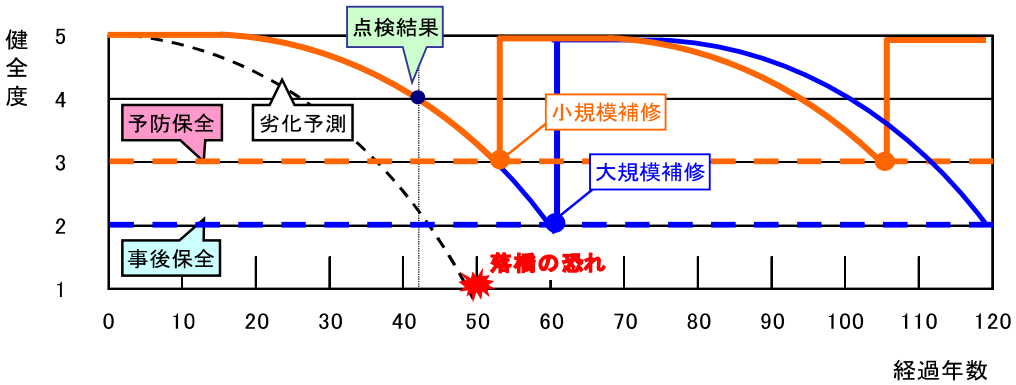

図3. 維持管理シナリオ

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

1）点検

今年度計画を策定した877橋について次回点検時期は2028年度を見込みとし、通常点検および定期点検を継続的に実施します。

2）修繕又は架け替え対策

今年度計画を策定した877橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対策を実施する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工事を実施します。

上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認される損傷に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

6. 長寿命化修繕計画による効果

以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示します。

2124年までに事後保全による補修費用は約421億円かかるのに対し、予防保全による補修費用は約265億円（156億円の縮減）となり、約37%の縮減が見込まれます。

	シナリオ	対象年	補修費用
試算シミュレーション①	予防保全	100年	26,481百万円
試算シミュレーション②	事後保全	100年	42,060百万円

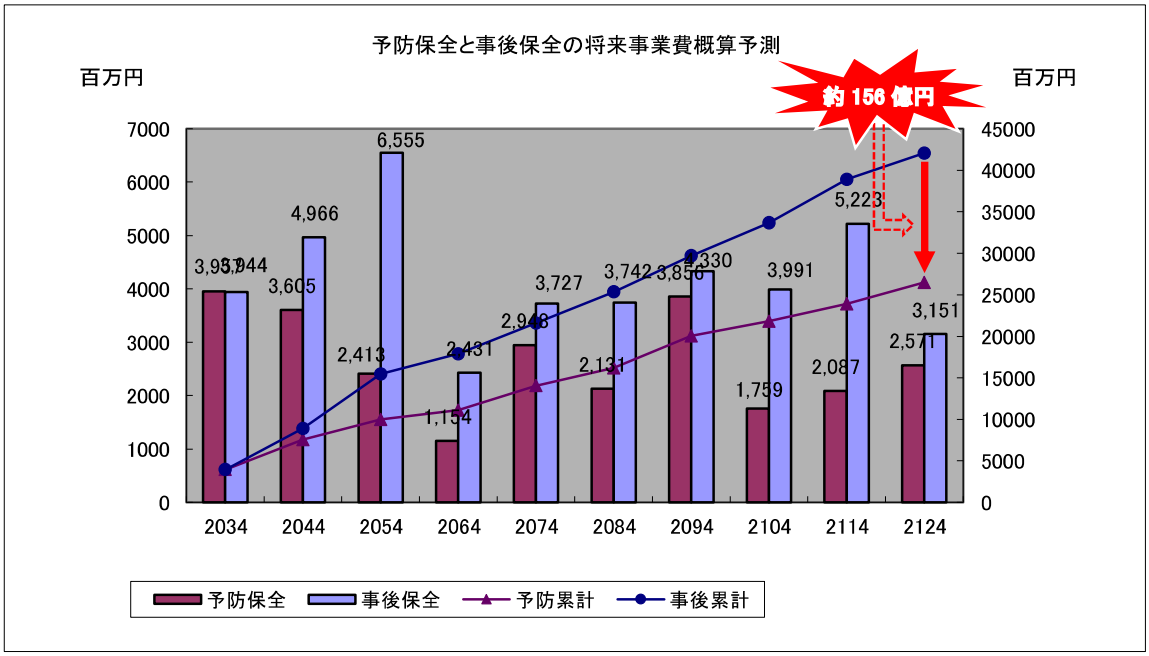

7. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1）計画策定担当部署

宮城県石巻市　建設部道路課　　Tel：0225－95－1111（内5650）

2）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東北大学大学院工学研究科
インフラ・マネジメント研究センター
センター長　久田 真 教授

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
1	菖蒲田1号橋	2.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.6m	不明	指定無し	その他	河川
2	住吉跨線橋	49.9m	3	鋼橋	I桁	10.8m	1967	指定無し	1級	鉄道
3	吉浜橋	43.1m	2	PC橋	その他の桁	6.2m	2023	指定なし	1級	河川(追波沢川)
4	本地橋	54.1m	2	鋼橋	I桁	6.2m	2022	指定なし	2級	河川(皿貝川)
5	曽波神前橋	10.4m	1	PC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
6	宇田川2号橋	4.5m	1	RC橋	T桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川
7	西沢橋	17.6m	1	PC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定なし	その他	河川
8	扇橋	17.4m	1	PC橋	その他の桁	5.1m	2021	指定なし	その他	河川
9	締切橋	58.0m	2	PC橋	T桁	10.0m	1991	指定無し	2級	河川
10	栗ヶ崎橋	2.3m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川
11	寺沢2号橋	2.0m	1	PC橋	その他の桁	2.0m	不明	指定無し	その他	河川
12	小長渡第1号橋	8.2m	1	PC橋	その他の桁	2.3m	不明	指定無し	その他	崖
13	中ノ川2号橋	2.2m	1	PC橋	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川
14	戸泥橋	3.9m	1	PC橋	T桁	5.3m	不明	指定無し	その他	河川
15	湊川5号橋	8.5m	1	PC橋	その他の桁	12.6m	1971	二次	1級	河川
16	湊川6号橋	7.0m	1	PC橋	その他の桁	4.7m	1992	指定無し	その他	河川
17	大田橋	10.5m	1	PC橋	T桁	6.7m	1960	指定無し	その他	河川
18	狩又橋	3.9m	1	RC橋	その他の桁	3.2m	不明	指定無し	その他	河川
19	湊川橋	33.8m	1	PC橋	T桁	10.0m	2021	二次	1級	河川
20	下谷地裏1号橋	2.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.3m	不明	指定無し	その他	河川
21	日影前3号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
22	甚内2号橋	3.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.0m	不明	指定無し	その他	河川
23	北後橋	12.4m	1	鋼橋	I桁	3.7m	1969	指定無し	その他	河川
24	四ツ筒橋	29.1m	1	鋼橋	I桁	8.2m	1998	指定無し	その他	河川
25	昭和橋	6.5m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	1969	指定無し	その他	河川
26	寺山1号橋	2.8m	1	PC橋	その他の桁	5.2m	不明	指定無し	2級	河川
27	寺山4号橋	6.9m	1	PC橋	その他の桁	4.1m	1968	指定無し	その他	河川
28	寺山3号橋	5.0m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	1988	指定無し	その他	河川
29	寺山2号橋	2.3m	1	RC橋	その他の桁	5.8m	不明	指定無し	2級	河川
30	中ノ川1号橋	2.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.4m	不明	指定なし	その他	河川
31	楯橋	22.0m	1	鋼橋	H形鋼	3.4m	1965	指定無し	その他	河川
32	第2茄子川前橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	その他	河川
33	新大日橋	28.0m	1	PC橋	T桁	7.2m	1989	指定無し	その他	河川
34	金沢前橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	その他	河川
35	大立橋	4.3m	1	PC橋	その他の桁	9.8m	不明	指定無し	1級	河川
36	大沢1号橋	5.1m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
37	大沢橋	4.9m	1	RC橋	その他の桁	3.4m	不明	指定無し	その他	河川
38	養留2号橋	3.3m	1	PC橋	その他の桁	3.2m	不明	指定無し	その他	河川
39	養留3号橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	5.5m	不明	指定無し	その他	河川
40	二渡橋	8.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.2m	不明	指定なし	その他	河川
41	第1新船島橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.0m	不明	指定無し	その他	河川
42	第1襟巻橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.5m	不明	指定無し	その他	河川
43	第2襟巻橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川
44	第3沖東橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
45	第1沖東橋	2.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.5m	不明	指定無し	その他	河川
46	第2櫓前橋	6.4m	1	PC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
47	畳石前橋	2.4m	1	PC橋	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
48	二ツ橋	25.3m	3	鋼橋	I桁	4.0m	1968	指定無し	その他	河川
49	大東2号橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1990	指定無し	その他	河川
50	第2中田橋	2.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定なし	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
51	一番江橋	6.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定なし	2級	河川
52	大岩橋	47.5m	2	PC橋	T桁	9.3m	1986	三次	1級	河川
53	大東1号橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1990	指定無し	その他	河川
54	新堀3号橋	6.0m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
55	新堀2号橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
56	追分1号橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
57	追分2号橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
58	三番江1号橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
59	三番江2号橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
60	埣下1号橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
61	城安2号橋	6.0m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
62	五反田1号橋	4.4m	1	RC橋	その他の桁	8.2m	1988	指定無し	その他	河川
63	五反田2号橋	4.4m	1	RC橋	その他の桁	8.3m	1994	指定無し	その他	河川
64	埣下2号橋	3.1m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	1962	指定無し	その他	河川
65	金田1号橋	7.4m	1	PC橋	I桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
66	金田3号橋	6.4m	1	PC橋	I桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
67	金田4号橋	6.4m	1	PC橋	I桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
68	釜谷崎橋	67.9m	3	鋼橋	I桁	6.2m	1976	三次	1級	河川
69	今井橋	5.8m	1	RC橋	その他の桁	7.0m	1972	指定無し	2級	河川
70	小待井3号橋	5.3m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
71	豊祖田3号橋	5.2m	1	RC橋	その他の桁	5.0m	1979	指定無し	その他	河川
72	万之助橋	5.1m	1	RC橋	その他の桁	4.3m	1951	指定無し	その他	河川
73	内海橋	4.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1980	指定無し	その他	河川
74	町浦2号橋	4.8m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	1980	指定無し	その他	河川
75	小待井2号橋	2.9m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	1988	指定無し	その他	河川
76	江下4号橋	2.8m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	1992	指定無し	その他	河川
77	合体橋	9.4m	1	PC橋	その他の桁	10.0m	1983	指定無し	その他	河川
78	合体橋歩道橋	11.4m	1	PC橋	その他の桁	3.2m	1991	指定無し	1級	河川
79	的場4号橋	4.3m	1	PC橋	その他の桁	10.0m	1987	指定無し	その他	河川
80	的場5号橋	4.2m	1	PC橋	その他の桁	3.5m	1987	指定無し	その他	河川
81	丸山橋	19.0m	1	PC橋	その他の桁	11.0m	2022	指定なし	その他	河川
82	真野大橋	47.0m	1	鋼橋	その他の桁	10.3m	2021	指定なし	その他	河川
83	新明治橋	73.7m	3	鋼橋	I桁	9.8m	2021	指定なし	1級	河川
84	六工区南橋	11.2m	2	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	その他	河川
85	石取場9号橋	5.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定無し	その他	河川
86	石取場10号橋	4.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定無し	その他	河川（10号水路）
87	小崎9号橋	5.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定無し	その他	河川
88	保育所裏橋	3.2m	1	その他	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
89	機場前橋	4.5m	1	RC橋	その他の桁	2.5m	不明	指定無し	その他	河川
90	第2機場前橋	4.5m	1	RC橋	その他の桁	2.5m	不明	指定無し	その他	河川
91	第3機場前橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川
92	五工区南橋	5.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定無し	その他	河川
93	13間筒橋	14.1m	1	鋼橋	H形鋼	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
94	沖新田橋	14.2m	1	鋼橋	H形鋼	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
95	押越橋	4.1m	1	RC橋	その他の桁	5.7m	不明	指定無し	その他	河川
96	泉沢3号橋	4.4m	1	RC橋	その他の桁	4.8m	不明	指定無し	その他	河川
97	女川11号1号橋	5.4m	1	RC橋	その他の桁	5.2m	不明	指定無し	その他	河川
98	女川19号1号橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
99	泉沢2号橋	5.4m	1	PC橋	その他の桁	4.7m	不明	指定無し	その他	河川
100	築山1号橋	4.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
101	第1鰒取橋	4.8m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	1952	指定無し	その他	河川
102	第2鰒取橋	2.8m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	1971	指定無し	その他	河川
103	第3鰒取橋	4.2m	1	RC橋	その他の桁	3.4m	1952	指定無し	その他	河川
104	川原田前橋	3.3m	1	RC橋	その他の桁	8.2m	不明	指定無し	その他	河川
105	第2機関場橋	7.9m	1	PC橋	I桁	4.6m	1984	指定無し	2級	河川
106	機関場橋	7.8m	1	PC橋	I桁	4.1m	1984	指定無し	2級	河川
107	愛宕下橋	8.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	2級	河川
108	柿木橋	8.5m	1	PC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
109	小室橋	4.2m	1	PC橋	その他の桁	12.6m	不明	指定無し	その他	河川
110	相川2号橋	20.9m	1	鋼橋	I桁	6.2m	1978	指定無し	その他	河川
111	相川3号橋	14.5m	1	鋼橋	I桁	4.8m	1978	指定無し	2級	河川
112	第1吉浜橋	4.1m	1	RC橋	その他の桁	6.7m	1973	三次	1級	河川
113	無名橋	2.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	33.0m	不明	指定無し	その他	河川
114	東の木橋	2.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
115	鎧橋	5.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.3m	1964	指定無し	その他	河川
116	平路木橋	5.1m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
117	東沢橋	3.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川
118	長塩谷一号橋	5.3m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
119	立神橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	その他	河川
120	第4吉浜橋	9.0m	1	PC橋	その他の桁	5.2m	1992	指定無し	その他	河川
121	追波入橋	8.0m	1	PC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
122	蛇田新橋	36.2m	1	鋼橋	その他の桁	11.5m	2022	指定なし	その他	河川
123	竹の沢橋	38.0m	2	鋼橋	I桁	4.8m	2018	指定なし	その他	河川
124	第2横前橋	2.1m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
125	第2御蔵田橋	12.3m	1	鋼橋	I桁	4.3m	不明	指定無し	その他	河川
126	相川4号橋	11.1m	1	鋼橋	I桁	4.8m	1993	指定無し	2級	河川
127	山崎前橋	2.4m	1	PC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
128	第1小島浦橋	2.5m	1	その他	その他の桁	1.8m	不明	指定無し	その他	河川
129	第2小島浦橋	2.2m	1	RC橋	その他の桁	2.7m	不明	指定無し	その他	河川
130	石坂橋	24.7m	3	RC橋	その他の桁	3.4m	1964	指定無し	その他	河川
131	川南橋	5.0m	1	RC橋	その他の桁	2.4m	不明	指定無し	その他	河川（袋堰排水路）
132	須藤屋敷橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
133	長山橋	6.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	20.9m	不明	指定無し	その他	河川
134	新水戸橋	2.2m	1	RC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
135	第2久米田前橋	5.1m	1	RC橋	その他の桁	2.2m	不明	指定無し	その他	河川
136	第3久米田前橋	5.6m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
137	相川5号橋	8.5m	1	PC橋	I桁	4.1m	不明	指定無し	2級	河川
138	第1大指橋	3.9m	1	RC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
139	相川6号橋	10.9m	1	PC橋	I桁	4.1m	不明	指定無し	2級	河川
140	第2朝日前橋	4.9m	1	PC橋	その他の桁	5.3m	不明	指定無し	その他	河川
141	第3朝日前橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川
142	第4朝日前橋	5.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
143	猿田前橋	5.5m	1	RC橋	その他の桁	2.8m	不明	指定無し	その他	河川
144	曽呂美沢橋	9.8m	1	RC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定無し	2級	河川
145	枕小屋橋	14.3m	1	PC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定無し	2級	河川
146	本地1号橋	3.9m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川
147	袖山1号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
148	武田橋	8.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	2級	河川
149	横前橋	8.6m	1	RC橋	その他の桁	5.9m	1978	指定無し	その他	河川
150	寺前橋	8.6m	1	PC橋	その他の桁	5.9m	不明	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
151	月迫沖橋	8.9m	1	PC橋	その他の桁	6.4m	不明	指定無し	その他	河川
152	大沢堤下橋	2.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
153	第2黒沢前橋	2.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.5m	不明	指定無し	その他	河川
154	子友橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
155	筒頭橋	2.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
156	河原南橋	4.3m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
157	三十刈下橋	3.9m	1	RC橋	その他の桁	2.1m	不明	指定無し	その他	河川
158	新沼4号橋	6.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	その他	河川
159	新沼3号橋	6.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	その他	河川
160	根岸前2号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.2m	不明	指定無し	その他	河川
161	舟場下3号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	1962	指定無し	その他	河川
162	新雷神4号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
163	新雷神5号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
164	新雷神6号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
165	橋元橋	3.1m	1	PC橋	その他の桁	5.8m	1967	指定無し	その他	河川
166	内田6号橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.5m	1980	指定無し	その他	河川
167	内畑2号橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.5m	1981	指定無し	その他	河川
168	内畑3号橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.5m	1981	指定無し	その他	河川
169	第1的場橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定無し	その他	河川
170	第1山崎三郡橋	8.8m	1	RC橋	その他の桁	15.0m	不明	指定無し	その他	河川
171	第2山崎三郡橋	4.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川
172	第3山崎三郡橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川
173	第2的場橋	6.3m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
174	下谷地西橋	8.3m	1	PC橋	その他の桁	5.9m	不明	指定無し	その他	河川
175	第2新兀山下橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川
176	墾田橋	2.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
177	舟場下4号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	3.2m	1962	指定無し	その他	河川
178	新雷神1号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	3.2m	1962	指定無し	その他	河川
179	新雷神3号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	3.6m	1962	指定無し	その他	河川
180	新鹿島1号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
181	丸土山橋	3.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
182	鶴首橋	3.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
183	内待井橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.0m	1990	指定無し	その他	河川
184	山根橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
185	下谷地1号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
186	下谷地2号橋	2.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	1993	指定無し	その他	河川
187	閑前橋	3.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	22.5m	1990	指定無し	その他	河川
188	山下3号橋	4.2m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	1980	指定無し	その他	河川（大江堀用水路）
189	荒田1号橋	2.5m	1	RC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
190	内畑1号橋	5.0m	1	PC橋	その他の桁	3.8m	1980	指定無し	その他	河川
191	山田沢橋	2.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	11.2m	不明	三次	1級	河川
192	舘歩道橋	16.0m	1	鋼橋	その他の桁	1.8m	不明	指定無し	その他	河川
193	女川鋼橋	9.1m	1	鋼橋	H形鋼	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
194	白鳥1号橋	3.5m	1	RC橋	その他の桁	9.0m	1988	指定無し	その他	河川
195	町裏2号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	5.3m	1988	指定無し	その他	河川
196	町裏3号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.8m	1988	指定無し	その他	河川
197	外八木9号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
198	中谷地橋	13.1m	1	鋼橋	I桁	4.0m	1964	指定無し	その他	河川
199	福田橋	6.5m	2	RC橋	その他の桁	4.0m	1968	指定無し	その他	河川
200	舟場上1号橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
201	舟場上2号橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
202	舟場上3号橋	4.6m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	2003	指定無し	その他	河川
203	舟場下1号橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	3.2m	1962	指定無し	その他	河川
204	舟場下2号橋	4.0m	1	PC橋	その他の桁	3.2m	1962	指定無し	その他	河川
205	明神3号橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
206	明神4号橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
207	明神5号橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
208	内山崎橋	4.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.5m	1969	指定無し	その他	河川
209	外八木10号橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
210	沼田橋	5.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	1967	指定無し	その他	河川
211	新堀1号橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.1m	1984	指定無し	その他	河川
212	機関場橋	3.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.3m	1976	指定無し	その他	河川
213	千刈1号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	2005	指定無し	その他	河川
214	千刈2号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	2005	指定無し	その他	河川
215	土手下1号橋	3.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	その他	河川
216	土手下2号橋	3.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	その他	河川
217	薬田橋	5.5m	1	RC橋	その他の桁	5.5m	1977	指定無し	1級	河川（大網用水路）
218	観音橋	11.4m	1	PC橋	I桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
219	八景橋	10.5m	1	PC橋	I桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
220	小塚1号橋	9.4m	1	PC橋	I桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
221	小塚2号橋	9.4m	1	PC橋	I桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
222	小塚3号橋	9.4m	1	PC橋	I桁	6.0m	1989	指定無し	その他	河川
223	新下谷地橋	14.2m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
224	江下2号橋	3.8m	1	PC橋	その他の桁	5.5m	1978	指定無し	2級	河川
225	北後1号橋	5.0m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	2005	指定無し	その他	河川
226	観音橋	4.1m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	2005	指定無し	その他	河川
227	東舘2号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.8m	1978	指定無し	その他	河川
228	角前橋	6.9m	1	PC橋	その他の桁	3.2m	1967	指定無し	その他	河川
229	喰迫入橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	2.5m	不明	指定無し	その他	河川
230	本地8号1号橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
231	雷神橋	8.0m	1	PC橋	I桁	4.7m	1972	指定無し	その他	河川
232	中浦橋	53.0m	2	鋼橋	I桁	20.8m	1983	指定なし	1級	河川
233	石巻大橋	306.5m	7	鋼橋	箱桁	12.3m	1967	指定無し	1級	河川（旧北上川）
234	新千刈函渠	9.7m	1	RC橋	その他の桁	14.5m	不明	指定無し	1級	市道
235	第2横断橋	28.0m	2	PC橋	その他の桁	3.2m	2014	指定無し	その他	河川
236	山根橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	4.8m	不明	指定無し	その他	河川（開墾場1号水路）
237	竹之迫橋	45.6m	1	鋼橋	I桁	6.2m	2019	指定なし	その他	河川
238	小泉橋	29.1m	1	PC橋	その他の桁	6.7m	2018	指定なし	2級	河川
239	大島橋	30.6m	1	PC橋	その他の桁	5.2m	2018	指定なし	その他	河川
240	笊川橋	15.5m	1	鋼橋	I桁	5.5m	1971	指定無し	その他	河川（大和田川）
241	大日橋	17.6m	1	鋼橋	H形鋼	3.0m	1964	指定無し	その他	河川（青木川）
242	太田1号こ道橋	39.3m	3	PC橋	その他の桁	4.0m	2005	指定なし	その他	緊急道路
243	第3的場橋	5.3m	1	PC橋	その他の桁	9.9m	不明	指定無し	1級	河川（照江排水路）
244	新山崎前橋	2.2m	1	RC橋	その他の桁	6.9m	不明	指定無し	2級	河川
245	君ヶ沢橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.9m	不明	指定無し	その他	河川
246	第2新堀橋	5.8m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
247	西柳原橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定無し	その他	河川
248	黒沢前橋	5.3m	1	PC橋	その他の桁	5.1m	不明	指定無し	その他	河川（二間堀排水路）
249	櫓前橋	6.2m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川（三郷幹線用水路）
250	北割牡丹窪橋	3.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川（1号排水路）

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
251	堀北中橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.5m	不明	指定無し	その他	河川
252	第1堀北中橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.5m	不明	指定無し	その他	河川
253	水道前橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川(三郷幹線用水路)
254	寺沢山前橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川(三郷幹線用水路)
255	三間橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.2m	不明	指定無し	その他	河川
256	沖西橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川(三郷幹線用水路)
257	新堀橋	6.8m	1	PC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定無し	その他	河川(二郷幹線用水路)
258	前山下1号橋	2.8m	1	RC橋	その他の桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川
259	持揚橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
260	大見橋	3.4m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川
261	甚内橋	7.6m	1	PC橋	I桁	2.1m	不明	指定無し	その他	河川
262	上待井1号橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	3.2m	不明	指定無し	その他	河川
263	飯野川町橋	3.3m	1	RC橋	その他の桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川
264	万太郎橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川
265	五の坪橋	10.7m	2	RC橋	その他の桁	7.5m	1981	指定無し	その他	河川
266	井内機場2号橋	16.0m	3	鋼橋	I桁	3.4m	不明	指定無し	1級	河川(井内排水機場排水路)
267	金沢橋	19.2m	1	PC橋	T桁	9.5m	1988	指定無し	その他	河川(金沢川)
268	刈田橋	11.2m	1	PC橋	その他の桁	5.7m	2016	指定無し	1級	河川
269	昭和橋	3.5m	1	RC橋	その他の桁	5.4m	不明	指定無し	2級	河川
270	天神山橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	5.4m	不明	指定無し	その他	河川(釜谷川)
271	雁北橋	24.7m	3	PC橋	その他の桁	4.2m	1963	指定無し	2級	河川
272	〆切橋	13.3m	2	PC橋	T桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
273	明神新橋	37.2m	2	PC橋	その他の桁	8.1m	1979	指定無し	その他	河川
274	辻堂橋	39.6m	10	鋼橋	H形鋼	7.1m	不明	指定無し	その他	河川(追波川)
275	二間堀橋	7.3m	1	RC橋	その他の桁	9.2m	不明	指定無し	1級	河川(二間堀排水路)
276	新二間堀橋	8.2m	1	RC橋	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	1級	河川(二間堀排水路)
277	笈入橋	14.2m	1	鋼橋	H形鋼	7.0m	不明	指定無し	1級	河川(二間堀排水路)
278	南一番橋	19.3m	1	鋼橋	H形鋼	6.5m	1979	指定無し	その他	河川(二間堀排水路)
279	下谷地橋	9.4m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
280	大掛越江橋	17.0m	1	鋼橋	H形鋼	7.0m	2002	指定無し	その他	河川(二間堀排水路)
281	南四番橋	17.2m	1	鋼橋	H形鋼	7.1m	1998	指定無し	その他	河川(二間堀排水路)
282	寺裏橋	14.8m	1	鋼橋	H形鋼	4.0m	1977	指定無し	その他	河川(二間堀排水路)
283	小金袋橋	14.5m	1	鋼橋	H形鋼	4.0m	1977	指定無し	その他	河川(二間堀排水路)
284	北上運河大橋	42.0m	2	PC橋	T桁	10.0m	1991	指定無し	2級	河川(北北上運河)
285	中江橋	5.5m	1	RC橋	その他の桁	13.5m	不明	指定無し	その他	河川
286	第1畳石橋	3.4m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川(蛇田連合江)
287	荒2-1号橋	6.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.4m	不明	指定なし	その他	河川
288	船隠1号橋	3.7m	1	RC橋	その他の桁	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
289	荒浜沢1号橋	3.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.6m	1998	指定無し	2級	河川(荒浜沢)
290	ときめき橋	17.8m	1	PC橋	その他の桁	12.7m	1997	指定無し	その他	河川(栗の沢)
291	根岸橋	5.3m	1	RC橋	T桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川
292	折立橋	3.4m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
293	折立2号橋	2.5m	1	RC橋	その他の桁	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
294	五性橋	6.5m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
295	立浜1号橋	4.4m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	2級	河川
296	舘森3-1号橋	8.0m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
297	桑浜1-1号橋	2.5m	1	RC橋	その他の桁	2.0m	不明	指定無し	その他	河川(桑浜沢)
298	桑浜1-2号橋	3.3m	1	RC橋	その他の桁	2.0m	不明	指定無し	その他	河川(桑浜沢)
299	桑浜1-3号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	2.1m	不明	指定無し	その他	河川(桑浜沢)
300	下雄勝3-1号橋	3.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.8m	不明	指定無し	その他	河川(大久保沢)

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
301	大浜2-1号橋	3.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.4m	不明	指定無し	その他	河川
302	小島橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	7.4m	1966	指定無し	その他	河川
303	新沼1号橋	0.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	0.0m	不明	指定なし	その他	河川
304	山中1号橋	2.9m	1	RC橋	その他の桁	5.5m	不明	指定無し	その他	河川
305	下雄勝1号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	1級	河川(下雄勝沢)
306	味噌作1号橋	11.6m	1	PC橋	I桁	4.5m	不明	指定無し	2級	河川(坊ヶ沢川)
307	雄勝釜谷1号橋	4.2m	1	RC橋	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川
308	折下橋	9.5m	1	鋼橋	I桁	6.1m	1979	指定無し	その他	河川(大原川)
309	折下1-1号橋	7.1m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川(大原川支蛇沢)
310	船戸2-1号橋	2.1m	1	PC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
311	第1北和渕二番橋	3.3m	1	RC橋	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	2級	河川
312	石崎橋	49.8m	1	鋼橋	箱桁	8.2m	2019	指定なし	その他	河川
313	中埣橋	5.0m	1	PC橋	その他の桁	41.5m	不明	指定なし	その他	河川(二間堀排水路)
314	嘉明橋	14.5m	1	RC橋	T桁	5.9m	不明	指定無し	その他	河川
315	新舘下橋	16.4m	1	PC橋	その他の桁	7.2m	2002	指定無し	その他	河川
316	水貫1号橋	16.7m	1	PC橋	その他の桁	7.2m	2001	三次	その他	河川
317	第1新山崎前橋	3.8m	1	RC橋	その他の桁	10.8m	不明	指定無し	1級	河川
318	摺沢橋	2.0m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
319	保育所前橋	5.3m	1	RC橋	その他の桁	6.4m	不明	指定無し	その他	河川
320	上宿橋	4.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.7m	2017	指定無し	その他	河川
321	船場橋	28.9m	1	PC橋	箱桁	5.0m	1997	指定無し	その他	河川(日向川)
322	舘下橋	5.4m	1	RC橋	その他の桁	5.2m	不明	指定無し	その他	河川
323	山中橋	5.4m	1	RC橋	その他の桁	4.3m	不明	指定無し	その他	河川
324	高伊橋	6.2m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
325	水沼橋	5.6m	1	RC橋	その他の桁	5.6m	1984	指定無し	その他	河川
326	大梨沢橋	5.4m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
327	大縄場2号橋	3.8m	1	RC橋	その他の桁	7.8m	不明	指定無し	その他	河川
328	大縄場4号橋	4.3m	1	RC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定無し	1級	河川(三番江排水路)
329	舟入橋	7.0m	1	鋼橋	I桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
330	第1町南橋	4.4m	1	RC橋	その他の桁	2.8m	不明	指定無し	その他	河川
331	中道大道橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川
332	内吉野橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.0m	不明	指定無し	その他	河川
333	内吉野1号橋	3.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.4m	不明	指定無し	その他	河川
334	岩崎2号橋	3.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
335	岩崎1号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
336	本屋敷1号橋	3.7m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
337	下川前橋	5.5m	1	RC橋	T桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
338	第1山下西橋	5.0m	2	ボックスカルバート	その他の桁	9.6m	不明	指定無し	2級	河川(曽波神補助用水路)
339	第2道的前橋	2.1m	1	RC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川(道的排水路)
340	山下西橋	7.4m	1	PC橋	その他の桁	7.2m	不明	指定無し	その他	河川(曽波神排水路)
341	一反橋	28.0m	4	PC橋	その他の桁	2.7m	1965	指定無し	その他	河川
342	境堀排水橋	4.2m	1	RC橋	その他の桁	6.6m	不明	指定無し	その他	河川
343	山下東橋	6.5m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川(排水路)
344	大和田2号橋	18.5m	1	鋼橋	I桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川(大和田川)
345	第1学校前橋	3.5m	1	RC橋	その他の桁	8.9m	不明	指定無し	2級	河川(鹿又用水路)
346	矢袋前橋	2.0m	1	RC橋	その他の桁	4.7m	不明	指定無し	その他	河川(道的前用水路)
347	横前橋	5.4m	1	RC橋	その他の桁	13.5m	不明	指定無し	その他	河川(横前用水路)
348	第10嘉右エ門橋	6.3m	1	PC橋	その他の桁	6.8m	不明	指定無し	その他	河川(嘉右エ門堀)
349	第9嘉右エ門橋	8.1m	1	PC橋	その他の桁	12.6m	不明	指定無し	その他	河川(嘉右エ門堀)
350	第8嘉右エ門橋	6.3m	1	PC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
351	第2蓬莱橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	12.0m	不明	指定無し	その他	河川
352	町上裏橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
353	第5中道橋	2.3m	2	ボックスカルバート	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
354	第4中道橋	2.3m	2	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
355	物見沢第3橋	17.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.8m	不明	指定無し	その他	河川
356	新高田橋	5.6m	1	RC橋	その他の桁	7.2m	不明	指定無し	2級	河川（嘉右エ門堀）
357	大谷地橋	3.8m	1	RC橋	その他の桁	19.4m	不明	指定無し	その他	河川（中埣用水路）
358	山崎橋	2.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	22.0m	不明	指定無し	その他	河川（蛭田連合江）
359	内ノ目橋	2.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.0m	不明	指定無し	その他	河川
360	砂山前橋	11.5m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川（赤井堰川）
361	丸山橋	5.6m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川（細田水路）
362	砂四橋	4.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
363	桑柄橋	33.5m	2	PC橋	その他の桁	6.2m	2005	指定無し	その他	河川（青木川）
364	大番所前橋	5.1m	1	RC橋	その他の桁	2.3m	不明	指定無し	その他	河川
365	塩下前橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
366	第2下谷地橋	4.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	11.1m	不明	指定無し	1級	河川（境堀）
367	第1下谷地橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	11.8m	不明	指定無し	1級	河川（久六福掛水路）
368	沢田橋	3.5m	1	RC橋	その他の桁	11.0m	不明	指定無し	その他	河川
369	第4嘉右エ門橋	6.3m	1	PC橋	その他の桁	7.5m	不明	指定無し	2級	河川（嘉右エ門堀）
370	第1東黄金橋	5.3m	1	PC橋	その他の桁	4.6m	不明	指定無し	その他	河川（嘉右エ門堀）
371	桜先橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	5.9m	不明	指定無し	その他	河川（碁子川前水路）
372	佳景橋	5.3m	1	PC橋	その他の桁	5.8m	不明	指定無し	その他	河川
373	第5嘉右エ門橋	6.4m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川（嘉右エ門堀）
374	御蔵田橋	2.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.9m	不明	指定無し	その他	河川
375	水浜2-1号橋	10.4m	1	鋼橋	I桁	4.0m	不明	指定無し	2級	河川
376	味噌作2号橋	4.6m	1	PC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	2級	河川（坊ヶ沢川）
377	水浜4-1号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.6m	不明	指定無し	その他	河川
378	水浜12号線1号橋	7.0m	1	PC橋	その他の桁	7.2m	1999	指定無し	その他	河川
379	水浜大橋	5.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.3m	不明	指定無し	その他	河川
380	辨天橋	4.7m	1	RC橋	その他の桁	4.8m	不明	指定無し	その他	河川（佐須浜川）
381	川尻橋	3.9m	1	RC橋	その他の桁	5.8m	不明	指定無し	その他	河川
382	波板1号橋	9.9m	1	PC橋	I桁	4.5m	不明	指定無し	2級	河川
383	原3号橋	8.6m	1	RC橋	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	その他	河川
384	波板2-1号橋	5.9m	1	RC橋	その他の桁	2.8m	不明	指定無し	その他	河川
385	波板3-1号橋	7.4m	1	PC橋	I桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
386	千鳥川橋	5.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.2m	不明	指定なし	その他	河川
387	新沼函渠	10.3m	1	RC橋	その他の桁	10.3m	不明	指定なし	1級	市道
388	四工区橋	19.7m	1	PC橋	その他の桁	7.7m	2021	指定なし	その他	河川
389	小積橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	5.9m	不明	指定無し	1級	河川（小積川）
390	谷川橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川
391	朝日橋	4.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	11.7m	不明	指定無し	2級	河川
392	第1砂四橋	4.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
393	8号橋	9.4m	1	PC橋	その他の桁	5.5m	不明	指定無し	その他	河川
394	牧浜1号橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.2m	不明	指定なし	その他	河川
395	女形下橋	9.4m	1	PC橋	その他の桁	5.6m	不明	指定無し	その他	河川
396	9号水路橋	5.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	0.0m	不明	指定無し	その他	河川
397	8号水路橋	5.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
398	九工区東橋	3.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	18.4m	不明	指定無し	その他	河川
399	堀向橋	10.0m	2	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川（赤井堰川）
400	北和渕二番橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	6.6m	不明	指定無し	2級	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
401	黒沢橋	3.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.5m	不明	指定無し	その他	河川
402	堤下橋	3.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
403	九工区橋	2.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.0m	不明	指定なし	その他	河川
404	沼下橋	2.8m	1	RC橋	その他の桁	12.5m	不明	指定無し	1級	河川
405	三十刈下1号橋	5.5m	1	PC橋	その他の桁	6.4m	不明	指定無し	1級	河川
406	前谷地旭山線2号橋	4.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	11.1m	不明	指定無し	1級	河川
407	第1蓬莱橋	5.4m	1	PC橋	その他の桁	5.0m	不明	指定なし	その他	河川(曽波神排水路)
408	第1筒頭橋	2.0m	1	RC橋	その他の桁	6.6m	不明	指定無し	その他	河川
409	根方山橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	その他	河川
410	新横沼橋	6.3m	1	PC橋	その他の桁	5.7m	不明	指定無し	その他	河川(二間堀排水路)
411	黒沢天狗橋	3.7m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
412	人形森橋	6.4m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
413	１１号水路橋	11.0m	1	RC橋	T桁	3.2m	不明	指定無し	その他	河川(１１号水路)
414	曽波神機場前橋	8.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川(曽波神機動用水路)
415	沼津１号橋	6.3m	1	PC橋	その他の桁	6.7m	不明	指定無し	その他	河川
416	分浜１号橋	2.2m	1	RC橋	その他の桁	2.5m	1969	指定無し	2級	河川(分浜沢)
417	水浜1-1号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.1m	不明	指定なし	2級	河川
418	引浪前橋	2.7m	1	RC橋	その他の桁	2.1m	不明	指定無し	その他	河川
419	小塚裏畑橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	1.0m	不明	指定なし	2級	河川
420	上谷地橋	5.4m	1	PC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川(嘉右エ門堀)
421	成田境前橋	24.7m	1	鋼橋	その他の桁	6.2m	不明	指定なし	その他	河川(旧古川)
422	新渡波西2号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	18.2m	不明	指定無し	2級	河川
423	本地２号橋	2.5m	1	RC橋	その他の桁	10.1m	不明	指定無し	その他	河川
424	本地3号橋	10.5m	1	PC橋	I桁	5.2m	不明	指定無し	その他	河川
425	第２松崎橋	5.1m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
426	馬鞍橋	42.0m	3	鋼橋	その他の桁	4.4m	1964	指定無し	1級	河川
427	針岡橋	59.9m	1	鋼橋	箱桁	6.2m	2016	指定無し	2級	河川
428	舘下橋	30.7m	1	鋼橋	I桁	5.7m	2019	指定なし	1級	河川(挟川)
429	加茂川橋	27.7m	1	PC橋	その他の桁	6.2m	2020	指定なし	1級	河川
430	倉の迫川橋	21.6m	1	鋼橋	その他の桁	3.8m	1976	指定無し	その他	河川
431	新古川3号橋	21.9m	3	RC橋	T桁	2.2m	1938	指定無し	その他	河川
432	谷地橋	13.5m	1	鋼橋	I桁	2.1m	不明	指定無し	その他	河川
433	馬鞍平橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	10.3m	不明	指定無し	その他	河川
434	六本木5号橋	6.0m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
435	日向前3号橋	6.5m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
436	荒町橋	8.0m	1	RC橋	T桁	4.9m	不明	指定無し	2級	河川
437	別囲橋	6.0m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
438	狐石橋	16.5m	1	RC橋	その他の桁	8.2m	1991	指定無し	その他	河川
439	前谷地1号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.3m	不明	指定無し	その他	河川
440	六番江橋	8.4m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
441	川前1号橋	13.1m	1	鋼橋	その他の桁	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
442	飯野川前1号橋	5.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
443	川前2号橋	14.2m	1	PC橋	T桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
444	前谷地橋	18.3m	1	PC橋	T桁	7.0m	1992	指定無し	2級	河川
445	上稲荷橋	19.2m	3	鋼橋	H形鋼	4.2m	1964	指定無し	その他	河川
446	中田2号橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
447	本屋敷橋	4.5m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
448	六本木2号橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
449	岩崎前橋	10.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.2m	不明	指定無し	2級	河川
450	岩崎橋	6.6m	1	RC橋	その他の桁	5.7m	不明	指定無し	2級	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
451	山崎前1号橋	5.4m	1	RC橋	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	その他	河川
452	下稲荷3号橋	3.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.0m	不明	指定無し	その他	河川
453	六反田橋	3.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	2.7m	不明	指定無し	その他	河川
454	新石湊橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	5.9m	不明	指定無し	その他	河川
455	新相野田入7号橋	2.3m	1	RC橋	その他の桁	11.2m	不明	指定無し	2級	河川
456	島越前2号橋	6.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.3m	不明	指定無し	その他	河川
457	鳥越前6号橋	4.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	その他	河川
458	境山畑橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
459	外吉野1号橋	2.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川
460	崎山2号橋	2.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
461	袖谷地橋	3.5m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
462	二子北下1号橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	4.4m	不明	指定無し	その他	河川
463	二子南下1号橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
464	中新田1号橋	2.0m	1	RC橋	その他の桁	3.7m	不明	指定無し	その他	河川
465	南待井1号橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	4.3m	1978	指定無し	その他	河川(無名水路)
466	中新田2号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.4m	不明	指定無し	その他	河川
467	大森中樋橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川
468	田待井1号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.7m	1978	指定無し	その他	河川
469	大森長尾橋	5.5m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	1978	指定無し	その他	河川
470	南待井2号橋	3.1m	1	RC橋	その他の桁	7.0m	1978	指定無し	1級	河川
471	中新田4号橋	3.5m	1	RC橋	その他の桁	7.4m	不明	指定無し	1級	河川
472	田待井2号橋	2.5m	1	RC橋	その他の桁	7.7m	1978	指定無し	1級	河川
473	大森大見2号橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	1978	指定無し	その他	河川
474	大森長尾1号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.4m	不明	指定無し	その他	河川
475	長尾橋	4.4m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
476	新町頭橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	5.2m	不明	指定無し	その他	河川
477	根廻山崎橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
478	大森樋橋橋	3.4m	1	RC橋	その他の桁	4.3m	不明	指定無し	その他	河川(無名水路)
479	大森樋橋1号橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
480	大森高田橋	5.0m	1	RC橋	その他の桁	4.4m	不明	指定無し	その他	河川
481	大森新堤2号橋	4.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
482	大森升堤橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
483	大森高田1号橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川
484	大森高田2号橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
485	大森升堤2号橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
486	青ケ崎橋	5.4m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
487	中新田橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
488	沢田山橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.7m	不明	指定無し	その他	河川
489	大森大見橋	5.5m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	1978	指定無し	その他	河川
490	前山下橋	4.3m	1	RC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定無し	その他	河川
491	山畑8号橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.4m	不明	指定無し	その他	河川
492	大森大見1号橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	4.9m	1978	指定無し	その他	河川
493	二子橋	18.8m	3	RC橋	その他の桁	3.6m	1938	指定無し	その他	河川
494	田待井橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
495	小沢1号橋	5.0m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
496	清水田畑橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	4.3m	不明	指定無し	その他	河川
497	大森樋橋	2.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川(無名水路)
498	中谷地1号橋	4.8m	1	RC橋	その他の桁	4.4m	不明	指定無し	その他	河川
499	中新田3号橋	3.1m	1	RC橋	その他の桁	5.3m	不明	指定無し	その他	河川
500	福田橋	5.3m	1	RC橋	その他の桁	4.6m	1968	指定無し	その他	河川(倉ノ追川)

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
501	第2沢向橋	7.3m	1	RC橋	その他の桁	8.2m	不明	指定無し	その他	河川
502	第3沢向井橋	5.2m	1	RC橋	その他の桁	2.4m	不明	指定無し	その他	河川
503	澤向橋	6.3m	1	RC橋	その他の桁	6.1m	1996	指定無し	その他	河川
504	大森橋	7.9m	1	PC橋	I桁	6.4m	1974	指定無し	2級	河川
505	大吉野入橋	4.8m	1	RC橋	その他の桁	3.7m	不明	指定無し	その他	河川
506	宮下北橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.7m	不明	指定無し	その他	河川
507	大森1号橋	4.6m	1	RC橋	その他の桁	5.3m	不明	指定無し	2級	河川
508	水出橋	6.4m	1	PC橋	その他の桁	6.7m	1986	指定無し	その他	河川
509	大森内田橋	10.0m	1	PC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
510	大森中谷地橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
511	後谷地橋	21.5m	1	鋼橋	その他の桁	7.0m	1978	指定無し	2級	河川
512	大森新堤1号橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
513	山畑橋	9.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.8m	不明	指定無し	1級	河川
514	大待井下1号橋	2.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
515	大待井下2号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
516	山畑6号橋	4.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
517	大森大待井橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	3.7m	不明	指定無し	その他	河川
518	大待井橋	4.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
519	新渡波2号橋	7.6m	2	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	2015	指定なし	その他	河川
520	山畑2号橋	4.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
521	新渡波3号橋	9.7m	2	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	2015	指定なし	その他	河川
522	新渡波西1号橋	6.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.2m	2015	指定なし	その他	河川（宇田川新橋排水路）
523	大森升堤1号橋	2.1m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
524	大待井3号橋	2.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
525	大待井4号橋	2.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.3m	不明	指定無し	その他	河川
526	大森新堤3号橋	2.8m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
527	若宮橋	11.0m	1	PC橋	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
528	大森大待井1号橋	2.8m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
529	山畑3号橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
530	山畑5号橋	4.0m	2	ボックスカルバート	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	その他	河川
531	山畑4号橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
532	大森樋橋2号橋	4.9m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
533	南待井橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	4.8m	不明	指定無し	その他	河川
534	外吉野橋	2.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.8m	不明	指定無し	その他	河川
535	中里新橋	35.0m	2	RC橋	T桁	13.2m	1977	指定無し	1級	河川
536	三の坪橋	6.3m	1	RC橋	I桁	2.5m	不明	指定無し	その他	河川
537	南待井1号橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川（無名水路）
538	飯野川前2号橋	5.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.2m	1991	指定無し	その他	河川
539	鳥越前5号橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	6.7m	不明	指定無し	1級	河川
540	前釜橋	11.4m	1	PC橋	I桁	5.9m	不明	指定無し	1級	河川
541	谷津橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
542	六本木1号橋	3.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
543	谷津1号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
544	下中新田橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
545	右近田橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	3.4m	不明	指定無し	その他	河川
546	上新田橋	2.5m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
547	碓畑橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
548	浦谷地沖橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.4m	不明	指定無し	2級	河川
549	境口橋	29.5m	1	鋼橋	その他の桁	7.0m	1990	指定無し	2級	河川
550	館前1号橋	3.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.4m	不明	指定無し	2級	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
551	日影前橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
552	上猪子橋	7.3m	1	PC橋	I桁	5.7m	不明	指定無し	1級	河川
553	上金田1号橋	4.6m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
554	山崎橋	31.2m	1	PC橋	T桁	11.0m	1987	指定無し	1級	河川（新古川）
555	上金田2号橋	3.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	2級	河川
556	上中野5号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
557	女子沢前橋	3.1m	1	PC橋	その他の桁	3.7m	不明	指定無し	その他	河川
558	女子沢前1号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川
559	女子沢前2号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
560	上中野橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
561	上中野1号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
562	上中野2号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
563	上中野3号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
564	上中野4号橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
565	館前橋	6.3m	1	PC橋	その他の桁	5.5m	不明	指定無し	その他	河川
566	中野橋	7.3m	1	PC橋	その他の桁	10.3m	不明	指定無し	2級	河川
567	新相野田入橋	6.9m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
568	山畑7号橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
569	下稲荷4号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
570	小島浦橋	3.3m	1	RC橋	その他の桁	5.1m	不明	指定無し	2級	河川
571	八工区橋	5.0m	1	RC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
572	見留田橋	26.3m	1	鋼橋	H形鋼	6.0m	1977	指定無し	1級	河川
573	大吉野入1号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
574	五郎筒浦橋	8.2m	1	PC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
575	鶴家中橋	10.0m	1	RC橋	I桁	6.0m	不明	指定無し	1級	河川
576	二子南上橋	5.4m	1	PC橋	I桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
577	中村前橋	3.5m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
578	二子南上1号橋	5.5m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
579	砂波橋	6.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	14.0m	不明	指定無し	その他	河川
580	新大須切橋	30.1m	1	鋼橋	その他の桁	8.2m	2002	指定無し	その他	河川
581	日向前2号橋	3.5m	1	RC橋	その他の桁	6.6m	不明	指定無し	その他	河川
582	舟形橋	2.0m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
583	日影前1号橋	3.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	2.9m	不明	指定なし	その他	河川（中島排水路）
584	大島前橋	4.2m	1	RC橋	その他の桁	3.2m	不明	指定無し	その他	河川
585	堀下橋	6.9m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
586	新相野田入6号橋	3.5m	1	PC橋	その他の桁	4.4m	不明	指定無し	その他	河川
587	新相野田入8号橋	2.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川
588	島越前4号橋	7.6m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
589	新横前1号橋	7.6m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
590	新横前3号橋	7.6m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
591	台橋	9.2m	1	PC橋	I桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
592	天満前橋	8.1m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
593	中谷地2号橋	2.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	その他	河川
594	山崎前橋	3.1m	1	RC橋	その他の桁	2.6m	不明	指定無し	その他	河川
595	六本木3号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	2.6m	不明	指定無し	その他	河川
596	山崎前2号橋	5.2m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
597	大縄場1号橋	3.7m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川
598	六本木4号橋	2.7m	1	RC橋	その他の桁	3.2m	不明	指定無し	その他	河川
599	大待井下橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	4.4m	不明	指定無し	その他	河川
600	大縄場3号橋	4.5m	1	PC橋	その他の桁	6.9m	不明	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
651	畠中橋	12.6m	1	PC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定なし	その他	河川
652	あけぼの北橋	12.6m	2	ボックスカルバート	その他の桁	18.5m	1995	二次	その他	河川
653	なかよし橋	9.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.5m	2008	指定無し	その他	河川
654	向陽町7号橋	8.5m	1	RC橋	T桁	3.6m	不明	指定無し	1級	河川
655	新上沼1号橋	8.4m	1	PC橋	その他の桁	6.9m	1975	指定無し	1級	河川
656	刈場橋	12.0m	2	ボックスカルバート	その他の桁	15.2m	不明	二次	その他	河川
657	小閘門橋	12.5m	1	PC橋	その他の桁	7.3m	1968	指定無し	1級	河川
658	新上沼2号橋	9.5m	1	PC橋	その他の桁	6.9m	1975	指定無し	1級	河川
659	中浦2号橋	2.8m	1	RC橋	その他の桁	19.2m	不明	指定無し	1級	河川
660	塩富大橋	8.5m	1	PC橋	その他の桁	10.0m	1983	指定無し	その他	河川
661	北上運河石井閘門橋	18.0m	1	PC橋	その他の桁	9.0m	2000	指定無し	1級	河川
662	深田橋	7.5m	1	RC橋	T桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
663	太田2号こ道橋	121.0m	0	PC橋	その他の桁	6.0m	2005	指定無し	その他	緊急道路
664	追分橋	30.9m	1	PC橋	T桁	8.2m	1991	指定無し	1級	河川
665	茨島橋	27.9m	1	鋼橋	H形鋼	6.8m	1972	指定無し	2級	河川
666	夷木橋	10.4m	2	RC橋	その他の桁	3.2m	不明	指定無し	その他	河川
667	流留五性橋1号橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	6.3m	不明	指定無し	その他	河川
668	向陽町3号橋	7.3m	1	PC橋	その他の桁	11.8m	不明	二次	1級	河川
669	上台橋	7.1m	1	RC橋	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川
670	中浦4号橋	2.2m	1	RC橋	その他の桁	7.3m	1984	指定無し	その他	河川
671	新中ノ堀橋	5.9m	1	RC橋	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	その他	河川
672	新沼5号橋	4.0m	1	PC橋	I桁	4.3m	不明	指定無し	その他	河川
673	三番囲橋	4.2m	1	RC橋	その他の桁	4.9m	不明	指定無し	その他	河川
674	あけぼの1号橋	6.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	17.2m	1992	指定無し	その他	河川
675	向陽町2号橋	7.0m	1	PC橋	その他の桁	5.7m	不明	指定無し	その他	河川
676	向陽町5号橋	7.1m	1	PC橋	その他の桁	10.7m	不明	指定無し	その他	河川
677	向陽町6号橋	7.2m	1	PC橋	その他の桁	5.7m	不明	指定無し	その他	河川
678	向陽町1号橋	7.0m	1	PC橋	その他の桁	2.0m	不明	指定無し	その他	河川
679	新橋1号橋	2.0m	1	RC橋	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	その他	河川
680	新下前沼橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	6.7m	不明	指定無し	その他	河川
681	上沼1号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	4.7m	不明	指定無し	その他	河川
682	中堀4号橋	6.8m	1	RC橋	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川
683	蛇田小橋1号橋	8.9m	1	PC橋	その他の桁	5.2m	不明	指定無し	その他	河川
684	蛇田小橋2号橋	14.5m	1	PC橋	その他の桁	5.2m	1984	指定無し	その他	河川
685	中堀2号橋	4.4m	1	RC橋	その他の桁	5.4m	不明	指定無し	その他	河川
686	中堀5号橋	4.5m	1	RC橋	その他の桁	16.4m	不明	指定無し	その他	河川
687	中堀1号橋	4.5m	1	RC橋	その他の桁	12.0m	不明	指定無し	その他	河川
688	沢田こ道橋	55.5m	3	PC橋	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	その他	緊急道路
689	鶴家裏橋	8.2m	1	PC橋	I桁	3.7m	不明	指定無し	その他	河川
690	大橋二丁目1号橋	2.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.8m	不明	指定無し	その他	河川
691	不動町2号橋	4.1m	1	RC橋	その他の桁	14.2m	不明	指定無し	その他	河川
692	十文字橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	6.6m	不明	指定無し	1級	河川
693	舘下橋	4.7m	1	RC橋	その他の桁	6.8m	1984	指定無し	その他	河川
694	不動町1号橋	2.9m	1	RC橋	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	その他	河川
695	小塚橋	7.3m	1	RC橋	その他の桁	5.4m	1979	指定無し	2級	河川
696	亀山橋	7.1m	1	RC橋	その他の桁	6.5m	不明	指定無し	その他	河川
697	日和が丘2号橋	2.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	不明	二次	その他	河川
698	二ツ堀1号橋	4.4m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
699	八津橋	4.1m	1	RC橋	その他の桁	8.1m	1966	指定無し	1級	河川
700	前田1号橋	3.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.4m	不明	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
601	大森新堤橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
602	日影前2号橋	6.3m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
603	あけぼの北2号橋	12.7m	1	ボックスカルバート	その他の桁	13.8m	2015	指定なし	その他	河川
604	中田橋	7.3m	1	PC橋	I桁	6.3m	不明	指定無し	2級	河川
605	上金田橋	6.8m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
606	六反田1号橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	9.3m	不明	指定無し	2級	河川
607	上中野6号橋	8.4m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
608	小田内橋	18.8m	1	PC橋	その他の桁	5.2m	2016	指定なし	2級	河川
609	新横前2号橋	7.6m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
610	赤柴上橋	10.6m	1	PC橋	その他の桁	7.0m	2019	指定なし	その他	河川(赤柴川)
611	小向橋	12.4m	1	PC橋	I桁	4.4m	不明	指定無し	1級	河川
612	天神山4号橋	6.5m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
613	芦早2号橋	6.4m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
614	西宮山1号橋	8.2m	1	PC橋	その他の桁	7.2m	不明	指定無し	その他	河川
615	塩手橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
616	新寺橋	11.3m	1	PC橋	その他の桁	8.7m	1985	指定無し	1級	河川
617	無名橋	4.5m	1	RC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川(無名水路)
618	天神橋	7.5m	1	RC橋	T桁	6.6m	1964	指定無し	1級	河川
619	天神山1号橋	7.3m	1	RC橋	その他の桁	4.9m	不明	指定無し	その他	河川
620	入釜谷橋	8.0m	2	ボックスカルバート	その他の桁	22.8m	不明	指定無し	その他	河川
621	天神山3号橋	7.4m	1	PC橋	その他の桁	4.8m	不明	指定無し	その他	河川
622	天神山2号橋	7.3m	1	RC橋	その他の桁	3.4m	不明	指定無し	その他	河川
623	芦早1号橋	7.5m	1	PC橋	その他の桁	5.2m	不明	指定無し	その他	河川
624	梨沢1号橋	3.4m	1	RC橋	その他の桁	3.9m	不明	指定無し	その他	河川
625	向田上道橋	12.6m	1	PC橋	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
626	蜂ケ沢橋	4.1m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
627	蜂ケ沢1号橋	4.1m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
628	南立沢橋	11.3m	1	PC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定無し	2級	河川
629	梨沢橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	5.7m	不明	指定無し	その他	河川
630	新渡波1号橋	6.6m	2	ボックスカルバート	その他の桁	7.3m	2015	指定なし	その他	河川
631	新渡波西3号橋	6.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.2m	2015	指定なし	その他	河川
632	新蛇田南1号橋	5.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.8m	2015	指定なし	その他	河川
633	迦蘭橋	5.9m	1	RC橋	その他の桁	6.7m	不明	指定無し	1級	河川
634	向田上道1号橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	6.6m	不明	指定無し	1級	河川
635	追館橋	3.8m	1	RC橋	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	1級	河川
636	国土橋	3.3m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
637	横川町橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	7.6m	不明	指定無し	その他	河川
638	引浪橋	4.2m	1	RC橋	その他の桁	19.5m	不明	指定無し	1級	河川
639	堤上舘下橋	4.6m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	2級	河川
640	中里前橋	2.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.1m	不明	指定無し	その他	河川
641	竹ノ迫小橋	5.6m	1	RC橋	その他の桁	4.3m	不明	指定無し	その他	河川
642	持領前内田橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	3.7m	不明	指定無し	その他	河川
643	持領前内田1号橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
644	持領前内田2号橋	2.7m	1	RC橋	その他の桁	3.2m	不明	指定無し	その他	河川
645	七ケ入山橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	その他	河川
646	甚内1号橋	3.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	その他	河川
647	四枚下橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
648	四枚下1号橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定無し	その他	河川
649	山崎四枚下橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.0m	不明	指定無し	その他	河川
650	山崎2号橋	3.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.0m	不明	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
701	前田2号橋	3.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.0m	1981	指定無し	その他	河川
702	牧山沢橋	7.3m	1	PC橋	その他の桁	10.8m	1973	指定無し	1級	河川
703	日照橋	3.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.6m	不明	指定無し	その他	河川
704	北橋	4.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.5m	不明	指定無し	その他	河川
705	中江橋	5.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.2m	1970	指定無し	1級	河川
706	山下2号橋	4.7m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	1980	指定無し	その他	河川
707	馬場橋	4.3m	1	RC橋	その他の桁	15.4m	不明	指定無し	1級	河川
708	小沢橋	7.0m	1	PC橋	I桁	9.3m	不明	指定無し	1級	河川
709	松の木橋	6.8m	1	PC橋	I桁	5.7m	不明	指定無し	1級	河川
710	大木橋	8.8m	1	PC橋	I桁	4.6m	不明	指定無し	1級	河川
711	大木1号橋	6.0m	1	RC橋	その他の桁	4.7m	不明	指定無し	1級	河川
712	鈴木橋	3.9m	1	PC橋	その他の桁	6.2m	1980	指定無し	その他	河川
713	山下1号橋	4.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	18.0m	1994	指定無し	その他	河川
714	町裏1号橋	4.6m	1	PC橋	その他の桁	4.9m	1987	指定無し	その他	河川
715	沖田2号橋	4.4m	1	PC橋	その他の桁	8.2m	1988	指定無し	その他	河川
716	天満橋	7.0m	1	RC橋	T桁	4.8m	不明	指定無し	1級	河川（馬鞍川）
717	千賀崎橋	3.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.1m	不明	指定無し	1級	河川
718	大島山橋	2.6m	1	鋼橋	その他の桁	5.4m	不明	指定なし	1級	河川
719	相野田橋	7.8m	1	PC橋	I桁	14.0m	不明	指定無し	1級	河川
720	芝下橋	8.0m	1	RC橋	T桁	6.8m	1972	指定無し	1級	河川
721	中待井1号橋	5.1m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
722	上侭田橋	3.8m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	1980	指定無し	その他	河川
723	下侭田1号橋	4.1m	1	PC橋	その他の桁	4.6m	1980	指定無し	その他	河川
724	下侭田2号橋	4.1m	1	PC橋	その他の桁	4.5m	1980	指定無し	その他	河川
725	的場3号橋	4.3m	1	PC橋	その他の桁	7.0m	1987	指定無し	その他	河川
726	六本木橋	4.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	21.4m	不明	指定無し	1級	河川
727	日向前橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	7.5m	不明	指定無し	1級	河川
728	日向前1号橋	4.9m	1	PC橋	I桁	8.3m	不明	指定無し	1級	河川
729	金婚橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.3m	1980	指定無し	1級	河川
730	沖田1号橋	4.1m	1	PC橋	その他の桁	5.8m	1987	指定無し	その他	河川
731	沖田3号橋	4.1m	1	PC橋	その他の桁	4.3m	1987	指定無し	その他	河川
732	的場1号橋	4.7m	1	PC橋	その他の桁	6.7m	1987	指定無し	その他	河川
733	的場2号橋	4.3m	1	PC橋	その他の桁	5.5m	1987	指定無し	その他	河川
734	若宮橋	6.6m	1	鋼橋	H形鋼	4.5m	不明	指定無し	その他	河川
735	島越前1号橋	5.8m	1	RC橋	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	1級	河川
736	清水沢橋	4.7m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
737	江下3号橋	4.1m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	1987	指定無し	その他	河川
738	永田1号橋	4.6m	1	PC橋	その他の桁	5.5m	1987	指定無し	その他	河川
739	永田2号橋	4.8m	1	PC橋	その他の桁	7.6m	1994	指定無し	その他	河川
740	大草橋	8.4m	1	RC橋	その他の桁	5.2m	1968	指定無し	その他	河川
741	寺前2号橋	8.0m	1	RC橋	その他の桁	4.7m	1974	指定無し	その他	河川
742	寺前1号橋	8.5m	1	PC橋	その他の桁	4.6m	不明	指定無し	その他	河川
743	上之間橋	7.3m	1	PC橋	その他の桁	9.7m	不明	指定無し	その他	河川
744	清水2号橋	9.9m	1	RC橋	その他の桁	7.0m	1981	指定無し	その他	河川
745	清水橋	7.4m	1	PC橋	その他の桁	4.6m	1968	指定無し	その他	河川
746	平畑橋	6.4m	1	RC橋	その他の桁	5.5m	不明	指定無し	1級	河川
747	内田橋	5.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	9.0m	不明	指定無し	1級	河川
748	寺橋	6.3m	1	RC橋	その他の桁	5.4m	1978	指定無し	その他	河川
749	中内橋	4.2m	1	ボックスカルバート	その他の桁	0.0m	1980	指定無し	1級	河川
750	筒の内1号橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.6m	1993	指定無し	1級	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
751	八幡橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.9m	1977	指定無し	その他	河川
752	西條橋	3.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	15.0m	1993	指定無し	その他	河川
753	岩淵橋	5.0m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	1971	指定無し	その他	河川
754	横路橋	7.0m	1	鋼橋	I桁	5.6m	不明	指定無し	その他	河川
755	柳田橋	13.4m	1	PC橋	その他の桁	6.2m	1978	指定無し	その他	河川
756	亀山橋	7.3m	1	PC橋	その他の桁	5.6m	1973	指定無し	その他	河川
757	台畑橋	6.1m	1	RC橋	その他の桁	6.7m	1970	指定無し	1級	河川
758	筒の内2号橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	15.0m	1993	指定無し	1級	河川
759	日高見橋	4.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	11.2m	1971	指定無し	1級	河川
760	小林橋	3.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.1m	1984	指定無し	その他	河川
761	小田前橋	4.7m	1	RC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	2級	河川
762	寺中橋	9.9m	1	RC橋	その他の桁	5.5m	不明	指定無し	その他	河川
763	宮下橋	8.0m	1	RC橋	その他の桁	5.9m	不明	指定無し	その他	河川
764	中戈橋	7.4m	1	PC橋	その他の桁	5.3m	不明	指定無し	その他	河川
765	水車橋	7.7m	1	RC橋	T桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
766	下新田橋	7.4m	1	PC橋	その他の桁	9.6m	不明	指定無し	その他	河川
767	日向橋	3.9m	1	RC橋	その他の桁	6.8m	1972	指定無し	その他	河川
768	下牛田橋	3.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.3m	1975	指定無し	2級	河川
769	黄龍淵2号橋	4.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	13.1m	不明	指定無し	その他	河川
770	角前1号橋	3.3m	1	PC橋	その他の桁	7.0m	1979	指定無し	その他	河川
771	小待井橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.0m	1988	指定無し	その他	河川
772	日影橋	6.4m	1	RC橋	その他の桁	5.8m	1976	指定無し	その他	河川
773	人留橋	9.2m	1	RC橋	その他の桁	4.2m	1981	指定無し	その他	河川
774	八森山橋	7.1m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川
775	日向2号橋	8.3m	1	RC橋	その他の桁	5.3m	1974	指定無し	その他	河川
776	日向4号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	6.7m	不明	指定無し	その他	河川
777	大膳橋	2.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	6.2m	1974	指定無し	2級	河川
778	上表橋	2.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.8m	1971	指定無し	その他	河川
779	御意橋	2.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.5m	1973	指定無し	その他	河川
780	黄龍淵1号橋	4.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	7.0m	不明	指定無し	その他	河川
781	表橋	2.8m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.8m	1974	指定無し	その他	河川
782	四の坪橋	8.6m	1	RC橋	I桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
783	萱原橋	8.0m	1	RC橋	その他の桁	5.5m	1981	指定無し	その他	河川
784	道場橋	12.5m	1	PC橋	その他の桁	6.3m	不明	指定無し	その他	河川
785	真野1号橋	7.3m	1	PC橋	H形鋼	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
786	高木1号橋	7.3m	1	PC橋	その他の桁	7.3m	不明	指定無し	その他	河川
787	九の坪橋	4.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	10.3m	不明	指定無し	その他	河川
788	丸森1号橋	4.5m	1	ボックスカルバート	その他の桁	8.0m	不明	指定無し	2級	河川
789	丸森2号橋	4.9m	1	ボックスカルバート	その他の桁	5.9m	1983	指定無し	その他	河川
790	熊谷橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	15.0m	1975	指定無し	1級	河川
791	小友山橋	10.3m	1	RC橋	その他の桁	6.6m	不明	指定無し	その他	河川
792	新小友橋	9.5m	1	RC橋	その他の桁	6.8m	不明	指定無し	2級	河川
793	鶴家西橋	9.5m	1	PC橋	I桁	5.7m	不明	指定無し	その他	河川
794	一番江橋	10.4m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
795	越田橋	3.2m	1	RC橋	その他の桁	6.2m	不明	指定無し	2級	河川
796	学校前橋	2.8m	1	PC橋	その他の桁	6.3m	不明	指定無し	その他	河川
797	1号橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	6.4m	不明	指定無し	その他	河川
798	志の畑1号橋	8.3m	1	RC橋	その他の桁	6.6m	不明	指定無し	その他	河川
799	志の畑2号橋	7.5m	1	RC橋	その他の桁	6.1m	不明	指定無し	その他	河川
800	平形3号橋	8.5m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
801	沢田承水路第2号橋	8.3m	1	PC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
802	二番江橋	10.4m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
803	五十五人3号橋	8.4m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
804	五十五人1号橋	9.4m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	1977	指定無し	その他	河川
805	五十五人2号橋	9.4m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	1997	指定無し	その他	河川
806	苗代橋	10.7m	1	PC橋	その他の桁	6.0m	不明	指定無し	その他	河川
807	新堤橋	7.5m	2	ボックスカルバート	その他の桁	21.1m	2015	指定無し	1級	河川
808	山下跨線歩道橋	16.5m	1	鋼橋	H形鋼	2.4m	1990	指定無し	その他	鉄道
809	中埣橋	58.0m	2	PC橋	T桁	20.0m	1972	二次	1級	河川
810	鋳銭場橋	2.4m	1	RC橋	その他の桁	8.4m	不明	指定無し	その他	河川
811	町浦1号橋	3.9m	1	PC橋	その他の桁	4.6m	1980	指定無し	その他	河川
812	日和が丘1号橋	3.4m	1	RC橋	その他の桁	9.1m	不明	二次	その他	河川
813	伊原津1号橋	2.9m	1	RC橋	その他の桁	4.9m	不明	指定無し	その他	河川
814	角前2号橋	3.7m	1	PC橋	その他の桁	3.8m	不明	指定無し	その他	河川
815	伊原津橋	9.5m	1	PC橋	その他の桁	8.8m	1973	指定無し	1級	市道
816	城安橋	29.1m	1	鋼橋	I桁	8.2m	1992	指定無し	その他	河川
817	清水跨線橋	31.0m	3	PC橋	T桁	16.4m	1972	二次	1級	鉄道
818	石巻駅南北自由通路橋	63.6m	10	鋼橋	H形鋼	3.0m	1994	指定無し	その他	鉄道
819	末広町1号橋	2.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	12.1m	不明	指定無し	その他	河川
820	新千刈こ線橋	61.0m	3	PC橋	その他の桁	10.0m	1994	指定無し	1級	鉄道
821	蛇田跨線橋	230.0m	7	PC橋	T桁	22.1m	2014	一次	1級	鉄道
822	境谷地高架橋	165.0m	6	PC橋	T桁	12.0m	1990	指定無し	1級	鉄道
823	流留こ線橋	71.1m	3	PC橋	その他の桁	14.0m	2003	指定無し	1級	鉄道
824	新下沼橋	5.3m	1	RC橋	その他の桁	11.5m	1980	指定無し	1級	河川
825	根岸前1号橋	4.5m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川（半田川新橋排水路）
826	畠中1号橋	3.6m	1	RC橋	その他の桁	2.6m	不明	指定無し	その他	河川（加茂川）
827	町北橋	10.0m	2	PC橋	その他の桁	2.8m	不明	指定無し	その他	河川（定川添水路）
828	新谷地畑橋	5.0m	1	RC橋	その他の桁	2.2m	1969	指定無し	その他	河川（大網用水路）
829	小網倉橋	4.5m	1	PC橋	T桁	4.4m	不明	指定無し	その他	河川
830	養留1号橋	2.8m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川（的場沢）
831	金田2号橋	3.3m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川（東側溝用水路）
832	長尾1号橋	2.7m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
833	明神2号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
834	中ノ内1号橋	8.8m	1	PC橋	I桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川（昆布沼排水路）
835	明神1号橋	3.0m	1	RC橋	その他の桁	2.4m	1962	指定無し	その他	河川
836	中江橋	19.2m	1	PC橋	T桁	7.0m	1992	指定無し	その他	河川（旧古川）
837	山崎前3号橋	5.5m	1	RC橋	その他の桁	4.1m	不明	指定無し	その他	河川（牧野巣用水路）
838	新雷神2号橋	4.0m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	1962	指定無し	その他	河川
839	平欠橋	5.2m	1	RC橋	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川
840	瓦山橋	5.2m	1	RC橋	その他の桁	3.3m	不明	指定無し	その他	河川
841	鳥ノ巣前橋	5.0m	1	PC橋	その他の桁	2.2m	不明	指定無し	その他	河川
842	第2大番所前橋	6.0m	1	ボックスカルバート	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
843	久米田前橋	5.0m	1	PC橋	その他の桁	2.2m	不明	指定無し	その他	河川
844	第3牡丹窪橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
845	新下田橋	2.4m	1	PC橋	その他の桁	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
846	第2黒沢天狗橋	5.5m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
847	中田橋	3.0m	1	PC橋	その他の桁	2.2m	不明	指定無し	その他	河川（横座排水路）
848	第3上谷地橋	6.4m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
849	第2上谷地橋	6.3m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
850	第1上谷地橋	6.4m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川

8. 石巻市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	幅員	竣工年	緊急 輸送路	町道	交差物 （種別）
851	山崎櫓前橋	7.2m	1	PC橋	その他の桁	5.0m	不明	指定無し	その他	河川
852	第5上谷地橋	6.4m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
853	第4上谷地橋	6.4m	1	PC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
854	第2新中津才橋	6.1m	1	PC橋	その他の桁	2.7m	不明	指定無し	その他	河川
855	第2沖東橋	2.3m	1	ボックスカルバート	その他の桁	1.8m	不明	指定無し	その他	河川
856	第1新中津才橋	6.1m	1	PC橋	その他の桁	3.5m	不明	指定無し	その他	河川
857	第3新中津才橋	5.0m	1	PC橋	その他の桁	2.7m	不明	指定無し	その他	河川
858	中埣東新横沼橋	7.4m	1	PC橋	その他の桁	2.6m	不明	指定無し	その他	河川（二開銅排水路）
859	弥五兵衛1号橋	3.5m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
860	味噌作橋	2.6m	1	RC橋	その他の桁	4.0m	不明	指定無し	その他	河川
861	窪沼橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
862	寺前橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川（三郡幹線用水路）
863	第2牡丹窪橋	3.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
864	第1日照橋	3.1m	1	ボックスカルバート	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
865	宮田1号橋	9.1m	1	鋼橋	H形鋼	3.1m	不明	指定無し	その他	河川
866	無名橋	2.3m	1	RC橋	その他の桁	2.8m	不明	指定無し	その他	河川（鼎貝用水路）
867	第2西橋	4.5m	1	PC橋	その他の桁	4.2m	不明	指定無し	その他	河川
868	正太郎1号橋	2.6m	1	ボックスカルバート	その他の桁	2.8m	不明	指定無し	その他	河川
869	正太郎2号橋	2.4m	1	ボックスカルバート	その他の桁	2.5m	不明	指定無し	その他	河川
870	第4道的前橋	2.2m	1	RC橋	その他の桁	3.0m	不明	指定無し	その他	河川
871	横前橋	2.1m	1	RC橋	その他の桁	2.9m	不明	指定無し	その他	河川（道的排水路）
872	熊野前橋	4.3m	1	RC橋	その他の桁	3.6m	不明	指定無し	その他	河川
873	新竹の迫橋	17.4m	1	PC橋	その他の桁	4.2m	2022	指定無し	その他	河川
874	赤柴橋	16.2m	1	PC橋	その他の桁	7.2m	2019	指定無し	その他	河川
875	西中瀬橋	82.0m	1	鋼橋	その他の桁	10.5m	2020	指定無し	その他	河川
876	石巻駅前連絡歩道橋	170.5m	11	その他	その他の桁	3.6m	2019	指定無し	その他	市道
877	伊原津横断歩道橋	20.5m	3	鋼橋	その他の桁	1.9m	不明	指定無し	その他	市道

8. 新技術等の活用について

1）新技術等の活用方針について

従来技術である橋梁点検車を用いた点検に新技術であるドローンを活用することで、橋梁定期点検の効率化を図ります。また、現地点検時にタブレット端末から橋梁点検システムへ直接入力し、点検調書入力等の内業の効率化・簡便化を図ります。これらによりコスト縮減を目指します。

2）新技術等の活用に関する数値目標について
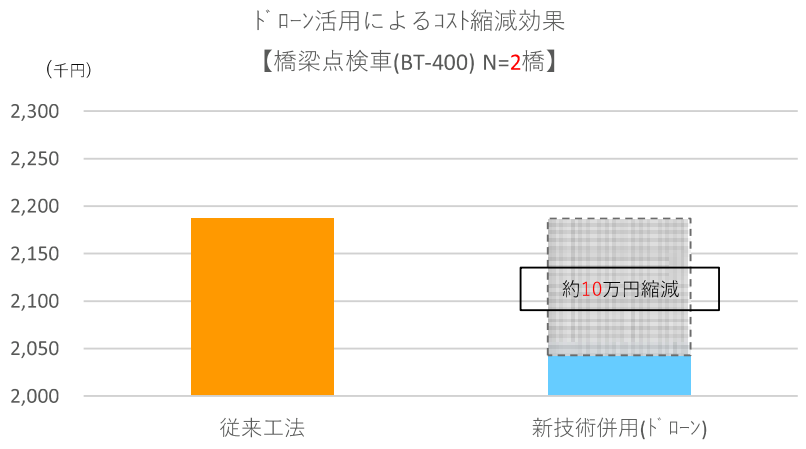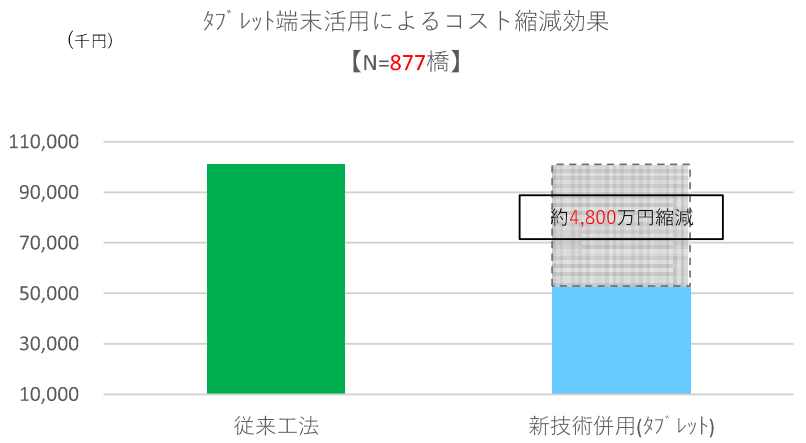
令和5年度～令和9年度の橋梁定期点検(N=877橋)のうち、橋梁点検車(BT-400)を使用する2橋に新技術であるドローンを活用し、約10万円のコスト縮減を目指します。また、全橋梁において、現地点検時にタブレット端末を活用して橋梁点検システムへ直接入力することで、約4800万円のコスト縮減を目指します。
