

漁港施設等の復旧・復興整備(34市管理漁港)

◆被災した漁港施設の復旧・復興整備を行います。



震災復興基本計画【主な重点プロジェクト:海と大地との共生プロジェクト】(抜粋)

事業名	実施時期										
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
漁港災害復旧事業											


事業名	漁港類型	H23				H24				H25				H26				H27			
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
漁港災害復旧事業	拠点漁港	応急工事・設計				復旧工事															
	拠点以外	応急工事・設計								復旧工事											
漁港施設機能強化事業 (※)	拠点漁港					設計・漁港用地嵩上げ				漁港施設の増設											
	拠点以外									設計・漁港用地嵩上げ											

※ 本事業の主な内容は、市管理漁港の災害復旧事業と併せて実施される漁港用地嵩上げです。石巻市震災復興基本計画の「海と大地との共生プロジェクト」に位置付けられている「漁港施設機能強化事業」(実施主体: 県、実施期間: H23~H25)の内容は、県管理漁港である石巻漁港の後背地について、民有地と一体的な嵩上げを実施するものです。

漁港施設災害復旧事業計画図
(下図は北上地区相川漁港の例。
右写真は同漁港の被災状況)

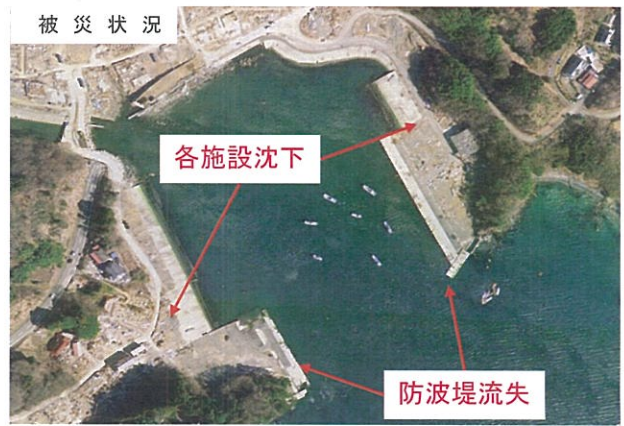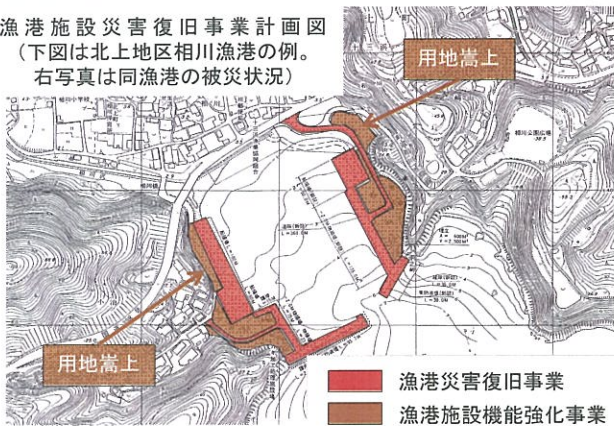

資料3 P1下段「漁港位置図」

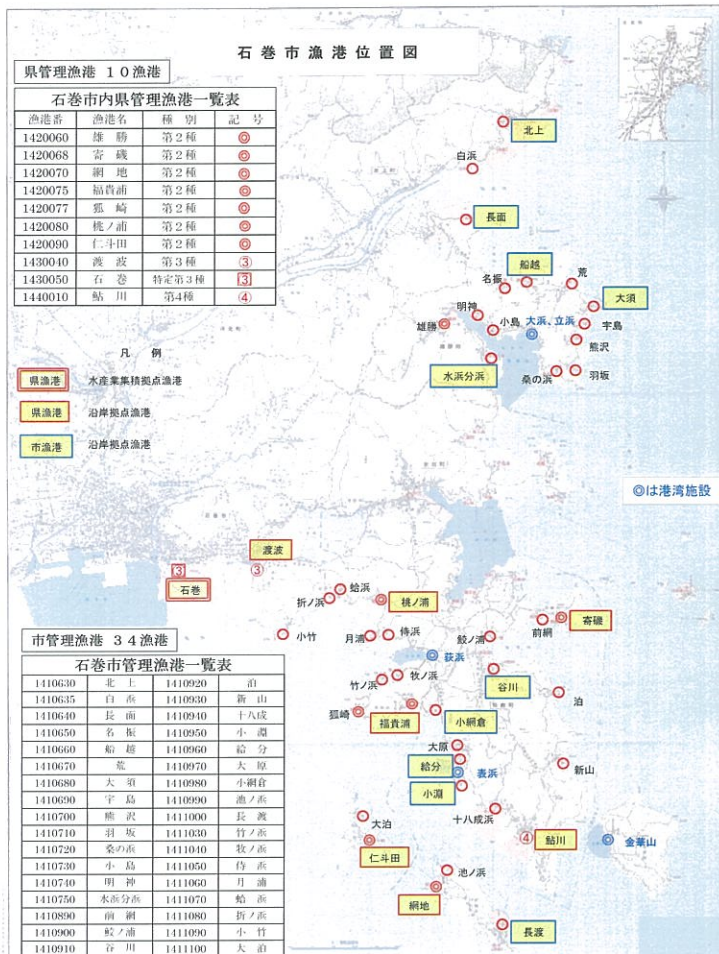

○ 漁港施設の災害復旧事業 スケジュール

上段:計画 下段:実施

地区	漁港名	漁港類型	H23	H24	H25	H26	H27
			応急復旧・実施設計	復旧工事	復旧工事	復旧工事	
北上	北上	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	白浜	拠点以外				※防潮堤整備との調整を行った上で整備計画を検討	
河北	長面	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
雄勝	名振	拠点以外					
	船越	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	荒	拠点以外					
	大須	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	宇島	拠点以外				※主要な漁港施設である船揚場は一部利用可能な状態。	
	熊沢	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	羽坂	拠点以外					
	桑の浜	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	小島	拠点以外				※防潮堤整備との調整を行った上で整備計画を検討	
	明神	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計			※防潮堤整備との調整を行った上で整備計画を検討	
	水浜分浜	拠点漁港					
	牡鹿	前網	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計			
鮫ノ浦		拠点以外					
谷川		拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				

* 黒色:計画 青色:実績 赤色:契約済(実施中) 黄色:発注手続中(未契約)

○ 漁港施設の災害復旧事業 スケジュール

上段:計画 下段:実施

地区	漁港名	漁港類型	H23	H24	H25	H26	H27
			応急復旧・実施設計	復旧工事	復旧工事	復旧工事	
牡鹿	泊(大原)	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	新山	拠点以外					
	十八成浜	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計			※平成24年度は、物揚場を応急施設で代替。	
	小淵	拠点漁港					
	給分	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	大原	拠点以外					
	小網倉	拠点漁港	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	池ノ浜	拠点以外(離島)				※防潮堤整備との調整を行った上で整備計画を検討	
	長渡	拠点漁港(離島)	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
本庁	竹ノ浜	拠点以外					
	牧ノ浜	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	侍浜	拠点以外					
	月浦	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	蛤浜	拠点以外				※防潮堤整備との調整を行った上で整備計画を検討	
	折ノ浜	拠点以外	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				
	小竹	拠点以外					
	大泊	拠点以外(離島)	ガレキ撤去・嵩上等・実施設計				

* 黒色:計画 青色:実績 赤色:契約済(実施中) 黄色:発注手続中(未契約)

水産物地方卸売市場の整備(石巻売場、牡鹿売場)

◆高度衛生管理に対応した先進的多機能市場(石巻売場)と、活魚重点取扱市場(牡鹿売場)を整備します。

震災復興基本計画【主な重点プロジェクト:海と大地との共生プロジェクト】(抜粋)

事業名	実施時期											
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
水産物地方卸売市場建設事業	[Green bar indicating project duration from H23 to H26]											

市場名	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	
石巻売場	基本計画策定				地質調査・設計				建設工事・監理								
	H23.7月～一部業務再開								H27年度供用開始予定								
牡鹿売場					地質調査・設計				建設工事・監理								
	H24.2月～一部業務再開								H26年度供用開始予定								

◆魚市場復旧イメージ



共同乾燥調製貯蔵施設整備事業

◆地域の農業者が共同で利用できる乾燥調製貯蔵施設の整備を行うことで、営農活動の再開を支援し、農地の利用集積の促進や農業経営の効率化を図ります。

震災復興基本計画【施策大綱3 大地とともに生きる(1)被災農林業への再建支援】(抜粋)

事業名	実施時期											
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
生産基盤整備支援事業	[Green bar indicating project duration from H23 to H26]											

事業名	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	
共同乾燥調製貯蔵施設整備事業					地質調査・設計				建設工事・監理								

被災した農地、農業用施設の計画的な復旧

個別から共同へ(効率的な農業経営を目指して)



共同乾燥調製貯蔵施設の整備

