

平成25年度 第11回石巻市震災復興推進本部

日時：平成26年2月17日（月）

庁議終了後

会場：庁議室

次

第

1 開 会

2 報告事項

- (1) 復興事業の進捗状況について
- (2) 復興スケジュールについて
- (3) 復興状況に関する資料の作成について

3 その他

4 閉 会

石巻市震災復興推進本部 名簿

職		氏 名	電 話
本部長	市長	亀山 紘	2000
副本部長	副市長	笹野 健	2002
本 部 員	教育長	境 直彦	5000
	復興政策部長	星 雅俊	4200
	総務部長	柳田 正人	4000
	財務部長	阿部 明夫	3010
	復興事業部長	阿部 善弘	5500
	河北総合支所長	梶原 敏彦	820-200
	雄勝総合支所長	相澤 清也	57-2111
	河南総合支所長	斎藤 峰好	840-200
	桃生総合支所長	石川 文彦	850-201
	北上総合支所長	新藤 喜悦	67-2111
	牡鹿総合支所長	木村 富雄	870-210
	生活環境部長	小畑 孝志	3300
	健康部長	水野 正昭	2614
	福祉部長	内海 正博	2400
	産業部長	阿部 正博	3500
	建設部長	土井 昇	5600
	病院局事務部長	鷺見 祐一	25-5671
会計管理者	水沼 顯徳	6800	
教育委員会事務局長	佐藤 和夫	5001	

【事務局】

復興政策部 次長	堀内 賢市	4201
復興政策部 復興政策課長	岡 道夫	4211
復興政策部 副参事	佐藤 由美	4211
同 部 復興政策課長補佐	中村 恒雄	4213
同 部 復興政策課長補佐	及川 晴彦	4212
同 部 復興政策課職員	4214・4216	

復興事業の進捗状況

担当部署名	復興政策部
内 容	<p>【復興政策課】</p> <p>(1) 復興戦略検討チーム</p> <p>1月16日 第2回復興戦略検討チーム 石巻市の最悪シナリオ 16名(男:13名、女3名)</p> <p>1月30日 第3回復興戦略検討チーム 他自治体の状況 14名(男:12名、女2名)</p> <p>(2) 中心市街地活性化基本計画策定関係</p> <p>今後の予定</p> <p>2月7日 石巻市まちづくり活性化推進会議 2月14日 まちなか再生促進特別委員会を開催予定 2月17日 石巻市中心市街地活性化協議会を開催予定 2月18日 第5回市民会議を開催予定 3月 基本計画(原案) 3月 第6回市民会議(最終回)を開催予定 3月 石巻市まちづくり活性化推進会議 3月 石巻市中心市街地活性化協議会を開催予定 4月 パブリックコメント実施予定 4月 まちなか再生促進特別委員会を開催予定 4月 総理大臣認定申請予定 7月 総理大臣認定予定</p> <p>【地域協働課】</p> <p>1月30日 東部地区復興まちづくり事業の一環として「津波シミュレーション説明会」を開催 参加者 約100名</p>

復興事業の進捗状況

担当部署名	復興事業部
内 容	<p><基盤整備課></p> <p>(1) 防災緑地2号測量及び基本設計業務発注 (工期 H25.12.2～H26.3.28)</p> <p>(2) 南浜公園関連 国交省東北地方整備局による有識者委員会の設置</p> <p>① 第1回有識者委員会 H25.10.1 開催</p> <p>② 市民フォーラム H25.10.20 開催 130名参加 参考</p> <p>③ 第2回有識者委員会 H25.12.10</p> <p>④ 第3回有識者委員会 H26.1.28</p> <p>⑤ パブリックコメント H26.2 上旬～予定</p> <p>⑥ 第4回有識者委員会 H26.3 上旬予定</p> <p>(3) 高台避難場所及び高台避難路整備その2工事 発注済 (工期 H25.1.16～H26.3.20) ・市民プール横地区、不動明王入口地区、大門崎公園地区</p> <p>(4) (仮称)渡波稲井線都市計画の素案説明会 H26.1.11 開催 (都市計画決定に伴う素案説明会を実施。2/28 告示予定) 出席者 83名</p> <p>(5) 市街地再開発事業</p> <p>①中央三丁目1番地区 ・都市計画決定 H24.11.22 ・事業認可 H25.6.7</p> <p>②立町二丁目5番地区 ・都市計画決定 H25.3.22</p> <p>③中央一丁目14・15番地区 ・都市計画決定 H25.10.25</p> <p>④その他検討地区 ・中央二丁目9番地区 ・立町一丁目4・5番地区 ・中央二丁目4番地区 ・中央二丁目3番地区 ・中央二丁目6番地区 ・中央二丁目11番地区</p> <p>⑤石巻市復興まちづくり計画策定業務(中央南地区) ・履行期間 H25.8.26～H26.3.31</p> <p>(6) 優良建築物等整備事業</p> <p>①松川横丁地区 検討中</p> <p>(7) 東部地区復興まちづくりについて 意見交換会の開催</p>

H25.12.2 榎壇地区対象(榎壇会館)

H25.12.3 渡波北(万石町・塩富町ほか)地区対象(万石町集会所)

H25.12.11 吉野町・御所入・湊町地区対象(みなと荘)

H25.12.12 松並町・緑町地区対象(鹿妻南コミュニティハウス)

H25.12.16 渡波西(栄田・黄金浜ほか)地区対象(黄金浜会館)

説明会の開催

H26.1.29 津波シミュレーションについて(万石浦中学校)

<区画整理第1課>

・第2回新渡波西地区土地区画整理審議会開催

日時:平成26年1月31日(金)

場所:市民活動ルームC

<区画整理第2課>

(1)新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業

・H26年1月22日第1回新門脇地区土地区画整理審議会開催

(2)湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業

・H26.1.15 第8回湊東地区3町内会合同打ち合わせ会開催

・H26.1.17 第1回湊東地区土地区画整理審議会開催

(3)湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業

・H26.1.20 第1回湊北地区土地区画整理審議会開催

(4)下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業

・H26.1.15 公示により当該土地区画整理審議会発足(法第56条第1項)

・H26.1.31 第1回下釜第一地区土地区画整理審議会開催

(5)中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業

・平成26年1月10日付けで宮城県知事から事業認可を受け、仮換地指定に向けた土地の先行買収、換地先等意向確認を実施中

(6)湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業

・平成26年1月10日付けで宮城県知事から事業認可を受け、仮換地指定に向けた換地設計及び事業者の換地先等意思確認を実施中

(7)下釜第一南部・下釜第二南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業

・平成26年1月28日に臨港地区(事業者)意向調査説明会を実施

<復興住宅課>

(1)復興公営住宅(借上型)2地区入居開始

H25.4 根上り松(20戸)、H25.7 中里一丁目(20戸)、H26.2 南中里一丁目(48戸)、沖六勺西(35戸)、沖六勺東(26戸)の5地区で入居開始

(2)復興公営住宅の事前登録受付(受付期間 H25.9.17~11.29)

	<p>市街地約 2,400 戸分の復興公営住宅の事前登録の受付開始</p> <p>(3) 宮城県代行による工事着手 吉野町一丁目(158 戸)、黄金浜(58 戸)、黄金浜(92 戸)の3地区において工事着手</p> <p>(4) 直接建設による工事着手 大須(1 戸)、羽坂・桑浜(2 戸)の雄勝2地区において工事着手</p> <p>(5) 石巻市半島沿岸部の木造復興公営住宅整備に係る基本協定締結 半島沿岸部の木造復興公営住宅について、石巻地元工務店協同組合と連携して整備を進めるため基本協定締結</p>
--	---

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業の進捗状況

担当部署名	北上総合支所 地域振興課
内 容	<p>1月9日(木) 釜谷崎地区 防災集団移転促進事業説明会 ・造成工事の進捗状況、集会所の建築方法説明。</p> <p>1月29日(水) 小室地区 防災集団移転促進事業説明会 ・造成工事の進捗状況説明、住民による宅地割決定。</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業の進捗状況

担当部署名	産業部						
内 容	<p><産業推進課></p> <p>(1) 須江地区 一団地の津波防災拠点市街地形成施設事業 ・平成 25 年 11 月 25 日付けで事業認可を受け、平成 26 年 1 月から実施設計業務を実施中。</p> <p>(2) 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H25 年 12 月末現在)</p>						
	特区の名称	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳			
				法第 40 条	法第 37 条	法第 38 条	法第 39 条
	石巻まちなか再生特区	22 社	27 件	0 件	15 件	12 件	0 件
	愛ランド特区	6 社	8 件	1 件	6 件	1 件	0 件
	民間投資促進特区 (ものづくり産業版)	59 社	64 件	0 件	44 件	20 件	0 件
	民間投資促進特区 (IT 産業版)	3 社	3 件	0 件	2 件	1 件	0 件
民間投資促進特区 (農業版)	2 社	3 件	0 件	2 件	1 件	0 件	
<p>※石巻まちなか再生特区について、東日本大震災復興特別区域法第42条第1項に規定する出資特例の活用が可能となっているものの、計画認定後の状況変化により、(株)街づくりまんぼうが実施する事業を追加するため、平成 26 年 2 月 7 日付けで計画の変更認定申請を行った。</p> <p>※民間投資促進特区(ものづくり産業版)については、復興産業集積区域(税制特例が受けられる区域)の拡充について復興庁との協議を行っており、今月中に計画の変更認定申請を行う予定。</p>							

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p><都市計画課></p> <p>◆七窪蛇田線街路整備事業</p> <p>(1)関係地区町内会長等説明会 12月25日(水)10:00～ 本庁舎「市民活動ルーム」にて開催</p> <p>(2)住民説明会「田道町1丁目町内会」 1月29日(水)18:00～ 町内まちの寄り合い所「うめばたけ」</p> <p>(3)住民説明会「清水町1丁目町内会」 1月30日(木)18:30～ 「清水町1丁目集会所」</p> <p><河川港湾室></p> <p>(1)『復興まちづくりと連携した水辺空間のデザインを考えるワークショップ』 ・1月18日(土)午後1時～5時 みなと荘にて開催 ・北上川沿川地区の住民を対象に、市の復興まちづくり計画をもとに水辺空間のデザインについて意見を集めるもの。 ・『旧北上川河口かわまちづくり検討会』の一環</p> <p>【実施主体】 東北地方整備局 北上川下流河川事務所</p> <p>【問い合わせ先】 北上川下流河川事務所調査第一課 石巻市建設部河川港湾室</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

第2回 地域ワークショップ 実施概要

●ワークショップ趣旨

旧北上川河口の堤防・護岸整備にあたり、復興まちづくりと連携した水辺空間のデザインを地域の方々に考えてもらい、「旧北上川河口かわまちづくり」に反映する。

●実施概要

月日 : 平成26年01月18日(土)
 時間 : 13時00分～17時00分
 会場 : みなと荘 大広間
 参加 : 一般参加者 21名 4班編成(マスコミ取材無し)

●アドバイザー

東北大学 平野先生

●事務局

石巻市河川港湾室	5名
東北地方整備局(河川環境課)	4名
北上川下流河川事務所 (事務所長、副所長、監督官、工一、調一、総務、涌谷)	14名
	合計23名

1

第2回ワークショップ タイムスケジュール


<p>(1)はじめに ①あいさつ、簡単に自己紹介 ②ワークショップの進め方を説明 ・流れ、考えてもらいたい内容、留意点</p> <p>(2)旧北上川を知る ①基礎情報(歴史、文化、堤防・護岸計画、住小WS) ②基礎情報(プロムナード計画) ③基礎情報(パブコメ資料) ※詳細についてはグループワークにて随時ご説明することとする。 ～休憩(5分間)～</p> <p>(3)グループワーク ①自己紹介 ②メンバー役割分担(発表者) ③旧北上川の良いところ・悪いところ(改善すべきところ)を意見出し 各班発表 ～休憩(5分間)～ ④旧北上川河口の使い方・したい事、欲しいもの、 子供達に残したいもの、良い景色など意見出し 各班発表 ～休憩(5分間)～ ⑤かわまち検討案への意見、改善点 各班発表</p> <p>(4)おわりに ①講評 ②お礼</p>	<p>.....司会(本田副所長) 平野先生 山田課長</p> <p>.....山田課長 木村室長 斎藤課長</p> <p>.....各班ファシリテーター、メンバー 各班ファシリテーター メンバー 各班ファシリテーター、メンバー メンバー 各班ファシリテーター、メンバー</p> <p>.....平野先生 全員</p>	<p>(1)はじまり ①13:00～13:05(5分) ②13:05～13:10(5分)</p> <p>(2)旧北上川を知る ①13:10～13:20(10分) ②13:20～13:30(10分) ③13:30～13:45(15分)</p> <p>休憩13:45～13:50(5分) (3)グループワーク ①13:50～13:55(5分) ②13:55～14:00(5分) ③14:00～14:40(40分) 14:40～14:55(15分) 休憩14:55～15:00(5分)</p> <p>④15:00～15:40(40分) 15:40～15:55(15分) 休憩15:55～16:00(5分) ⑤16:00～16:40(40分) 16:40～16:55(15分)</p> <p>(4)おわりに ①16:55～16:59(4分) ②16:59～17:00(1分)</p>
--	---	--

2

第2回 地域ワークショップ 周知方法

<周知方法>

- ①市報12月15日号に掲載
- ②開催前に国・市合同記者発表
- ③北上川下流河川事務所ホームページ、石巻市ホームページに掲載
- ④工事現場の看板に掲示
(旧北上川河口部の下流事務所発注工事)
- ⑤旧北上川沿川自治会長さんあてご案内送付
- ⑥石巻工業高校へ案内チラシ配布(130部)
- ⑦東北大学平野研究室、小森研究室へご案内
- ⑧関連NPO団体へ個別案内



新聞掲載状況
(石巻かほく H25年12月17日 3面)

市報掲 | /15号)

第2回ワークショップ グループワーク (1)

テーマ: 旧北上川の良いところ、悪いところ
時間: グループワーク40分、発表15分

グループワークの状況



各班発表状況



グループワークの成果



意見概要

<良いところ>

- 中瀬があること
- 日和山からの見晴らしが良い
- 河岸の石積みが良い
- 親子で楽しむ釣りが良かった
- 散策道があり便利
- 河口部なのに河川の蛇行が残っている
- 川開き祭り
- 毎日流れ方や流量が変化、眺めるのが楽しい

<悪いところ>

- 洪水が多い、台風・洪水が怖い
- 親水空間がなくなった
- 近年水質の悪化
- 不法係留、マリーナの未整備
- 魚市場が無くなり川岸の賑わいが無くなった
- ゴミが多い
- 親水空間がなくなった


第2回ワークショップ グループワーク（2）

テーマ：旧北上川河口の使い方・したい事、欲しいもの、子供達に残したいもの、良い景色など
 時間：グループワーク40分、発表15分

グループワークの状況



各班発表状況

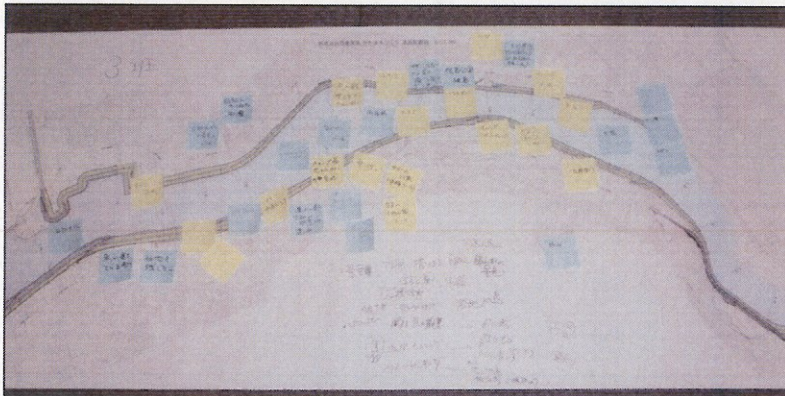

グループワークの成果

意見概要


- <使い方・したいこと>
 - 水辺を見ながら食事
 - ビオトープを作り川の生物観察
 - カヌーの川旅
 - 植樹
 - 花火観覧
 - ヨシ原の復活
- <欲しいもの>
 - ヨットハーバー、貸しボート、遊覧船
 - 階段などの安全対策
 - 駐車場
 - 並木
 - 観光案内板
 - サイクリングロード
 - 船着き場
 - トイレ・長いイス
 - お祭りができるステージ
 - 中瀬にキャンプ場
 - 釣り場
 - オープンカフェ
- <良い景色>
 - 日和山からの眺め
 - 住吉神社、住吉公園、雄島
 - 石積護岸の姿
 - ヨシ原

6

第2回ワークショップ グループワーク（3）

テーマ：かわまち検討案への意見、改善点
 時間：グループワーク40分、発表15分

グループワークの状況

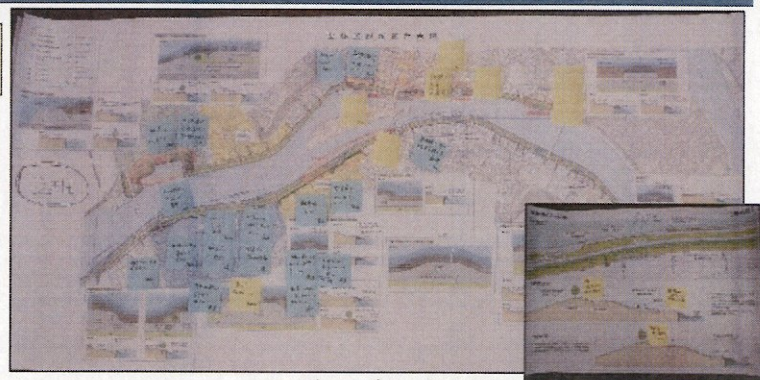

グループワークの成果

各班発表状況



意見概要

- <かわまち検討案に対する意見、改善点>
 - テラスが広く取れる区間ではイベントができる空間にして欲しい
 - 魚が住みやすく人が川に近寄れる水辺にして欲しい
 - 木陰、トイレ、ベンチ、あづまやが欲しい
 - 船から陸地側を見る視点が欲しい
 - 昔の様子を伝えられる案内板を設置して欲しい
 - 拠点毎に救助用具、休憩所を設置して欲しい
 - ところどころに街灯が欲しい
 - 並木は等間隔ではなく密集させるようにして欲しい
 - かわど（低水部の階段）を増やして欲しい（200m間隔で）
 - 人が歩くスペースはチップ舗装にして欲しい
 - ヨシを利用した公園が欲しい

7

旧北上川河口かわまちづくり 全体スケジュール

参考

地域の方々からのご意見

6月20日

地域意見の聞き取り①
(関係民間団体からの意見聴取)

11月21日～12月20日

地域意見の聞き取り②
(パブリックコメント)

11月中旬～1月上旬

地域意見の聞き取り③
(個別意見)
(ワークショップ)

旧北上川河口 かわまちづくり検討会

検討ポイント

7月22日

第1回検討会

- ・検討会の進め方
- ・検討内容、基本条件
- ・検討項目、検討区間
- ・全体的な整備の方向性

8月11日

第1回ワーキング

- ・かわまちづくり・景観に関する技術的検討

9月10日

第2回ワーキング

10月15日

第2回検討会

- ・景観基本方針の報告
- ・堤防・護岸等の整備方針の報告
- ・拠点地区の整備方針の報告

12月16日

第3回ワーキング

- ・地域意見とりまとめ
- ・かわまちづくり・景観に関する技術的検討

1月下旬

第4回ワーキング

3/5. 庁議室

第3回検討会

- ・景観配慮事項のとりまとめ
- ・地域意見の反映
- ・かわまちづくり施設設計とりまとめ

- ①旧北上川河口部の災害復旧にあたっての景観配慮事項
- ②かわまちづくりの景観・施設設計

人々が憩える水辺空間、水辺を活かしたまちづくり

復興事業の進捗状況

担当部署名	教育委員会
内 容	<p><生涯学習課> (1) 博物館機能及び文化ホール機能施設(複合文化施設)整備について ・市民懇談会(第3回) 開催日時1月21日 午後2時 以後、庁内検討委員会及び市民懇談会を順次開催し、年度内に基本構想(案)を作成予定。</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業の進捗状況

担当部署名	病院局事務部病院管理課
内 容	<p><病院管理課> (1) 実施設計 継続して設計作業中。</p> <p>12月に中低層免震制振構造審査に係る申請、1月に防災性能審査に係る申請を行った。これらの結果を受けて、2月末にも大臣認定に係る申請を行う予定。</p> <p>※ 駅前周辺整備、駐車場との調整あり</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。
