






復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	総務部
内 容	<p>【秘書広報課】</p> <p>○（仮称）石巻市復興まちづくり情報交流館設置 設置場所：まちなか・日和山、雄勝地域、牡鹿地域、河北地域、 設置時期：①まちなか・日和山…H27.3 上旬 ②雄勝地域、牡鹿地域、河北地域…H27.8 頃 施設内容：①市民等が集える交流スペース ②地域の現状、工事の進捗状況を発信する地域情報スペース ③震災伝承等震災復興プロセススペース ④復興計画概要等を発信する復興まちづくりスペース 進捗状況：[まちなか・日和山] ・敷地面積 190.8 m² ・軽量鉄骨造平屋建（プレハブ）建築面積 136.71 m² ・10月22日入札</p> <p>【防災推進課】</p> <p>○女川消防署牡鹿出張所建設事業 【清崎運動公園入口付近】 敷地面積 約1,500 m² 建物 鉄筋コンクリート1階建 約600 m²</p> <p>スケジュール 6月13日 保安林解除、自然公園法許可取得 7月9日 造成工事入札 7月15日 造成工事契約・着工 8月29日 設計委託業務完了 11月12日 建設工事入札（予定） 11月中旬 建設工事仮契約</p> <p>○（仮称）石巻東消防署建設事業 【新渡波地区区画整理地内】 敷地面積 約5,400 m² （訓練スペース・ヘリポート・備蓄倉庫・駐車場・ 消防団ポンプ置場含む） 建物 鉄筋コンクリート2階建 約1,200 m²</p> <p>スケジュール 7月2日 地質調査業務落札 7月8日 地質調査業務契約・調査着手 7月9日 基本・実施設計入札 7月17日 基本・実施設計契約・設計着手 2月 基本・実施設計業務完了（予定）</p> <p>○（仮称）石巻消防署西分署建設事業 【向陽町5丁目市営住宅敷地内】 敷地面積 約2,300 m² 建物 鉄筋コンクリート2階建 約900 m²</p>

	<p>スケジュール 5月 2日 電気・機械設備工事契約 5月 30日 建設工事落札 6月 20日 蛇田区長会へ説明 6月 23日 第2回定例会建設工事契約承認 6月 24日 建設工事契約 3月 完成予定</p> <p>○大宮町津波避難タワー建設事業 【大宮町3番15】 敷地面積 1,405.52㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡</p> <p>スケジュール 6月 18日 建設工事落札 7月 7日 第2回定例会建設工事契約承認 7月 30日 渡波区長会へ説明 7月 31日 安全祈願祭 8月 1日 工事着工 3月 完成予定</p> <p>○魚町一丁目津波避難タワー建設事業 【魚町一丁目3番7】 敷地面積 2,650㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡</p> <p>スケジュール 11月 12日 建設工事入札</p> <p>○魚町三丁目津波避難タワー建設事業 【魚町三丁目6番5】 敷地面積 2,821.75㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡</p> <p>スケジュール 11月 12日 建設工事入札</p> <p>○西浜町津波避難タワー建設事業 【西浜町1番地】 敷地面積 未定 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡</p> <p>スケジュール 11月 5日 地質調査業務及び設計業務入札</p>
<p>課 題</p>	<p>【秘書広報課】 (仮称)石巻市復興まちづくり情報交流館の管理・運営方法の検討</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

6. 交流館設置位置

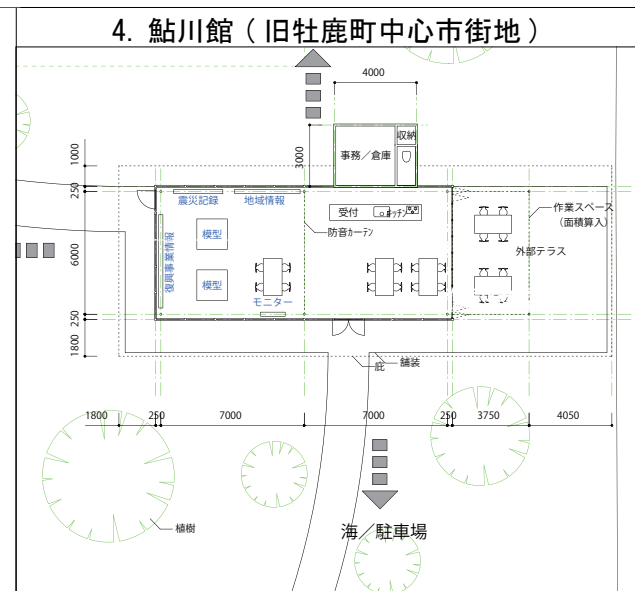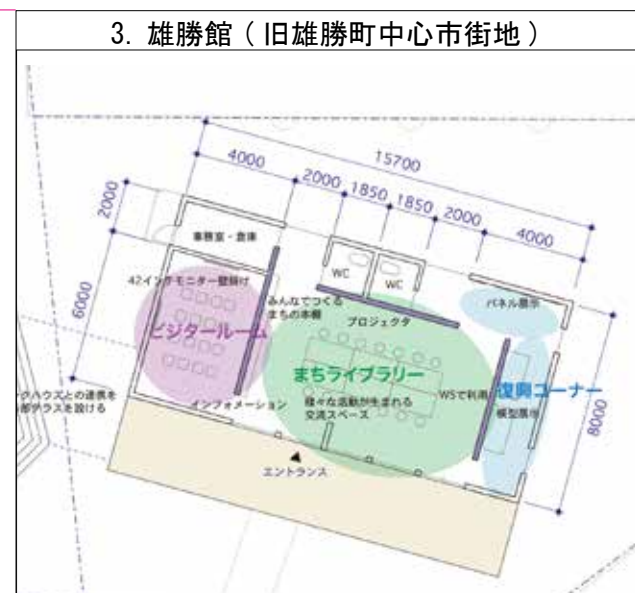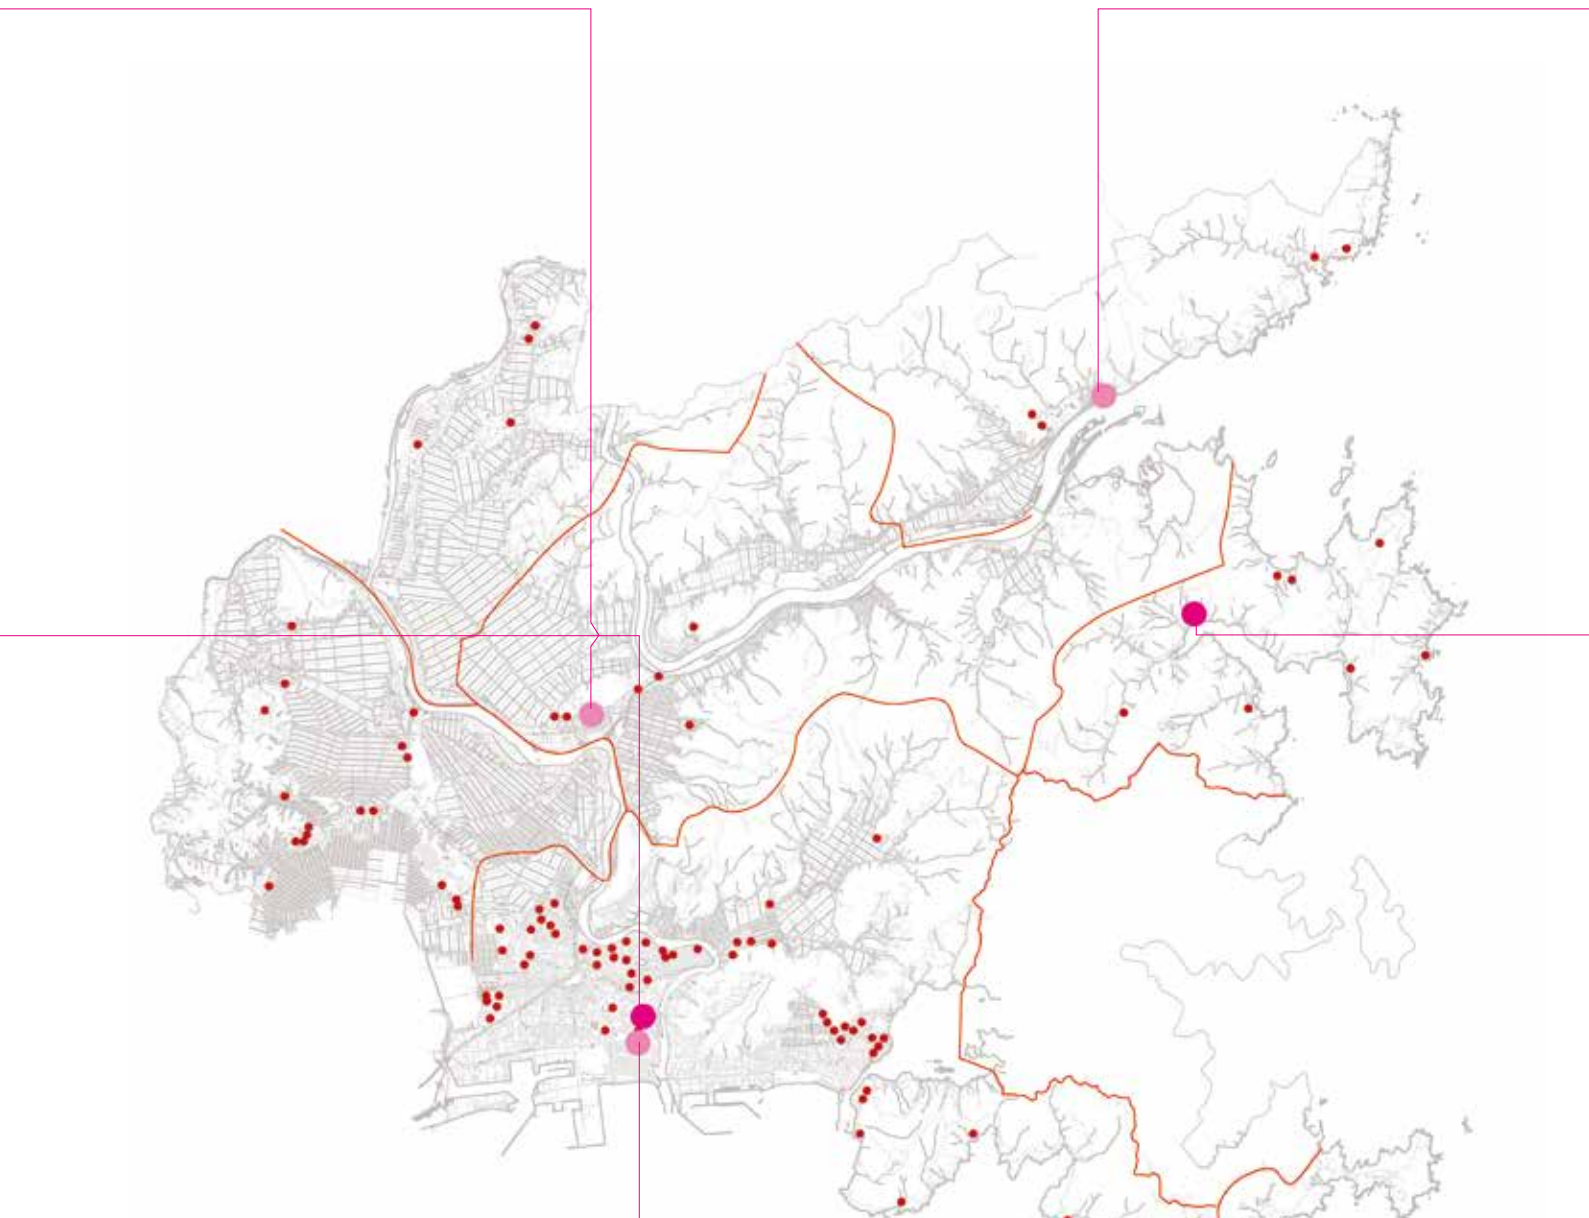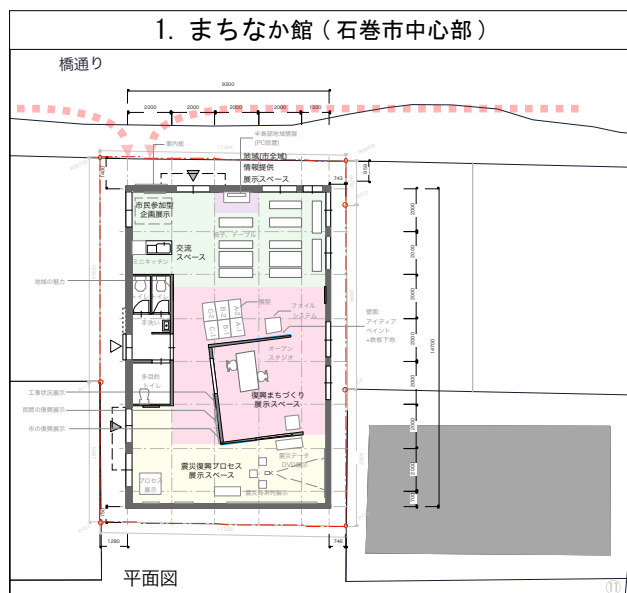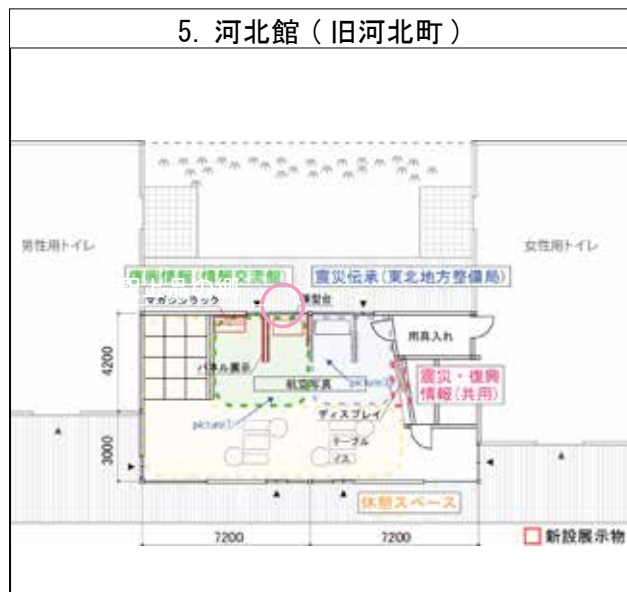

- 新施設
- 既存施設と併用
- 仮設住宅

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興事業部
内 容	<p>【基盤整備課】</p> <p>(1) 防災緑地2号測量及び実施設計業務発注 工期 H26.7.8～H26.12.15 防災緑地1号測量及び設計業務発注 工期 H26.3.6～H26.10.31 中瀬公園調査及び基本設計業務発注 工期 H26.7.3～H27.2.27</p> <p>(2) 南浜公園関連 国交省東北地方整備局による基本計画検討有識者委員会の設置 ① 第1回有識者委員会 H26.8.1 開催</p> <p>(3) 中瀬公園関連 中瀬公園基本計画素案に係る意見交換会 H26.4.25 の開催</p> <p>(4) 高台避難場所及び高台避難路 ①その1工事発注(鹿島神社西口、鹿島神社東口) ・工期 H25.11.22～H26.9.30 (工事完了) ・業者 須藤建設(株) ②その2工事発注(市民プール横、不動明王入口、大門崎公園) ・工期 H26. 1.16～H26.10.30 ・業者 (株)今野工務店 ③その3工事発注(赤坂神社西側、赤坂神社前、観音堂) ・工期 H26. 9.24～H27.3.20 ・業者 (株)奥田建設 ④大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26.3.6 契約 ・工期 H26. 3.6～H26.11.28(履行期間変更)</p> <p>(5) 都市計画道路 渡波稲井線 ・トンネル詳細設計業務 H26.11 中旬発注予定 ・不動産鑑定業務委託 H26.10 上旬 契約 ・地権者個別面談会 H26.11 実施予定</p> <p>(6) 都市計画道路 御所入湊線 ・地権者個別面談会 H26.9.27、28 実施</p> <p>(7) 都市計画道路 釜大街道線 ・地権者個別面談会 H26.9.7 10.5、19 開催</p> <p>(8) 都市計画道路 石巻工業港運河線 ・都市計画決定(変更) H26.11 公告予定 〃 H26.12 公告予定 ・補償調査業務 H26.10 上旬契約予定 ・不動産鑑定業務委託 H26.10 上旬 契約 ・地権者個別面談会 H26.10 開催予定</p> <p>(9) 市街地再開発事業 ①中央三丁目1番地区 ・建築工事中 ②立町二丁目5番地区 ・実施設計中</p>

	<p>③中央一丁目 14・15 番地区 ・実施設計中</p> <p>④中央二丁目 11 番地区 ・事業計画策定中</p> <p>⑤その他検討地区 ・立町一丁目 4・5 番地区 ・中央二丁目 4 番地区 ・中央二丁目 3 番地区</p> <p>(10)優良建築物等整備事業 ①松川横丁地区 ・実施設計中</p> <p>【区画整理第1課】 第2回石巻市新渡波西地区被災市街地復興土地地区画整理事業評価委員会 (H26.10.23 開催予定)</p> <p>【区画整理第2課】</p> <p>(1)新門脇地区被災市街地復興土地地区画整理事業 ・H26.9.10(水)第6回新門脇地区土地地区画整理審議会(UR事務所) ・H26.10.15(水)第7回新門脇地区土地地区画整理審議会(UR事務所) ・H26.10.15(水)新門脇地区まちづくり協議会(UR事務所) ・H26.10.24(金)第2回仮換地通知発送予定</p> <p>(2)湊東地区被災市街地復興土地地区画整理事業 ・H26.9.3(水)湊東地区土地地区画整理事業安全祈願祭 ・H26.9.19(金)第6回湊東地区土地地区画整理審議会(みなと荘) ・H26.9.30(火)第2回仮換地通知発送 ・H26.10.6(月)湊東地区まちづくり協議会(湊中学校 1F 会議室)</p> <p>(3)湊北地区被災市街地復興土地地区画整理事業 ・H26.9.18(木)第6回湊北地区土地地区画整理審議会(みなと荘) ・H26.9.30(火)第2回仮換地通知発送</p> <p>(4)下釜第一地区被災市街地復興土地地区画整理事業 ・H26.9.26(金)下釜第一地区下水道管渠実施設計業務契約締結</p> <p>(5)中央一丁目地区被災市街地復興土地地区画整理事業 ・H26.10.22(水)中央一丁目地区道路築造・埋設管工事入仮契約予定 ・H26.11.6(木)中央一丁目地区道路築造・埋設管工事について市議会へ付議(本契約予定)</p> <p>(6)湊西地区被災市街地復興土地地区画整理事業 ・H26.9.1(月)県より事業計画変更に係る事前協議の回答 ・H26.9.1(月)～9.14(日)事業計画変更案の縦覧 ・H26.9.4(木)第18回湊西地区事業者協議会 ・H26.9.9(火)第2回湊西地区土地地区画整理審議会(みなと荘) ・H26.9.11(木)第1回湊西地区土地地区画整理事業評価委員会(みなと荘)</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ・H26.9.30(火)第1回事業計画変更(設計の概要の認可)申請 ・H26.10.1(水)第3回湊西地区土地区画整理審議会(501会議室) ・H26.10.7(火)～10.19(日)仮換地案の個別説明 ・H26.10.23(木)第4回湊西地区土地区画整理審議会 ・H26.10月末 仮換地指定通知発送予定 <p>(7)下釜南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.9.5(金)上釜南部・下釜南部都市計画(案)の説明会(市民活動ルームC) ・H26.9.30(火)釜南部地区土地区画整理事業事業計画策定業務契約締結 <p>【集団移転推進課】</p> <p>すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しており、施工CMRと専門業者が契約を結び、10・11月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。</p> <p>10月</p> <p>《本庁半島地区》○荻浜 ○牧浜、福貴浦 《牡鹿地区》○小淵浜、鮎川浜(清崎) 《雄勝地区》船越 《北上地区》○白浜・長塩谷</p> <p>11月</p> <p>《牡鹿地区》鮎川浜(寺前、熊野) 《雄勝地区》唐桑、分浜、波板</p> <p style="text-align: right;">※○印は伐採</p> <p>【用地管理課】</p> <p>〈9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.9.4(木) 小室・小指団地契約 ・H26.9.26(金) 防災集団移転宅地賃貸借収納管理システム入札 <p>〈10月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.10.12(日) 移転先宅地契約(新蛇田団地)に係る事前説明会 ・H26.10.19(日) 移転先宅地契約(新渡波団地)に係る事前説明会 <p>〈11月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.11.9(日) 新蛇田団地契約会 ・H26.11.15(土) 新渡波団地契約会 <p>【復興住宅課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.10.1 大須復興住宅(1戸) 桑浜復興住宅(2戸)入居開始 ・H26.11.1 柴田復興住宅(15戸)入居開始予定
--	--

課 題	<p>【基盤整備課】</p> <p>(1) 市街地再開発事業</p> <p>①中央二丁目 11 番地区</p> <p>・核となる観光交流施設の管理運営主体の早期決定と施設規模等の検討</p> <p>②中央二丁目 4 番地区</p> <p>・市有地(社協ビル)の取扱い方針の早期決定</p> <p>(2) 道路・公園整備事業</p> <p>①用地買収について、残地買取り方針の検討</p> <p>②建物補償者(個人、事業所)との補償について、移転先を予定している、区画整理、復興住宅等の整備の進捗と、当該工事の着手予定時期の調整</p> <p>(3) 都市公園事業</p> <p>①南浜公園</p> <p>・県、市の区域区分の早期決定と、事業手法の検討</p> <p>②津波防災緑地及び防災公園整備に係る盛土材の確保</p>
-----	--

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	河北総合支所																																																		
内 容	<p>【地域振興課】 9/13 大川地区復興協議会 9/16 第8回河北(二子)団地まちづくり協議会 9/24 間垣団地復興公営住宅意見交換会 9/30 河北(二子)団地造成工事説明会（造成工事周辺住民対象）</p> <p>10/3 第9回河北(二子)団地まちづくり協議会 10/9 大川地区復興協議会(復興計画策定委員会)</p> <p>【今後の予定】 10/20 大川地区復興協議会(復興計画策定委員会) 11月初旬 第10回河北(二子)団地まちづくり協議会予定</p> <p>二子団地事前登録状況 H26.9 月末現在</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">地区</th> <th style="width: 10%;">戸建</th> <th style="width: 10%;">1LDK</th> <th style="width: 10%;">2LDK</th> <th style="width: 10%;">3LDK</th> <th style="width: 10%;">小計</th> <th style="width: 10%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河 北</td> <td>81</td> <td>26</td> <td>36</td> <td>8</td> <td>70</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>北 上</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>雄勝下</td> <td>26</td> <td>28</td> <td>39</td> <td>10</td> <td>77</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>雄勝上</td> <td>28</td> <td>31</td> <td>51</td> <td>11</td> <td>93</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>146</td> <td>86</td> <td>132</td> <td>30</td> <td>248</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table> <p>工事スケジュール(計画)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">実施設計</td> <td>H27年3月まで</td> </tr> <tr> <td>地盤改良</td> <td>H28年1月まで</td> </tr> <tr> <td>整地、配管、道路、公園整備</td> <td>H29年7月まで</td> </tr> <tr> <td>住宅建築開始</td> <td>H29年3月から</td> </tr> </table>	地区	戸建	1LDK	2LDK	3LDK	小計	計	河 北	81	26	36	8	70	151	北 上	11	1	6	1	8	19	雄勝下	26	28	39	10	77	103	雄勝上	28	31	51	11	93	121	計	146	86	132	30	248	394	実施設計	H27年3月まで	地盤改良	H28年1月まで	整地、配管、道路、公園整備	H29年7月まで	住宅建築開始	H29年3月から
地区	戸建	1LDK	2LDK	3LDK	小計	計																																													
河 北	81	26	36	8	70	151																																													
北 上	11	1	6	1	8	19																																													
雄勝下	26	28	39	10	77	103																																													
雄勝上	28	31	51	11	93	121																																													
計	146	86	132	30	248	394																																													
実施設計	H27年3月まで																																																		
地盤改良	H28年1月まで																																																		
整地、配管、道路、公園整備	H29年7月まで																																																		
住宅建築開始	H29年3月から																																																		
課 題																																																			

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	雄勝総合支所
内 容	<p>【地域振興課・復興対策 G】</p> <p>9月 7日 名地区集会所建設費補助金に関する説明会 9月20日 桑浜復興公営住宅及び大須復興公営住宅完成記念式典 9月20日～22日 桑浜復興公営住宅及び大須復興公営住宅内覧会 9月24日 地区会長会議 9月26日 熊沢地区防集団地安全祈願祭 9月29日 立浜地区説明会</p> <p>※10月、11月の予定 10月19日 船越地区説明会 10月24日 波板、立浜地区説明会 10月26日 伊勢畑、船戸、唐桑地区説明会</p> <p>10月下旬 雄勝地区震災復興まちづくり協議会開催予定</p>
課 題	<p>【地域振興課・復興対策 G】</p> <p>・防集事業による被災跡地の買取りが進まないことが、復興事業の進捗に大きな影響を及ぼしている。</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	北上総合支所
内 容	<p>【地域振興課】 10月、11月の予定</p> <p>10月8日 白浜、長塩谷防集団地入居者説明会 相川地区低平地に関する打合せ(県土木事務所)</p> <p>10月10日 第3回北上地域協議会</p> <p>10月27日～ 小泊、大室地区防集団地用地契約開始</p> <p>10月下旬 月浜・吉浜防集団地完成予想図(3D)説明会</p> <p>10月下旬 じっくり団地造成に係る仮設住宅住居者に対する説明会</p> <p>10月31日 第3回まちづくり委員会</p> <p>11月7日 小泊・大室防集団地安全祈願祭</p>
課 題	<p>【地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・じっくり団地仮設住宅住居者の計画的な移転 ・相川中防集団地早期着工と相川北地区との残土搬出方法の検討

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	牡鹿総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月 8日 小淵地区防集団地地権者説明会 ・9月11日 鮫浦地区防集団地と復興県道に関する説明会 ・9月11日 谷川地区防集団地と復興県道に関する説明会 ・9月12日 大谷川地区防集団地と復興県道に関する説明会 ・9月16日～18日 小淵地区防集団地地権者契約会 ・9月26日 鮫川地区防集団地入居予定者説明会 <p>※10月、11月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10月 小網倉地区防集団地工事進捗等説明会 ・10月 鮫川浜拠点地区上物施設に関する会議 ・10月 牡鹿地区実務者会議 ・10月 鮫川地区防集団地(清崎地区)工事着手 ・10月 鮫川浜拠点地区上物施設に関する会議 ・11月 鮫川地区復興公営住宅抽選会 ・11月 十八成地区低平地整備に関する住民説明会 (その他第1期地区を順次開催)
課 題	<ul style="list-style-type: none"> ・今後、低平地整備に関し第1期地区から順次、住民説明会を開催し、早期に事業着手を行い、排水不良等を解消することが求められている。 ・低平地整備に関連し、防集買取後の土地の有効活用として、賃借料の減免等の手法を早期に確立させる必要がある。

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	<p>【環境課】</p> <p>事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事</p> <p>平成26年10月 敷地造成（敷地内掘削、発生土場外搬出） 及び排水施設工、法面工</p> <p>平成26年11月 同上</p> <p>平成28年4月 供用開始予定</p>
課 題	<p>【環境課】</p> <p>・現時点では特になし。</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	<p>【夜間急患センター】</p> <p>[石巻市夜間急患センター運営審議会] 10月22日(予定) 第2回運営審議会開催</p> <p>[再建に係る隣接市町との意見交換] 10月28日(予定) 第3回意見交換会</p> <p>[財政支援要望等] 10月末(予定) 宮城県医療整備課訪問</p> <p>【包括ケア推進室】</p> <p>○ 平成26年9月2日 地域包括ケア講演会(対象:石巻圏域の医療関係者) 石巻グランドホテル2階「天翔の間」 第1部「地域包括ケアの目指すものとその道すじ」 講師 東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授 辻 哲夫 先生 第2部「千葉県柏市での地域包括ケアの取組み」 講師 東京大学高齢社会総合研究機構 学術支援専門職員 木村 清一 先生 ※ 参加者 138人</p> <p>○ 平成26年9月8日 第4回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 1 石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画骨子(案)について 2 アンケート調査(案)について</p> <p>○ 平成26年9月12日 石巻市地域包括ケア推進協議会第1回合同検討部会 1 石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画骨子(案)について 2 アンケート調査(案)について</p> <p>○ 平成26年9月17日 第1回石巻市地域包括ケアシステム推進本部幹事会議 1 石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画骨子(案)について 2 アンケート調査について</p> <p>○ 平成26年9月26日 第1回石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議 1 石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画骨子(案)について 2 アンケート調査について</p>

	<p>○ 平成26年9月30日 第2回石巻市地域包括ケア推進協議会 1 石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画骨子(案)について 2 アンケート調査について</p> <p>※10、11月の予定 10月15日 第5回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 10月24日 地域包括ケア普及啓発研修会(市民対象) 時間:午後2時から午後4時 会場:石巻専修大学 森口記念館 10月29日 石巻市地域包括ケア推進協議会第3回医療・介護検討部会 11月27日 石巻市地域包括ケア推進協議会第3回被災者支援・地域コミュニティ検討部会</p>
課 題	<p>【夜間急患センター】 ・再建の財源確保 宮城県地域医療再生基金の増額等財源確保に向けた隣接市町と連携した国県への要望強化等 ・再建後の運営費用 隣接市町との負担に関する協議</p> <p>【包括ケア推進室】 ・石巻市地域包括ケア推進協議会や<u>庁内関係課との調整</u> 各部等へのアンケート調査の実施(10月下旬) 各々が個別に実施している地域コミュニティ支援等事業確認、 効果が見込まれる事業提案 →介護保険制度改正に沿った包括ケアシステム推進事業の検討 調整 ・介護保険事業計画との整合性</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	【生活再建支援課】 1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙 2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

(単位:千円)

		H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	計	
申請金額	建設(利子補給補助)	235,203	209,311	188,145	155,194	128,516	117,018	130,715	133,693	127,934	154,005	115,063	144,767	3,126,845	
	建設(取得費用補助)	228,480	173,420	121,500	108,466	73,500	81,500	68,500	45,000	37,500	70,500	39,000	67,800	2,528,480	
	補修(利子補給補助)	6,000	2,893	6,957	0	1,500	1,500	1,046	1,355	0	0	0	0	3,000	70,489
	補修(補修費用補助)	377,349	315,811	171,546	100,267	65,625	77,418	75,878	48,650	48,734	65,652	42,387	39,450	3,691,339	
	移転費用補助	5,069	3,439	5,118	3,627	4,879	3,862	3,798	3,607	2,928	3,813	2,204	5,145	82,944	
	かさ上げ費用補助	33,121	39,418	32,550	31,409	24,366	27,886	22,674	22,980	23,100	34,362	17,762	30,947	532,363	
	合計	878,384	738,841	520,083	397,583	296,523	305,241	302,207	254,728	236,891	325,918	212,794	290,896	9,811,730	
申請者数	建設(利子補給補助)	83	77	69	57	49	44	47	49	47	54	41	52	1,148	
	建設(取得費用補助)	152	117	82	72	49	55	46	30	25	47	26	46	1,688	
	補修(利子補給補助)	4	2	5	0	1	1	1	1	0	0	0	2	50	
	補修(補修費用補助)	431	360	198	116	75	87	88	58	55	76	46	46	4,082	
	移転費用補助	25	23	26	20	25	14	16	15	11	17	8	20	403	
	かさ上げ費用補助	44	53	40	36	30	35	30	27	29	38	22	34	694	
	合計	670	556	354	245	174	187	182	138	127	177	113	146	6,968	

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業

(単位:千円)

		H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	計
申請金額	利子補給補助	53,657	64,740	37,814	44,899	23,422	22,011	9,159	10,940	3,747	20,520	15,645	4,257	1,013,114
	移転費用補助	2,522	432	1,232	638	367	1,463	118	0	220	612	759	183	18,187
	合計	48,588	59,763	34,738	45,575	20,230	19,850	9,395	10,940	3,967	17,183	7,524	4,623	967,754
申請者数	利子補給補助	12	13	8	10	4	5	2	2	1	4	3	1	218
	移転費用補助	8	5	6	7	4	5	1	0	1	2	2	1	105
	合計	12	13	8	10	4	6	2	2	1	4	3	1	219

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)



※2 移転費用の申請者数は内数

●合計

(単位:千円)

		H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	計
申請金額		926,972	798,604	554,821	443,158	316,753	325,091	311,602	265,668	240,858	343,101	220,318	295,519	10,779,484
申請者数		682	569	362	255	178	193	184	140	128	181	116	147	7,187

(単位:人)

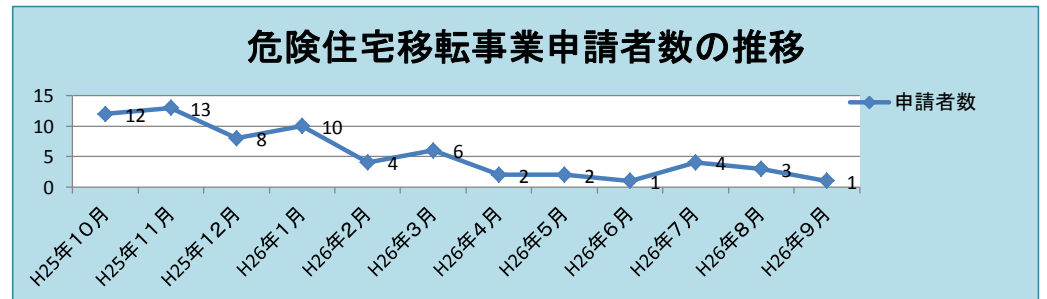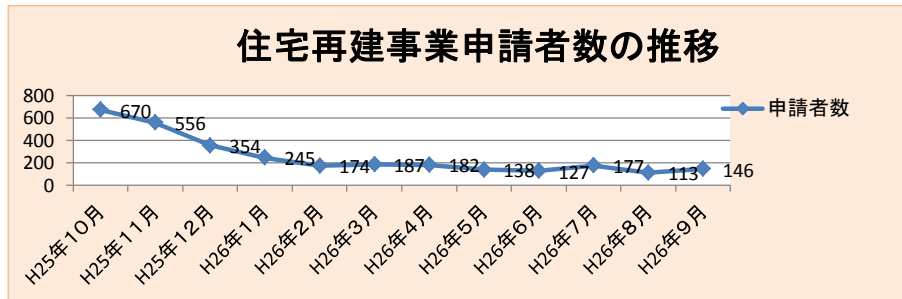

応急仮設住宅(プレハブ)の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

	団地数	整備戸数	入居戸数	空き戸数		入居世帯					退去世帯						待機世帯													
				未利用戸数	入居世帯数	入居世帯の内訳(入居理由)				退去世帯数	退去世帯の内訳(返還理由)					待機世帯数	待機世帯数の内訳(待機理由)													
						県外からの帰還による入居	民賃の貸主不同意による入居	住宅解体に伴う建替えのため入居	その他		持家住宅へ転居	民間賃貸住宅へ転居	公営住宅等へ転居	災害公営住宅へ転居	プレハブ仮設住宅へ転居		その他	うち新規	うち県外	特定の団地を希望			入居人数が間取り要件に合わない	住宅解体に伴う建替えのため希望	その他					
																				うち新規	うち新規	うち新規								
直近の状況	平成26年4月	130	7,266	6,372	894	789	9	0	3	0	6	41	28	0	0	2	7	4	17	5	2	0	15	3	0	0	0	0	2	2
	平成26年5月	130	7,266	6,255	1,011	906	12	1	5	0	6	129	71	3	1	8	5	41	10	0	0	0	7	0	1	0	0	0	2	0
	平成26年6月	130	7,266	6,225	1,041	924	24	2	1	2	19	54	33	7	1	0	4	9	23	3	1	1	14	2	7	1	0	0	2	0
	平成26年7月	130	7,266	6,184	1,082	965	5	0	1	0	4	45	33	1	0	1	0	10	18	0	0	0	10	0	6	0	0	0	2	0
	平成26年8月	130	7,266	6,131	1,135	1,017	8	1	1	0	6	61	44	2	1	1	7	6	12	1	0	0	5	1	5	0	0	0	2	0
	平成26年9月	130	7,266	6,067	1,199	1,081	6	0	1	0	5	70	53	5	0	2	4	6	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
年度別の状況	平成26年度計					64	4	12	2	46	400	262	18	3	14	27	76													
	平成25年度計					351					765																			
	平成24年度計					786					772																			
	平成23年度計					####					201																			

※ 平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は返還届出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯を含む待機している世帯数を報告すること。
 ※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯以外でプレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

復興事業の進捗状況

担当部署名	産業部								
内 容	【 商工課 】 ・ 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26年9月末現在)								
					指定件数の内訳				
	特区の名称		指定事業者数	指定件数	法第42条	法第40条	法第37条	法第38条	法第39条
	石巻まちなか再生特区	H26.8月末	27社	32件	1件	0件	19件	12件	0件
		9月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	27社	32件	1件	0件	19件	12件	0件
	愛ランド特区	H26.8月末	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件
		9月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件
	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	H26.8月末	74社	79件	0件	0件	59件	20件	0件
		9月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	74社	79件	0件	0件	59件	20件	0件
	民間投資促進特区(IT産業版)	H26.8月末	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件
		9月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件
民間投資促進特区(農業版)	H26.8月末	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件	
	9月指定	—	—	—	—	—	—	—	
	計	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件	
【 水産物地方卸売市場建設室 】 ・ 石巻市水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫の建設工事開始 東日本大震災により壊滅的な被害を受けた石巻市水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫について、平成26年8月から建設工事に着手し、平成27年3月末完成予定としている。									

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p>【石巻駅周辺整備プロジェクト推進室】</p> <p>9月18日～ 石巻駅構内緊急車両こ線橋基本設計調査業務着手</p> <p>10月中 「津波復興拠点整備事業区域内で営業又は居住している賃借者向け説明会(仮称)」の開催</p> <p>【河川港湾室】</p> <p>《9月実施》</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(中央・門脇1丁目地区) 【日時】 ・平成26年9月17日(水) 18:30～20:30 【場所】 ・アイトピアホール 【目的】 ・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。 【出席者】 ・中央・門脇一丁目地区在住住民(事前登録制:定員40名) ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか ・いただいた御意見については別紙のとおり(要約)</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(川口・湊1丁目地区) 【日時】 ・平成26年9月20日(土) 14:00～16:30 【場所】 ・みなと荘 【目的】 ・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。 【出席者】 ・川口・湊一丁目地区在住住民(事前登録制:定員40名) ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか ・いただいた御意見については別紙のとおり(要約)</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(井内・藤巻地区) 【日時】</p>

	<p>・平成26年9月28日(日)18:30～</p> <p>【場所】</p> <p>・井内会館</p> <p>【目的】</p> <p>・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。</p> <p>【出席者】</p> <p>・井内・藤巻地区在住住民(事前登録制:定員40名)</p> <p>・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか</p> <p>・いただいた御意見については別紙のとおり(要約)</p> <p>《11月実施予定》</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(南浜・門脇地区)</p> <p>【日時】</p> <p>・平成26年11月中旬(案)</p> <p>【場所】</p> <p>・未定</p> <p>【目的】</p> <p>・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。</p> <p>【出席者】</p> <p>・南浜・門脇地区在住住民(事前登録制:定員40名)</p> <p>・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか</p> <p>◇石巻港大型客船誘致協議会ポートセールス</p> <p>【日時】</p> <p>・平成26年11月27日(木)(予定)</p> <p>【場所】</p> <p>・神奈川県横浜市、東京都内所在の客船会社及び旅行会社</p> <p>【内容】</p> <p>・ポートセールス</p> <p>【出席者】</p> <p>・石巻市長及び事務局(詳細未定)</p>
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

旧北上川河口かわまちづくり 市民部会(抜粋)
平成26年 9月17日(水) 18時30分～20時30分

テーマ	種別	ご意見
施設設計、配置	階段	階段の数をもっと増やしてほしい。
		お年寄りも利用できるように手すりをつけてほしい。
		サイクリングロードとして利用されることから、スロープを設置してほしい。
		階段位置は施設が決まってから柔軟に対応してほしい。
	あずまや・ベンチ	あずま屋のサイズや形状もいろいろとした変化がほしい。
		堤防自体を階段状にし、ベンチとして利用できるようにしてほしい。
	平場	平場が少ないため子供が遊べるような平場(スペース)がほしい。
		お年寄りが平場で休める場所がほしい。
	かわど	景観として川戸を設置することも良いが、生活に密着した洗い場が欲しい。(投網や洗い場等)
	トイレ	トイレは、管理が大変だが、あれば便利だと思う。
	植栽	お花見する場所が少ないので、(堤防沿いに)桜があったら良い。
	テラス	テラスの一部を稲井石とウッドデッキの組み合わせで作ってはどうか
		コンクリート一辺倒のテラスは味気なくさむざむしい
	照明	夜でも安全に歩ける照明が欲しい。
安全面	転落防止柵をつけてほしい。	
	建物上には夜間も避難できるようにしてほしい	
	避難する場所・ルートを明示してほしい。	
利活用		散策路にてマラソン大会を開催。
		釣り堀をつくる。
		自転車レース開催(ツールド北上川)。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	病院局事務部
内 容	<p>【病院管理課】</p> <p>1 石巻市立病院建設工事に関する住民説明会(10月9日) 場所:石巻市役所本庁舎6階第1・2委員会室、時間:19時～ (1)病院建設計画(概要)・建設工事スケジュール説明 (2)病院建設に伴う安全対策及び交通渋滞緩和策について</p> <p>2 石巻市立病院建設工事起工式(10月20日) 場所:石巻市立病院建設予定地(石巻市穀町56番28号)、 時間:10時～ 内容:安全祈願祭及び起工式</p> <p>3 財源確保に向けた国、県への要望活動 (1)中央要望 7回 ・平成26年5月13日 復興庁復興副大臣 ・平成26年5月16日 厚生労働省東北厚生局長 ・平成26年7月15日 復興庁復興副大臣、財務省主計局次長 ・平成26年8月21日 厚生労働省医政局長、復興庁復興大臣政務官、 自由民主党東日本大震災復興加速化本部長 ・平成26年9月8日 復興庁復興大臣 ・平成26年9月16日 復興庁復興大臣、厚生労働省厚生労働大臣 ・平成26年9月29日～30日 復興庁復興大臣、財務省財務副大臣、 厚生労働大臣政務官、 自由民主党幹事長、公明党幹事長 (2)県要望 3回 ・平成26年6月5日 宮城県知事 ・平成26年6月30日 宮城県知事、宮城県議会議長 ・平成26年10月17日 宮城県知事、宮城県議会議長</p>
課 題	


※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

石巻市立病院建設計画（概要）

石巻市立病院復興の基本方針 ～コンセプト～

人に寄り添い、地域に寄り添い、患者を中心にその家族、医療関係者の中で開かれたコミュニケーションを図ることにより、市民に身近な病院として機能する「市民にひらかれた病院」をコンセプトに、石巻赤十字病院との機能分化、連携強化を図り、また、石巻市立の診療所及び各医療機関との連携を強化することで石巻医療圏で切れ目のない医療提供体制を構築し、医療を通じて市民が安心して暮らせる地域社会の実現に向けて良質の医療を提供してまいります。

基本理念・基本方針	新病院の施設機能
<p>■基本理念 「市民に愛される病院 市民に信頼され 市民が満足する質の高い医療の提供」</p> <p>■基本方針</p> <ol style="list-style-type: none"> （１）患者本位の医療を推進する病院 （２）医療の質の向上と安全確保を目指す病院 （３）地域医療に貢献する病院 （４）職員がいきいきと働く病院 （５）健全経営の病院 	<p>急激な症状悪化を防ぎ、状態が安定するまで適切な医療措置を行う「急性期医療」、一部２次救急患者を受け入れる「１．５次救急」、回復期において医療提供を行う「亜急性期医療」、健康状態に回復させ早期社会復帰を目指す「回復期医療」、痛み等の諸症状コントロールにより患者及び家族の負担軽減を図る「緩和ケア」、家族とともに豊かな時間を過ごせる「在宅支援」の実施により、石巻医療圏において切れ目のない医療提供体制を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 急性期医療（１．５次救急） ■ 亜急性期・回復期医療 ■ 緩和ケア ■ 在宅医療・在宅支援

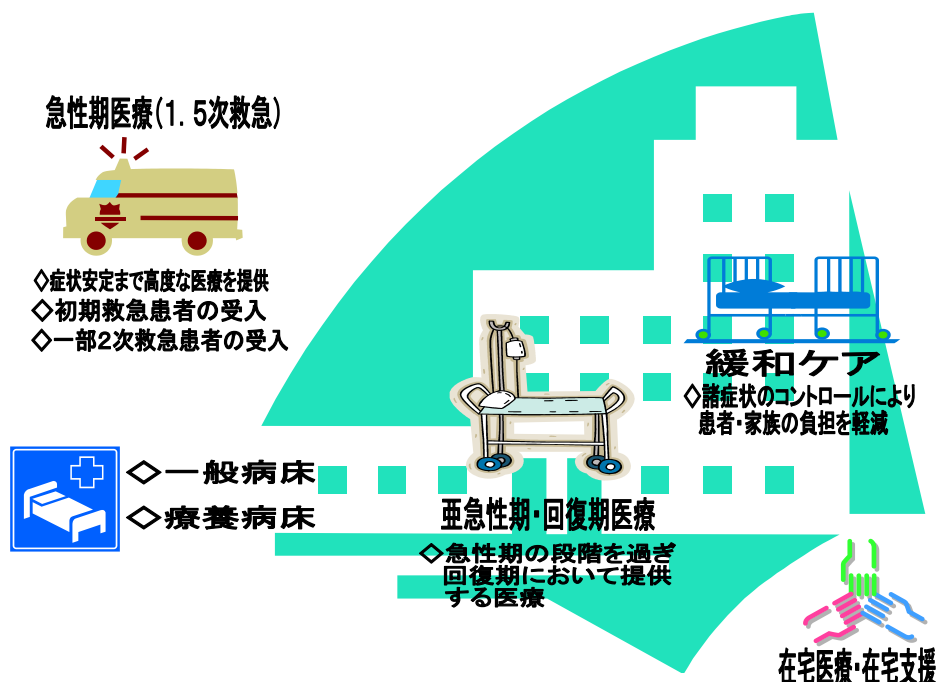

病 床 数			
病床区分	病床数	内 容	病棟区分
一般病床	140床	急性期・亜急性期・回復期・在宅支援	一般40床×3病棟（120床）
		緩和ケア	緩和ケア病棟・1病棟（20床）
療養病床	40床	療 養	療養病棟・1病棟（40床）
合 計	180床		5病棟

診療科目（6科）		部門構成		
内 科	放射線診断科	外来部門	薬剤部門	管理部門
外 科	麻 酔 科	病棟部門	医療技術部門	供給部門
整形外科	リハビリテーション科	中央診療部門	医療支援部門	その他

建設整備計画	
建設予定地	位 置：石巻市穀町56番28、他 用途地域：都市計画区域内（市街化区域）、商業地域、準防火区域 建ぺい率90%（80%+10%角地緩和）、容積率400%
敷地面積	9,393.85㎡
施設機能	<ul style="list-style-type: none"> ■ 患者・家族の利便性を考慮した施設 ■ 地域医療に貢献する施設 ■ 安全性の高い施設 ■ 経済性・業務効率を考慮した施設 ■ 周辺地域に配慮した施設 ■ 地球環境に配慮した施設
建設事業費概算	建築工事一式 13,700,000千円 医療機器等一式 2,000,000千円 合 計 15,700,000千円


■施設規模

建築規模	地上7階
構造	免震上部S造、免震下部SRC造
延床面積	23,932.07㎡ (マニホール棟 11.57㎡、1F駐車場 3,282㎡、2F救急車駐車場 152㎡含む)

■階層構成

東日本大震災時に津波被害を受けたことに対応した階層構成とし、同規模災害時にも病院運用が行える設計としています。1階と2階の間に免震層を設置した免震構造を採用し、1階に雨がかりにならず車の乗降が可能な駐車場・車寄せアプローチを配置、2階以上に病院機能を確保します。屋上にはヘリポートを設置し救急患者搬送の迅速化を図ります。

敷地東側に病院本体棟、西側に立体駐車場を配置。1階駐車場からはエントランスホールから2階へアクセス。立体駐車場からは2階西側から病院内へアクセスする計画です。

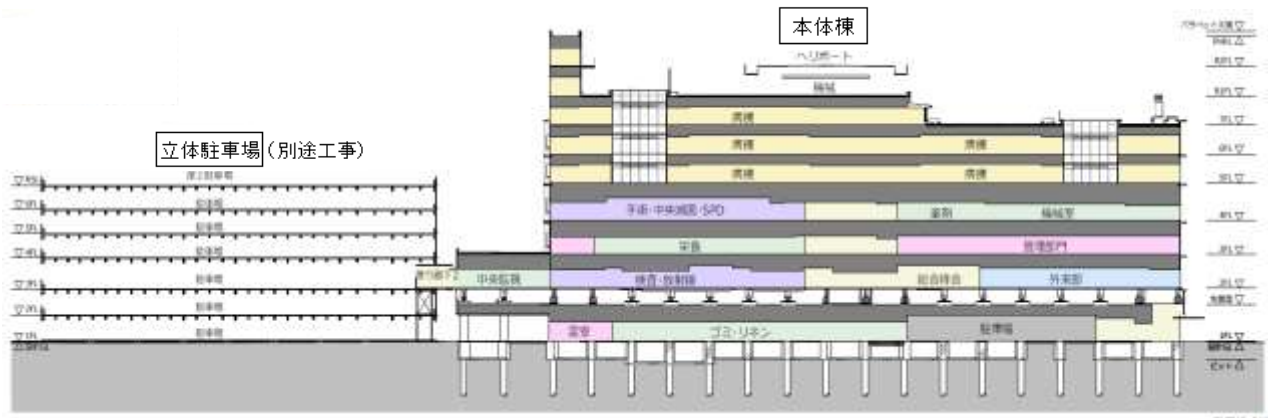

■配置計画

来院者アプローチとして本体棟北東側に歩行者出入口を確保。

車両動線については一般車両、サービス車両、救急車両等の専用入口を確保し、エレベーターなどにより上層階へアクセスします。



■完成イメージ

地域のランドマークとなるシンボル性、街の中核を担う親しみやすさ、さらに医療の安心感を兼ね備え表現した外観計画とします。

エントランスホール、外来待合などのオープンスペースは災害時の患者収容スペースとしても対応可能です。



外観イメージ



2階エントランスイメージ

■建設スケジュール

平成28年6月頃の建設工事完成、開院準備を経て、平成28年7月開院を目指します。

石巻市立病院建設工事スケジュール																													
区 分	平成26年度												平成27年度												平成28年度				
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	入札	契約期間(H26.9.1~H28.6.30)22か月																											
説明会・起工式				着工	10月9日:住民説明会	10月20日:起工式																							
近隣家屋調査			住民説明会後着手																										
準備工事																													
解体工事																													
やまどめ 山留工事																													
くいぎょう 杭地業工事																													
どこうじ 土工事・基礎工事																													
くたい 躯体・仕上げ工事																													
設備工事																													
外構工事																													
検査																													竣工

石巻市立病院の概要



石 巻 市

平成 26 年 10 月 20 日

石巻市立病院の概要について

基本理念・基本方針	新病院の施設機能
<p>■基本理念</p> <p>「市民に愛される病院 市民に信頼され 市民が満足する質の高い医療の提供」</p> <p>■基本方針</p> <p>(1) 患者本位の医療を推進する病院</p> <p>(2) 医療の質の向上と安全確保を目指す病院</p> <p>(3) 地域医療に貢献する病院</p> <p>(4) 職員がいきいきと働く病院</p> <p>(5) 健全経営の病院</p>	<p>急激な症状悪化を防ぎ、状態が安定するまで適切な医療措置を行う「急性期医療」、一部2次救急患者を受け入れる「1.5次救急」、回復期において医療提供を行う「亜急性期医療」、健康状態に回復させ早期社会復帰を目指す「回復期医療」、痛み等の諸症状コントロールにより患者及び家族の負担軽減を図る「緩和ケア」、家族とともに豊かな時間を過ごせる「在宅支援」の実施により、石巻医療圏において切れ目のない医療提供体制を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 急性期医療（1.5次救急） ■ 亜急性期・回復期医療 ■ 緩和ケア ■ 在宅医療・在宅支援

病 床 数			
病床区分	病床数	内 容	病棟区分
一般病床	140床	急性期・亜急性期・回復期・在宅支援	一般40床×3病棟（120床）
		緩和ケア	緩和ケア病棟・1病棟（20床）
療養病床	40床	療 養	療養病棟・1病棟（40床）
合 計	180床		5病棟

診療科目（6科）		部門構成		
内科	放射線診断科	外来部門	薬剤部門	管理部門
外科	麻酔科	病棟部門	医療技術部門	供給部門
整形外科	リハビリテーション科	中央診療部門	医療支援部門	その他

建設整備計画	
建設予定地	位置：石巻市穀町56番28、他 用途地域：都市計画区域内（市街化区域）、商業地域、準防火区域 建ぺい率90%（80%+10%角地緩和）、容積率400%
敷地面積	9,393.85㎡
施設機能	<ul style="list-style-type: none"> ■ 患者・家族の利便性を考慮した施設 ■ 地域医療に貢献する施設 ■ 安全性の高い施設 ■ 経済性・業務効率を考慮した施設 ■ 周辺地域に配慮した施設 ■ 地球環境に配慮した施設
建築規模	地上7階
構造	免震上部S造、免震下部SRC造
延床面積	23,932.07㎡ （マニホール棟11.57㎡、1F駐車場3,282㎡、2F救急車駐車場152㎡含む）

■配置計画

来院者アプローチとして本体棟北東側に歩行者出入口を確保。

車両動線については一般車両、サービス車両、救急車両等の専用入口を確保し、エレベーターなどにより上層階へアクセスします。



2階平面図



3階平面図



4階平面図



5-6階平面図



7階平面図

■完成イメージ

地域のランドマークとなるシンボル性、街の中核を担う親しみやすさ、さらに医療の安心感を兼ね備え表現した外観計画とします。

エントランスホール、外来待合などのオープンスペースは災害時の患者収容スペースとしても対応可能です。

外観イメージ



2階エントランスイメージ



復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	教育委員会
内 容	<p>【学校施設整備室】</p> <p>(1) 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業 ・ 9月実施の入札</p> <p>①【業務名称】 雄勝地区小・中学校移転新築予定地地質調査 【業務場所】 雄勝町大浜字小滝浜地内 【契約日】 平成26年 9月 8日</p> <p>(2) 学校施設太陽光発電設備整備事業 ・ 10、11月実施予定の入札</p> <p>①【業務名称】 釜小学校ほか4校太陽光発電設備設置工事 【業務場所】 釜小、稲井小、稲井中、蛇田中、門脇中 【入札予定月】 平成26年10月</p> <p>【複合文化施設開設準備室】</p> <p>ア 9月、10月の状況 平成26年 9月11日 複合文化施設整備市民懇談会</p> <p>イ 10月、11月の予定 平成26年10月 7日 複合文化施設整備調整会議 平成26年10月下旬 複合文化施設整備市民懇談会</p> <p>平成26年11月予定 複合文化施設整備市民懇談会 複合文化施設整備調整会議</p>
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興交付金配分額一覧(第10回申請時点)

①市交付事業

(単位:千円)

	申請額		配分額		交付率	配分された主な事業と事業費
	事業費	交付金	事業費	交付金		
第1回	25,782,528	20,685,065	14,299,304	11,676,546	56.45%	災害公営住宅整備事業8,673,000、借上公営型地域優良賃貸住宅事業2,822,000、都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)1,630,000、防災集団移転促進事業744,000
第2回	9,203,137	7,437,631	23,426,862	19,679,390	264.59%	防災集団移転促進事業17,265,496、がけ地近接等危険住宅移転事業393,000、漁業活動ソーラー照明設置事業345,000、道路事業270,000
第3回	18,915,868	13,072,088	17,950,812	12,644,040	96.73%	水産加工業施設整備等支援事業16,001,000、災害公営住宅整備事業722,000、防災集団移転促進事業666,404、津波避難場所整備事業95,643
第4回	99,494,709	81,862,985	66,651,605	55,701,890	68.04%	災害公営住宅整備事業36,030,000、防災集団移転促進事業8,073,522、都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)6,448,190、がけ地近接等危険住宅移転事業2,657,000
第5回	18,856,931	15,799,020	44,986,214	38,417,988	243.17%	防災集団移転促進事業26,338,240、災害公営住宅整備事業8,818,100、市街地復興効果促進事業5,438,800
第6回	2,735,968	2,143,430	5,656,875	4,680,693	218.37%	災害公営住宅整備事業3,100,400、防災集団移転促進事業(事業計画策定)784,693、非浸水区域産業拠点形成事業597,223
第7回	24,614,233	19,568,914	30,803,797	25,388,420	129.74%	防災集団移転促進事業602,162、災害公営住宅整備事業16,525,800、都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)4,363,800、津波復興拠点整備事業50,600、下水道事業987,000
第8回	17,222,198	13,441,802	35,447,687	29,471,819	219.25%	災害公営住宅整備事業23,169,500、都市再生区画整理事業741,200、道路事業3,902,500、市街地再開発事業1,002,945、下水道事業3,607,482、漁業集落防災機能強化事業275,859
第9回	4,621,331	3,367,334	14,552,761	12,007,382	356.58%	災害公営住宅整備事業9,666,600、都市再生区画整理事業15,000、市街地再開発事業191,000、下水道事業507,336、漁業集落防災機能強化事業541,978、都市公園事業1,463,500
第10回	73,017,575	58,908,302			0.00%	
計	221,446,903	177,378,269	253,775,917	209,668,168	118.20%	※申請額は第10回除く

②県交付事業

(単位:千円)

	申請額		配分額		交付率	配分された主な事業と事業費
	事業費	交付金	事業費	交付金		
第1回	24,046,082	18,629,752	846,195	653,446	3.51%	農山漁村地域復興基盤総合整備事業810,000、道路事業32,000、埋蔵文化財発掘調査事業4,195
第2回	7,524,505	5,813,558	7,455,505	5,726,433	98.50%	道路事業4,900,000、共同乾燥調製貯蔵施設整備事業1,405,000、漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)600,000、農山漁村地域復興基盤総合整備事業550,505
第3回	4,083,005	3,062,328	54,988	41,122	1.34%	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業)50,000、湊こども園等移転新築事業(放課後児童クラブ)1,419、湊こども園等移転新築事業(保育所)3,118
第4回	54,361,810	41,953,238	31,830,402	24,594,598	58.62%	道路事業(市街地相互の接続道路等)26,256,000、農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)2,892,000、被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業)2,294,001
第5回	2,420,253	1,864,314	7,868,838	6,119,778	328.26%	道路事業(市街地相互の接続道路)6,165,000、市街地復興効果促進事業1,277,755、被災地域農業復興総合支援事業(農業用機械等整備事業)409,837、水産技術総合センター復旧整備事業13,496
第6回	68,000	51,000	68,000	52,700	103.33%	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)68,000
第7回	2,809,178	2,158,677	2,815,081	2,163,130	100.21%	湊こども園等移転新築事業64,420、被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)179,393
第8回	603,724	465,342	603,724	465,342	100.00%	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)543,487、水産技術総合センター公開実験棟復旧整備事業40,237、防災公園事業基本計画策定事業20,000
第9回	473,000	354,750	473,000	354,750	100.00%	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)473,000
第10回	13,419,800	10,400,345			0.00%	
計	96,389,557	74,352,959	52,015,733	40,171,299	54.03%	※申請額は第10回除く

③合計

(単位:千円)

	申請額		配分額		交付率	備考
	事業費	交付金	事業費	交付金		
第1回	49,828,610	39,314,817	15,145,499	12,329,992	31.36%	事業計画提出:平成24年1月30日、配分可能額通知:平成24年3月2日
第2回	16,727,642	13,251,189	30,882,367	25,405,823	191.72%	事業計画提出:平成24年4月4日、配分可能額通知:平成24年5月25日
第3回	22,998,873	16,134,416	18,005,800	12,685,162	78.62%	事業計画提出:平成24年6月26日、配分可能額通知:平成24年8月24日
第4回	153,856,519	123,816,223	98,482,007	80,296,488	64.85%	事業計画提出:平成24年10月17日、配分可能額通知:平成24年11月30日
第5回	21,277,184	17,663,334	52,855,052	44,537,766	252.15%	事業計画提出:平成25年1月25日、配分可能額通知:平成25年3月8日
第6回	2,803,968	2,194,430	5,724,875	4,733,393	215.70%	事業計画提出:平成25年5月21日、配分可能額通知:平成25年6月25日
第7回	27,423,411	21,727,591	33,618,878	27,551,550	126.80%	事業計画提出:平成25年10月11日、配分可能額通知:平成25年11月29日
第8回	17,825,922	13,907,144	36,051,411	29,937,161	215.26%	事業計画提出:平成26年1月28日、配分可能額通知:平成26年3月7日
第9回	5,094,331	3,722,084	15,025,761	12,362,132	332.13%	事業計画提出:平成26年5月20日、配分可能額通知:平成26年6月24日
第10回	86,437,375	69,308,647	0	0		事業計画提出:平成26年10月15日
計	317,836,460	251,731,228	305,791,650	249,839,467	99.25%	※申請額は第9回除く

※市交付事業には効果促進事業等一括配分を含む。 ※県交付事業には間接補助事業を含む。

石巻市復興交付金事業計画第10回申請事業一覧表

○申請事業(市事業)

(単位:千円)

No.	事業の種類		事業名	事業内容	平成26年度申請		平成27年度申請		備考
	基幹事業	効果促進事業等			事業費	交付金	事業費	交付金	
1	○		道路事業(市街地相互の接続道路等) 御所入湊線	津波からの防御施設と併せて、被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図ることを目的として、牧山への最短ルートとして、都市計画道路の整備を行う。			322,500	249,937	工事費・補償費の要求
2	○		市街地再開発事業 中央三丁目1番地区	商店街等との連携及び住宅の整備により、中心商店街の賑わいや来街者の回遊性の向上、被災者への早期の住宅供給を含めたまちなか居住の促進を図る市街地再開発事業を実施する。	20,952	12,570	119,102	71,460	工事費増額分の要求
3	○		防災集団移転促進事業 半島部24地区、市街地地区	被災者の恒久的な住環境を整備するために、内陸や高台への集団移転事業を実施する。	5,289,299	4,628,130	19,651,303	17,194,880	工事費等の要求 (既配分で不足する地区のみ申請)
4		○	津波避難場所整備事業 沿岸地域 【津波避難ビル】	民間事業者等が設置する津波避難場所に対し、補助金を交付し津波避難場所の整備促進を図るもの。			33,000	26,400	平成27年分として、追加分を要求
5	○		道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理)) 新市街地3地区	津波により被害を受けた市民の早急な移転先として整備する土地区画整理事業地に接道する重要な都市計画道路の整備を行う。			207,850	161,083	工事費の要求 (新蛇田南地区、新渡波西地区、新蛇田南第二地区分)
6	○		道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理)) 既成市街地5地区	被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図ることを目的として、沿岸部から内陸部へ、区画整理事業により都市計画道路を整備する。	62,000	48,050	1,099,100	851,802	工事費の要求 (新門脇地区、湊北地区、下釜第一地区、湊西地区、中央一丁目地区)
7	○		災害公営住宅整備事業 継続3地区	東日本大震災により、住宅を滅失した方へ、安全・安心で良質な公的賃貸住宅を供給する。	384,100	336,087	6,411,200	5,609,800	新蛇田地区(182戸増)、河北地区(16戸増)、鹿立浜地区(1戸増)分を要求
8	○		災害公営住宅家賃低廉化事業	災害公営住宅入居者に対し、無理なく負担しうる水準まで家賃負担を軽減するため、家賃の低廉化を行う。			656,422	574,369	平成27年度分を要求
9	○		東日本大震災特別家賃低減事業	東日本大震災による低所得の被災者が、円滑に災害公営住宅に移住し、速やかに生活再建ができるよう家賃を無理なく負担しうる水準まで低減する。	2,123	1,592	200,342	150,256	平成26年度不足分及び平成27年度分を要求
10	○		都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業) 新市街地3地区	移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好且つ健全な市街地の形成を図るほか、住宅再建資力がない等の住宅困窮者向けの公営住宅用地の整備を優先し、宅地、道路、供給施設等の整備を行う。	135,000	101,250	1,729,560	1,297,170	工事費の要求 (新蛇田南地区、新渡波西地区、新蛇田南第二地区分)
11	○		都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業) 既成市街地5地区	被災を受けた住居兼店舗の再建と、津波からの避難の障害となった狭隘道路の解消と利便性に配慮した道路整備を行うために、区画整理事業を行う。			3,043,200	2,282,400	工事費の要求 (新門脇地区、湊北地区、湊東地区、下釜第一地区、中央一丁目地区)
12		○	避難タワー整備事業	津波からの一時避難場所として、津波避難タワーを整備する。			209,000	167,200	西浜町分の整備費の要求
13	○		浄化槽集中導入事業 個人設置型・市町村設置型	東日本大震災により被災し、防災集団移転促進事業等の適用を受け高台に移転し家屋を新築する者や、従来の被災地域に居住し、新築・改築及び修繕のため合併浄化槽を設置するもの。			154,266	115,699	平成27年度分を要求
14	○		漁業集落防災機能強化事業 12地区15集落	半島部の漁業集落において、集落道、排水施設、避難路及び水産関係用地の整備を実施し、生活基盤の再生を図る。	240,900	180,674	23,450	17,587	支障物撤去費等を要求 道路法面工事費を要求【船越地区】
15		○	効果促進事業(内水排除事業) 新門脇地区	高盛土道路と日和山に囲まれた狭い窪地となるため内水排除対策が必要となることから、盛土による内水排除対策を行うものとする。			81,000	64,800	工事費を要求
16		○	仮設排水ポンプ設置事業 本庁地区	大規模な地盤沈下に伴い、一般下水路からの自然流下が不能となっているため、降雨時の浸水対策として、排水施設の構築等の抜本的な対策を施すまでの間、排水ポンプの設置を行う。	3,510	2,808	282,830	226,264	平成26年度新設分及び平成27年度分を要求
17	○		新学校給食センター整備事業 (効果促進事業分) 湊地区	東日本大震災により使用不能となった湊学校給食センター、渡波学校給食センターについて、両施設を統合したうえで再建する。(効果促進事業分)	72,942	58,353	201,627	161,301	工事費を要求
18	○		道路事業(市街地相互の接続道路等) 釜大街道線	釜大街道地区の避難路として、南北に連絡する道路の整備を行う。	995,100	771,202			補償費増分を要求
19	○		津波復興拠点整備事業 石巻駅周辺地区	石巻駅周辺地区の都市機能を集約し、防災性を高め、災害時の市民と来訪者の命を守り、命を救うことができる市街地を形成する。	1,168,870	876,652			実施設計費・用地補償費を要求

石巻市復興交付金事業計画第10回申請事業一覧表

○申請事業(市事業)

(単位:千円)

No.	事業の種類		事業名	事業内容	平成26年度申請		平成27年度申請		備考
	基幹事業	効果促進事業等			事業費	交付金	事業費	交付金	
20		○	非浸水区域産業拠点形成事業	津波浸水リスクを回避し、津波発生時においても産業活動と雇用を維持するとともに、災害からの復旧・復興を推進するため、非浸水区域である須江地区に産業拠点を形成する。			661,425	529,140	平成27年度工事費を要求
21		○	にぎわい交流広場整備事業 石巻駅周辺地区	市民が共に集い、交流をしながら理解し、共助できる機会創出の開放的な屋外空間を整備する。	5,100	4,080			設計費を要求
22	○		下水道事業(汚水・雨水) 区画整理事業地内5地区 【継続分】	新市街地及び既成市街地の区画整理事業地内の下水道(汚水・雨水)の整備を行う。			1,222,000	916,500	工事費を要求 (汚水;新蛇田地区、新蛇田南地区、新門脇地区、中央一丁目地区 雨水;新門脇地区)
23	○		(仮称)石巻市水産総合振興センター整備事業 魚町地区	卸売市場の背後地に福利厚生施設、漁業研修施設及び防災施設を備えた(仮称)石巻市水産総合振興センターを水産業復興の拠点施設として整備し、漁船誘致、水産加工の技術向上及び防災機能の向上を図る。	73,000	54,750			平成26年度分工事費を要求
24		○	(仮称)石巻市水産総合振興センター整備事業(効果促進事業) 魚町地区	上記事業のうち、基幹事業で補助されない設備の整備を行う。 (防災施設、福利厚生施設等)	26,000	20,800			平成26年度分工事費を要求
25	○		下水道事業(雨水) 7地区 【継続分】	震災の影響で排水不良や浸水区域となった地域の排水排除施設としてポンプ施設を整備する。			20,940,896	15,705,670	工事費を要求 (折立第一、折立第二、折立第三、流留第一、渡波、石巻中央、石巻港)
26	○		新学校給食センター整備事業 湊地区	東日本大震災により使用不能となった湊学校給食センター、渡波学校給食センターについて、両施設を統合したうえで再建する。	31,480	20,986	314,912	209,941	工事費を要求
27	○		下水道事業(汚水・雨水) 区画整理事業地内4地区 【新規分】	新市街地及び既成市街地の区画整理事業地内の下水道(汚水・雨水)の整備を行う。	25,300	18,975	785,700	589,275	設計費、工事費を要求 (汚水;新蛇田南第二地区、下釜第一地区、雨水;湊西地区、湊東地区)
28	○		下水道事業(雨水) 4地区 【新規分】	震災の影響で排水不良や浸水区域となった地域の排水排除施設としてポンプ施設を整備する。			6,131,214	4,598,409	工事費を要求 (流留第二、不動沢、井内第一、北北上運河右岸第二)
市交付事業計					8,535,676	7,136,959	64,481,899	51,771,343	

石巻市復興交付金事業計画第10回申請事業一覧表

○申請事業(県事業)

(単位:千円)

No.	事業の種類		事業名	事業内容	平成26年度申請		平成27年度申請		備考
	基幹事業	効果促進事業等			事業費	交付金	事業費	交付金	
1	○		道路事業(市街地相互の接続道路)14事業	①市街地;第二線堤としての高盛土道路及び避難路の整備を行う。 ②半島部;防集間をつなぐ復興国道・県道の整備を行う。			13,419,800	10,400,345	工事費を要求 高盛土道路3路線、半島部復興道路9路線、市街地道路2路線
県交付事業計					0	0	13,419,800	10,400,345	
